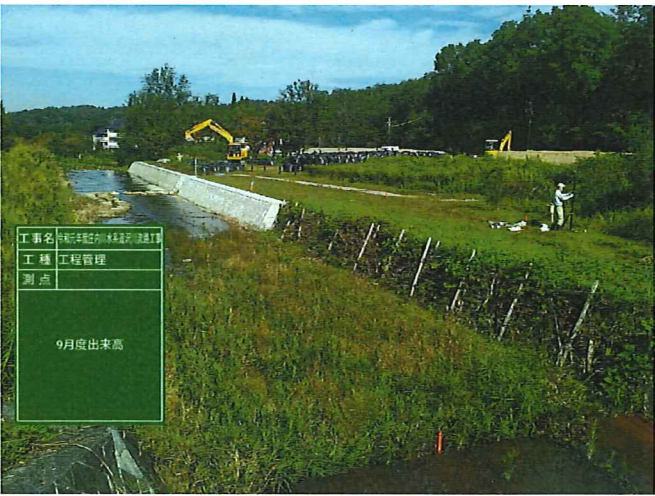


令和元年9月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（中津川流域）		進捗率		②（落合川流域）		進捗率		③（中津川出張所管内）		進捗率	
工 事 名：平成30年度 中津川第2防堰堤改築工事		予定	27.0%	工 事 名：平成30年度 本谷砂防堰堤工事用道路工事		予定	30.6%	工 事 名：平成31年度 中津川出張所整備工事		予定	43.0%
契約工期：平成31年3月28日～令和2年3月31日 変更工期：令和1年5月13日～令和2年3月31日		実施	18.0%	契約工期：平成31年3月30日～令和2年2月28日 変更工期：平成31年4月8日～令和2年2月28日		実施	35.8%	工 期：平成31年4月1日～令和2年3月31日		実施	43.0%
請負業者名：（株）加藤工務店		差	-9.0%	請負業者名：（株）鳴海組		差	5.2%	請負業者名：（株）吉川工務店		差	0.0%
											
9月作業：護岸工 多自然型護岸工巨石積(練)、道路土工 掘削・路体盛土		9月作業：仮設工 砂防締切工、測量(3Dスキャン)及び施工打合せ		9月作業：道路改良工 補強土壁工床掘、基礎コンクリート		9月作業：水叩き工 型枠工及びコンクリート打設					
10月予定：護岸工 多自然型護岸工巨石積(練)、道路土工 掘削・路体盛土		10月予定：仮設工 左岸法面工、高強度ネット工(鉄筋挿入工)		10月予定：道路改良工 補強土壁工基礎コンクリート、補強土壁工		10月予定：水叩き工 型枠工及びコンクリート打設、四ツ目川遊砂工整備工事					
④（中津川流域）		進捗率		⑤（落合川流域）		進捗率		⑥（落合川流域）		進捗率	
工 事 名：平成31年度 川上流路工宮前橋工事		予定	20.7%	工 事 名：令和元年度 荒道工事用道路工事		予定	0.4%	工 事 名：令和元年度 薬師沢砂防堰堤工事		予定	0.4%
工 期：令和元年6月26日～令和2年3月30日		実施	19.7%	工 期：令和元年9月12日～令和2年2月20日		実施	0.4%	工 期：令和元年9月12日～令和2年2月20日 (一部)一時中止＜副堰堤工＞		実施	0.4%
請負業者名：（株）中島工務店		差	-1.0%	請負業者名：（株）鳴海組		差	0.0%	請負業者名：（株）吉川工務店		差	0.0%
		準備工		準備工		準備工					
9月作業：仮設工 砂防仮締切工、橋梁下部 A1橋台掘削工・法面吹付工		9月作業：施工計画書提出 9月24日		9月作業：施工計画書提出 9月26日		今月作業：					
10月予定：橋梁下部 A1橋台掘削工・法面吹付工、床固工床掘工		10月予定：起工測量、伐採準備、仮設工		10月予定：起工測量、伐採準備、仮設工		来月予定：					

令和元年9月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工事名：平成30年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事 工期：平成31年3月9日～令和2年4月14日 施工業者：(株)藤本組 進捗率：予定 28.1 % 実施 28.6 % 差 0.5%	② 工事名：平成30年度 妻木出張所整備工事 工期：平成31年3月30日～平成32年3月31日 施工業者：(株)藤本組 進捗率：予定 40.0 % 実施 38.9 % 差 -1.1%
堰堤部  《今月作業》コンクリート堰堤工:コンクリート打設 《来月作業》コンクリート堰堤工:コンクリート打設	指示2：市之倉作業道  《今月作業》カルバート工:場所打函渠(鉄筋組立、コンクリート打設) 《来月作業》カルバート工:場所打函渠(鉄筋組立、コンクリート打設)
③ 工事名：平成30年度 庄内川水系 妻木管内流木対策整備工事 工期：平成31年4月8日～平成32年2月28日 施工業者：(株)藤本組 進捗率：予定 35.6 % 実施 33.1 % 差 -2.5%	④ 工事名：令和元年度 庄内川水系 追沢川流路工事 工期：令和元年7月30日～令和2年2月7日 施工業者：(株)吉川組 進捗率：予定 0.0 % 実施 0.0 % 差 0.0%
下阿庄地区  《今月作業》下阿庄地区:工事用道路掘削 《来月作業》下阿庄地区:コンクリート堰堤工	 《今月作業》仮設工:工事用道路盛土、撤去工:既設構造物撤去 《来月作業》護岸工:ブロック積

令和元年9月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	平成29年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	②	平成30年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	③	平成30年度 上松出張所整備工事 施工業者 奥田工業(株)	④	平成30年度 木曽川水系 下洞沢砂防施設工事 施工業者 大宗土建(株)
		進捗率(予定工程) % 99.3(99.3)		進捗率(予定工程) % 71.9(72.8)		進捗率(予定工程) % 82.0		進捗率(予定工程) % 63.6(54.4)
		H30.3.30 ~ R1.10.31		H30.5.25 ~ R2. 2.28		H31.3.27 ~ R2. 3.31		H31.3.29 ~ R2. 2.28
								
今月作業		道路土工(路体盛土) 舗装工(路盤、表層)		コンクリート副堰堤工		指示No.6 梨子沢下流左岸整備 指示No.7 上の原・塚野残土処理場整備		コンクリート堰堤本体工(型枠、打設)
来月予定		片付け 竣工書類整備		コンクリート副堰堤工		指示No.6 梨子沢第3下流左岸整備 指示No.8 上山沢砂防堰堤上流土砂除去 指示No.9 長者畑砂防堰堤魚道土砂除去		コンクリート堰堤本体工(型枠、打設)、土工
	⑤	平成30年度 木曽川水系 和合工事用道路工事 施工業者 (株)宮坂組	⑥	平成30年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)	⑦	平成30年度 木曽川水系 下蛇抜沢砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)	⑧	平成30年度 木曽川水系 上松管内砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) % 43.4(50.0)		進捗率(予定工程) % 100 (100)		進捗率(予定工程) % 20.9(20.9)		進捗率(予定工程) % 19.0(22.0)
		H31.3.29 ~ R2. 2.28		H31.4.3 ~ R2. 2.28		H31.4.9 ~ R2. 2.28		H31.4.16 ~ R2. 2.28
								
今月作業		流路工・擁壁工・排水構造物工		砂防土工(除石)・河床整理・仮設撤去・片付け		コンクリート垂直壁工(型枠組立・コンクリート打設) コンクリート堰堤工(作業土工) コンクリート側壁工(型枠組立・コンクリート打設)		矢垂沢地区 強じんワイヤーネット工(アンカー工)
来月予定		擁壁工・石ブロック積工・排水構造物工		-		コンクリート側壁工・水叩工(型枠組立・コンクリート打設) 床固め工(作業土工・水叩工)		矢垂沢地区 強じんワイヤーネット工(アンカー工)


令和元年9月末 上松出張所 工事進捗状況																				
	⑨	令和元年度 木曽川水系 滑川整備工事 施工業者 木曽土建工業(株)				⑩	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)				⑪	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)				⑫	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			
		進捗率(予定工程)		%	11.8 (11.8)		進捗率(予定工程)		%	0.7(0.7)		進捗率(予定工程)		%	1.0 (2.0)		進捗率(予定工程)		%	15.5 (16.3)
		R1. 7.27 ~ R2. 2.14					R1. 8.27 ~ R3. 2.15					R1. 8.27 ~ R2. 2.21					R1. 8.27 ~ R2. 2.21			
																				
今月作業	作業土工、護床工				準備工(施工計画の立案) 工場製作工(鋼製スリット製作準備)				準備工 (書類整理)				作業土工、構造物取壊し工							
来月予定	作業土工、護床工				工場製作工(鋼製スリット製作準備)				準備工 (書類作成) 仮設工(仮設備設置)				作業土工、構造物取壊し工							
	⑬	令和元年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)				⑭					⑮					⑯				
		進捗率(予定工程)		%	0.0(0.0)															
		R1. 9.12 ~ R2. 2.28																		
																				
今月作業	準備工																			
来月予定	仮設工																			

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(上) 40.85kp~40.55kp 道路除草工
工 期：平成31年04月01日~平成33年03月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

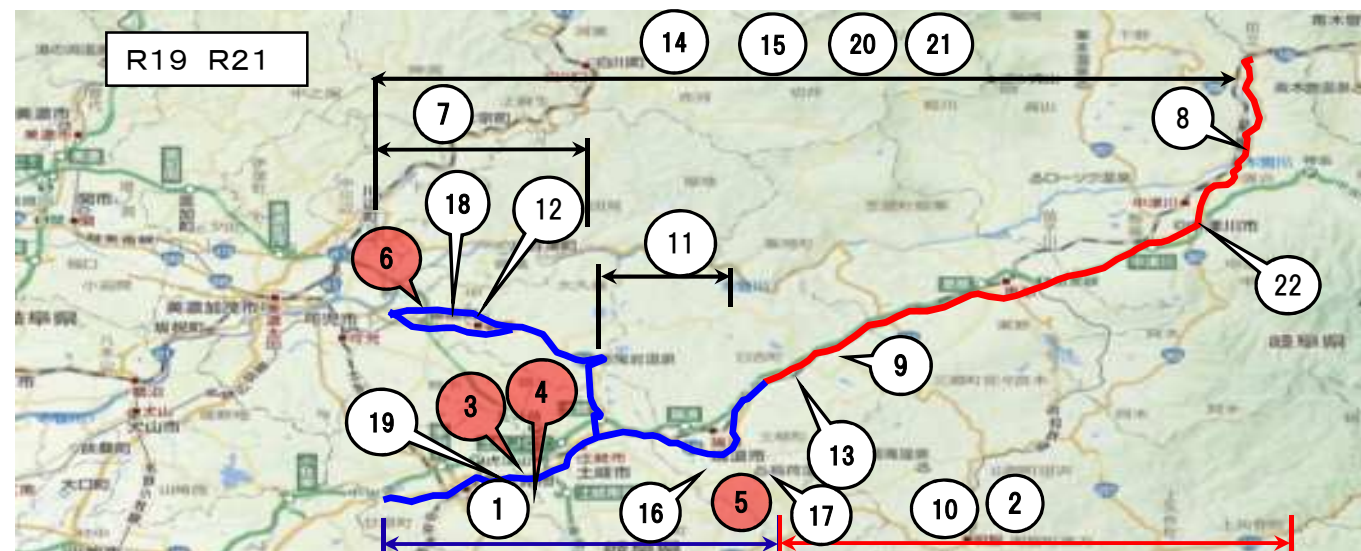

平成30年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号69.300kp(下) 防護柵設置
工 期：平成30年04月01日~令和2年03月31日
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度 19号土岐口道路建設工事

③



19号39.90kp ~40.30kp付近
工 期：平成30年04月27日~平成31年09月30日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先

完

平成30年度 19号土岐口道路改良工事

④



19号 39.9kp~ 上り線 舗装工
工 期：平成30年04月26日~平成31年09月30日
施工業者：(株)藤本組
施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先

完

平成30年度多治見国道管内交通事故対策整備工事

⑤



19号 70.7kp~70.9kp 薄層カラー舗装工
工 期：平成30年07月12日~令和元年06月10日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

完

平成30年度 多治見国道21号御嵩御嵩地区亜炭坑充填工事

⑥



確認ボーリング(大庭工区)
工 期：平成30年10月06日~令和元年07月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

完

平成30年度多治見管内橋梁補修工事

⑦



土岐3工区 舗装工
工 期：平成31年01月24日~平成32年02月28日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：多治見市、土岐市、御嵩町、恵那市

平成30年度多治見国道東部橋梁補修工事

⑧



乙姫大橋(法面工、橋梁補修工)
工 期：平成31年01月24日~令和2年03月13日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：中津川市山口

平成30年度瑞浪恵那道路瑞浪地区下部工事

⑨



橋台工 鉄筋、型枠、Con打設、工事用道路
工 期：平成31年01月19日~令和2年01月14日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

⑩



19号 63.18kp 恵那工区 断面修復工
工 期：平成31年03月09日~平成32年02月28日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：恵那市~中津川市

平成30年度多治見国道防災対策工事

⑪



法面工
工 期：平成31年03月26日~平成31年12月27日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市、御嵩町

平成30年度多治見国道21号顔戸地区亜炭坑充填工事

⑫



充填孔
工 期：令和元年05月07日~令和2年01月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地先

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

⑬



A1橋台 躯体工事中

工 期：平成31年04月05日～平成32年02月28日
施工業者：（株）中島工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成30年度 多治見国道CCTV設備工事

⑭



準備工

工 期：平成31年04月15日～平成32年01月31日
施工業者：（株）シーテック
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

平成31年度多治見電気通信設備維持工事

⑮



準備工 (CCTV設備 次月交差点 R21-7.480kp)

工 期：平成31年04月01日～平成32年03月31日
施工業者：（株）ミライト
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑯



A1橋台 床掘り・均しコンクリート

工 期：令和元年06月28日～令和3年02月26日
施工業者：（株）加藤工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑰



伐採工・路盤工 No.135付近造成地

工 期：令和元年06月28日～令和2年02月28日
施工業者：セントラル建設（株）
施工箇所：瑞浪市土岐町～恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区亜炭坑充填工事

⑱



準備工

工 期：令和元年07月27日～令和2年02月28日
施工業者：飛島建設（株）
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑲



準備工（書類作成）

工 期：令和元年08月07日～令和2年02月28日
施工業者：ウノインフラプランテック（株）
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道管内整備工事

⑳



準備工

工 期：令和元年08月20日～令和2年02月28日
施工業者：（株）鳴海組
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道ブロープ情報用電源設備工事

㉑



19号 38.74kp～92.1kp 屋外用無停電電源装置調査
工 期：令和元年08月07日～令和2年02月28日
施工業者：サンケン電気（株）
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

㉒



準備工

工 期：平成31年08月27日～令和元年07月31日
施工業者：（株）吉川工務店
施工箇所：中津川市中津川地先
