

令和元年11月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（中津川流域）		進 捗 率		②（落合川流域）		進 捗 率		③（中津川出張所管内）		進 捗 率	
工 事 名：平成30年度 中津川第2防堰堤改築工事		予定	41.8%	工 事 名：平成30年度 本谷砂防堰堤工事用道路工事		予定	61.4%	工 事 名：平成31年度 中津川出張所整備工事		予定	62.0%
契約工期：平成31年3月28日 ～ 令和2年3月31日 変更工期：令和1年5月13日 ～ 令和2年3月31日		実施	42.1%	契約工期：平成31年3月30日 ～ 令和2年3月31日 変更工期：平成31年4月8日 ～ 令和2年3月31日		実施	60.4%	工 期：平成31年4月1日 ～ 令和2年3月31日		実施	71.0%
請負業者名：（株）加藤工務店		差	0.3%	請負業者名：（株）鳴海組		差	-1.0%	請負業者名：（株）吉川工務店		差	9.0%
											
今月作業：護岸工 多自然型護岸工巨石積(練)、道路工 ブロック積床掘		今月作業：高強度ネット工(鉄筋挿入工)、(Webカメラ設置)		今月作業：道路改良工 帯鋼補強土壁工(補強土盛土・横断排水・基盤排水層)		今月作業：水叩き工 右岸床掘・型枠工及びコンクリート打設、入ヶ洞整備工事					
来月予定：護岸工 多自然型護岸工巨石積(練)、道路工 ブロック積床掘		来月予定：高強度ネット工(粗石コンクリート左岸上流部法面工)、3Dスキャン		来月予定：道路改良工 帯鋼補強土壁工(足場工・笠コンクリート工)		来月予定：水叩き工 入ヶ洞整備工事、四ッ目川遊砂工整備工事					
④（中津川流域）		進 捗 率		⑤（落合川流域）		進 捗 率		⑥（落合川流域）		進 捗 率	
工 事 名：平成31年度 川上流路工宮前橋工事		予定	40.8%	工 事 名：令和元年度 荒道工事用道路工事 補強土壁工：工事の一部一時中止(令和2年2月11日まで)		予定	2.4%	工 事 名：令和元年度 薬師沢砂防堰堤工事 副堰堤工：工事の一部一時中止(令和2年1月9日まで)		予定	6.4%
工 期：令和元年6月26日 ～ 令和2年3月30日 (繰越予定工期)：～ 令和2年5月29日		実施	38.9%	工 期：令和元年9月12日 ～ 令和2年2月20日 (繰越予定工期)：～ 令和2年4月29日		実施	2.2%	工 期：令和元年9月12日 ～ 令和2年2月20日 (繰越予定工期)：～ 令和2年5月22日		実施	6.4%
請負業者名：（株）中島工務店		差	-1.9%	請負業者名：（株）鳴海組		差	-0.2%	請負業者名：（株）吉川工務店		差	0.0%
								余 白			
今月作業：橋梁下部 A1橋台床掘・法面吹付、1号帯工コンクリート打設		今月作業：伐採工、仮設工砂防締切工、左岸多自然型護岸工基礎工		今月作業：用水路付替工 仮設工、伐採工搬出		今月作業：					
来月予定：橋梁下部 A1橋台床掘、1号コンクリート打設、2号帯工床掘		来月予定：仮設工 砂防締切工、左岸多自然型護岸工巨石積工		来月予定：用水路付替工 仮設工 伐採工搬出及び仮締切作業		来月予定：					

令和元年11月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

①

工事名：平成30年度
庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事
工期：平成31年3月9日～令和2年4月14日

施工業者：(株)藤本組

進捗率：予定 53.7 % 実施 57.2 % 差 3.5%

堰堤部



《今月作業》コンクリート堰堤工：コンクリート打設、砂防土工：残土搬出

《1月作業》砂防土工：残土搬出

②

工事名：平成30年度
妻木出張所整備工事
工期：平成31年3月30日～平成32年3月31日

施工業者：(株)藤本組

進捗率：予定 60.0 % 実施 51.5 % 差 -8.5%

指示2：市之倉作業道



《今月作業》指示2 道路土工：道路盛土
指示9 護床ブロック作成

《1月作業》指示2 排水溝工：側溝設置
指示9 護床ブロック作成・設置

③

工事名：平成30年度
庄内川水系 妻木管内流木対策整備工事
工期：平成31年4月8日～平成32年2月28日

施工業者：(株)藤本組

進捗率：予定 60.7 % 実施 51.8 % 差 -8.9%

下阿庄地区



《今月作業》下阿庄地区：排水構造物工、舗装工、法面工、植生工
水道川地区：伐採、工事用道路盛土

《1月作業》水道川地区：工事用道路盛土

④

工事名：令和元年度
庄内川水系 追沢川流路工事
工期：令和元年7月30日～令和2年2月7日

施工業者：(株)吉川組

進捗率：予定 32.2 % 実施 39.1 % 差 6.9%



《今月作業》流路護岸工：ブロック積、底板工：コンクリート打設

《1月作業》底板工：コンクリート打設

令和元年11月末 上松出張所 工事進捗状況

①	平成29年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	平成30年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	平成30年度 上松出張所整備工事 施工業者 奥田工業(株)	平成30年度 木曽川水系 下洞沢砂防施設工事 施工業者 大宗土建(株)
	進捗率(予定工程) % 100.0 H30.3.30 ~ R1.10.31	進捗率(予定工程) % 81.4 H30.5.25 ~ R2. 2.28	進捗率(予定工程) % 113.0 H31.3.27 ~ R2. 3.31	進捗率(予定工程) % 98.1 H31.3.29 ~ R2. 2.28
				
今月作業	—	コンクリート側壁工・水叩工	指示No.6 梨子沢第3下流左岸整備 指示No.8 上山沢砂防堰堤上流土砂除去 指示No.10 桜洞砂防堰堤堆砂域伐採 指示No.11 越百第2砂防堰堤除石	土工(埋戻し)
来月予定	—	コンクリート側壁工	指示No.10 桜洞砂防堰堤堆砂域伐採 指示No.11 越百川第2砂防堰堤除石	土工(埋戻し)、準備工(片付け)

⑤	平成30年度 木曽川水系 和合工事用道路工事 施工業者 (株)宮坂組	平成30年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)	平成30年度 木曽川水系 下在蛇抜沢砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)	平成30年度 木曽川水系 上松管内砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)
	進捗率(予定工程) % 71.6 H31.3.29 ~ R2. 2.28	進捗率(予定工程) % 100.0 H31.4.3 ~ R2. 2.28	進捗率(予定工程) % 47.7 H31.4.9 ~ R2. 2.28	進捗率(予定工程) % 36.7 H31.4.16 ~ R2. 3.28
				
今月作業	道路土工・擁壁工・石ブロック積工・排水構造物工	—	床固め工(側壁・水叩(型枠組立・コンクリート打設))	矢垂沢地区 強じんワイヤーネット工(アンカー工)
来月予定	擁壁工・排水構造物工・防護柵工	—	床固め工(側壁・水叩(型枠組立・コンクリート打設)) 床固め工(作業土工)仮設工(仮水路)	猿沢地区 仮設工

令和元年11月末 上松出張所 工事進捗状況

⑨	令和元年度 木曽川水系 滑川整備工事 施工業者 木曽土建工業(株)	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)
	進捗率(予定工程) % 69.0 R1. 7.27 ~ R2. 2.14	進捗率(予定工程) % 9.2 R1. 8.27 ~ R3. 2.15	進捗率(予定工程) % 4.2 R1. 8.27 ~ R2. 6.23	進捗率(予定工程) % 47.4 R1. 8.27 ~ R2. 2.21


											
今月作業	作業土工、護床工	工場製作工(鋼製スリット製作) コンクリート堰堤工(型枠組立、コンクリート打設)	準備工	作業土工、構造物取壊し工							
来月予定	砂防土工、作業土工	工場製作工(鋼製スリット製作) コンクリート堰堤工(型枠組立、コンクリート打設)	準備工	作業土工、構造物取壊し工							
	⑬	令和元年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	⑭		⑮		⑯				
		施工業者 神稲建設(株)									
		進捗率(予定工程) % 0.3									
	R1. 9.12 ~ R2. 2.28										
											
今月作業	準備工										
来月予定	準備工・仮設工										

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21号BP(上) 18.0kp~17.3kp 道路除草工
工 期：平成31年04月01日~平成33年03月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス (株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP
進 捗 率：予定 35.1% 実施 39.8%

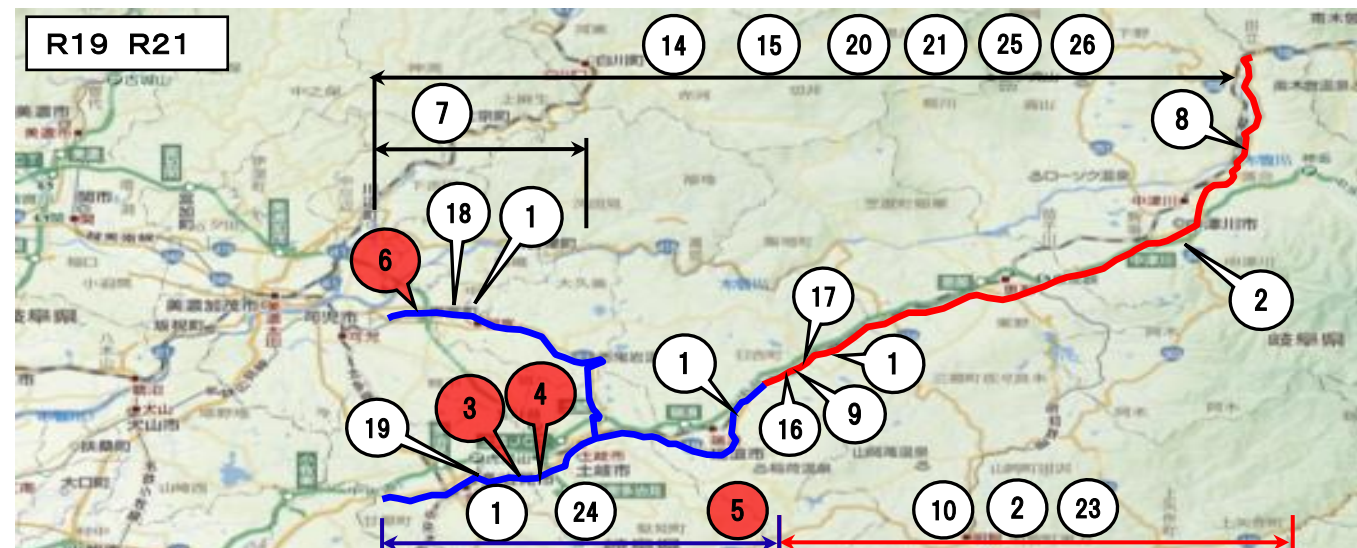

平成30年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号76.600kp(下) 橋梁伸縮装置補修工
工 期：平成30年04月01日~令和2年03月31日
施工業者：(有) 木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp
進 捗 率：予定 90.0% 実施 91.0%

平成30年度 19号土岐口道路建設工事

③



19号39.90kp ~40.30kp付近
工 期：平成30年04月27日~平成31年09月30日
施工業者：(株) 吉川組
施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先
進 捗 率：予100.0% 実施 100.0%

完

平成30年度 19号土岐口道路改良工事

④



19号 39.9kp~ 上り線 舗装工
工 期：平成30年04月26日~平成31年09月30日
施工業者：(株) 藤本組
施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先
進 捗 率：予定 100.0% 実施 100.0%

完

平成30年度多治見国道管内交通事故対策整備工事

⑤



19号 70.7kp~70.9kp 薄層カラー舗装工
工 期：平成30年07月12日~令和元年06月10日
施工業者：(株) 加藤工務店
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内
進 捗 率：予定 100.0% 実施 100.0%

完

平成30年度 多治見国道21号御嵩御嵩地区亜炭坑充填工事

⑥



確認ボーリング(大庭工区)
工 期：平成30年10月06日~令和元年07月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内
進 捗 率：予定 100.0% 実施 100.0%

完

平成30年度多治見管内橋梁補修工事

⑦



土岐3工区 舗装工
工 期：平成31年01月24日~平成32年02月28日
施工業者：(株) 吉川工務店
施工箇所：多治見市、土岐市、御嵩町、恵那市
進 捗 率：予定 73.2% 実施 70.6%

平成30年度多治見国道東部橋梁補修工事

⑧



乙姫大橋(検査路工)前野橋 完了
工 期：平成31年01月24日~令和2年03月13日
施工業者：(株) 梅田組
施工箇所：中津川市山口
進 捗 率：予定 77.0% 実施 76.9%

平成30年度瑞浪恵那道路瑞浪地区下部工事

⑨



U型擁壁工、新滝沢川橋A1、仮設道路、西半入道西定線
工 期：平成31年01月19日~令和2年01月14日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市
進 捗 率：予定 67.2% 実施 89.6%

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

⑩



19号 94.67kp 山口2工区 薄層カラー舗装工
工 期：平成31年03月09日~平成32年02月28日
施工業者：(株) 中島工務店
施工箇所：恵那市~中津川市
進 捗 率：予定 30.3% 実施 30.2%

平成30年度多治見国道防災対策工事

⑪



法面工
工 期：平成31年03月26日~令和元年12月27日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市、御嵩町
進 捗 率：予定 58.9% 実施 58.9%

平成30年度多治見国道21号顔戸地区亜炭坑充填工事

⑫



確認(チェックボーリング)
工 期：令和元年05月07日~令和2年01月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地先
進 捗 率：予定 87.7% 実施 91.3%

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

⑬



A2橋台 躯体施工中 函渠工 施工中

工 期：平成31年04月05日～令和2年05月25日

施工業者：(株)中島工務店

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

進捗率：予定 41.6% 実施 38.2%

平成30年度 多治見国道CCTV設備工事

⑭



試掘工

工 期：平成31年04月15日～平成32年01月31日

施工業者：(株)シーテック

施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

進捗率：予定 48.2% 実施 47.0%

平成31年度多治見電気通信設備維持工事

⑮



CCTV設備工(大又沢1)

工 期：平成31年04月01日～平成32年03月31日

施工業者：(株)ミライト

施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

進捗率：予定 78.4% 実施 77.1%

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑯



A1橋台 縦壁

工 期：令和元年06月28日～令和3年02月26日

施工業者：(株)加藤工務店

施工箇所：瑞浪市土岐町地先

進捗率：予定 19.2% 実施 20.0%

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑰



新滝沢川橋A2橋台 仮設工・橋台工

工 期：令和元年06月28日～令和2年02月28日

施工業者：セントラル建設(株)

施工箇所：瑞浪市土岐町～恵那市武並町地先

進捗率：予定 29.7% 実施 19.8%

令和元年度多治見国道21号大庭地区亜炭坑充填工事

⑱



濁水処理設備工

工 期：令和元年07月27日～令和2年02月28日

施工業者：飛鳥建設(株)

施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

進捗率：予定 10.8% 実施 9.9%

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑲



上山町横断歩道橋(塗膜除去・防食塗装)

工 期：令和元年08月07日～令和2年02月28日

施工業者：ウノインフラプランテック(株)

施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

進捗率：予定 56.3% 実施 48.3%

令和元年度多治見国道管内整備工事

⑳



準備工

工 期：令和元年08月20日～令和2年02月28日

施工業者：(株)鳴海組

施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

進捗率：予定 6.6% 実施 6.6%

令和元年度多治見国道ブロープ情報用電源設備工事

㉑



19号 21号 屋外用無停電電源装置 書類作成

工 期：令和元年08月07日～令和2年02月28日

施工業者：サンケン電気(株)

施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

進捗率：予定 42.0% 実施 42.0%

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

㉒



橋脚巻立工(床掘)

工 期：平成31年08月27日～令和元年07月31日

施工業者：(株)吉川工務店

施工箇所：中津川市中津川地先

進捗率：予定 15.4% 実施 14.2%

令和元年度多治見国道東部除雪作業

㉓



環境整備 凍結防止剤散布・積込

工 期：令和元年10月09日～令和2年03月31日

施工業者：(株)鳴海組

施工箇所：瑞浪市土岐町～木曽郡南木曽町

進捗率：実施散布数量 0.0 t

令和元年度多治見国道西部除雪作業

㉔



凍結防止剤散布工

工 期：令和元年10月08日～令和2年03月31日

施工業者：セントラル建設(株)

施工箇所：内津～土岐町、泉寺田町～中恵土

進捗率：実施散布数量 0.0 t

令和元年度多治見国道管内道の駅改修工事

㉕

準備工

準備工

工 期：令和元年11月07日～令和2年02月28日

施工業者：恵中建設(株)

施工箇所：道の駅内公共便所及び情報館

進捗率：予定 0.0% 実施 0.0%

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

㉖

準備工

準備工(機器製作)

工 期：令和元年11月25日～令和2年08月31日

施工業者：大藤電設(株)

施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

進捗率：予定 2.8% 実施 2.8%
