

令和元年12月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (中津川流域)		進捗率		② (落合川流域)		進捗率		③ (中津川出張所管内)		進捗率	
工 事 名：平成30年度 中津川第2防堰堤改築工事		予定	60.2%	工 事 名：平成30年度 本谷砂防堰堤工事用道路工事		予定	75.0%	工 事 名：平成31年度 中津川出張所整備工事		予定	71.5%
契約工期：平成31年3月28日～令和2年3月31日 変更工期：令和1年5月13日～令和2年3月31日		実施	64.5%	契約工期：平成31年3月30日～令和2年3月31日 変更工期：平成31年4月8日～令和2年3月31日		実施	73.0%	工 期：平成31年4月1日～令和2年3月31日		実施	79.0%
請負業者名：(株)加藤工務店		差	4.3%	請負業者名：(株)鳴海組		差	-2.0%	請負業者名：(株)吉川工務店		差	7.5%
											
今月作業：護岸工 多自然型護岸工巨石積(練)、道路工 ブロック積床掘		今月作業：高強度ネット工(粗石コンクリート左岸上流部法面工)、3Dスキャン		今月作業：道路改良工 帯鋼補強土壁工(足場工・笠コンクリート工)、流路砂防土工		今月作業：水叩き工 入ヶ洞整備工事、四ッ目川遊砂工整備工事					
来月予定：護岸工(下流部) 多自然型護岸工巨石積(練)、道路工 法面工コンクリート張		来月予定：高強度ネット工完了時(中間技術検査)		来月予定：道路改良工 帯鋼補強土壁工 盛土完了時(中間技術検査)、流路護岸工		来月予定：宮前橋下流右岸道路整備工事 盛土工、四ッ目川遊砂工整備工事					
④ (中津川流域)		進捗率		⑤ (落合川流域)		進捗率		⑥ (落合川流域)		進捗率	
工 事 名：平成31年度 川上流路工宮前橋工事		予定	51.6%	工 事 名：令和元年度 荒道工事用道路工事		予定	5.7%	工 事 名：令和元年度 薬師沢砂防堰堤工事		予定	15.8%
工 期：令和元年6月26日～令和2年3月30日 (繰越予定工期)：令和2年5月29日		実施	51.5%	補強土壁工 工事の一部一時中止(令和2年2月11日まで) 工 期：令和元年9月12日～令和2年2月20日 (繰越予定工期)：令和2年4月22日		実施	5.7%	副堰堤工 工事の一部一時中止(令和2年1月9日まで) 工 期：令和元年9月12日～令和2年2月20日 (繰越予定工期)：令和2年5月22日		実施	15.9%
請負業者名：(株)中島工務店		差	-0.1%	請負業者名：(株)鳴海組		差	0.0%	請負業者名：(株)吉川工務店		差	0.1%
											
今月作業：橋梁下部 A1橋台床掘完了時(中間技術検査)、1号帯工コンクリート打設		今月作業：仮設工 砂防締切工、左岸多自然型護岸工巨石積工		今月作業：仮用水路工 カルバート工床掘(地耐力試験)		今月作業：					
来月予定：橋梁下部 A1橋台コンクリート打設、2号帯工コンクリート打設		来月予定：仮設工 砂防締切工、右岸多自然型護岸工巨石積工		来月予定：カルバート工 場所打ち函渠工鉄筋組立及びコンクリート打設		来月予定：					

令和元年12月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

①

工事名：平成30年度
庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事
工期：平成31年3月9日～令和2年4月14日

施工業者：(株)藤本組

進捗率：予定 99.3 % 実施 99.9 % 差 0.6%

堰堤部



《今月作業》準備工(片付け)

《2月作業》準備工(作業完了)

②

工事名：平成30年度
妻木出張所整備工事
工期：平成31年3月30日～平成32年3月31日

施工業者：(株)藤本組

進捗率：予定 70.0 % 実施 63.1 % 差 -6.9%

指示2：市之倉作業道



《今月作業》指示2 排水構造物工、法面工
指示9 護床ブロック設置

《2月作業》指示9 護床ブロック設置

③

工事名：平成30年度
庄内川水系 妻木管内流木対策整備工事
工期：平成31年4月8日～平成32年2月28日

施工業者：(株)藤本組

進捗率：予定 72.7 % 実施 73.1 % 差 0.4%

下阿庄地区



水道川地区



《今月作業》水道川地区：工事用道路盛土

《2月作業》水道川地区：工事用道路盛土

④

工事名：令和元年度
庄内川水系 追沢川流路工事
工期：令和元年7月30日～令和2年2月7日

施工業者：(株)吉川組

進捗率：予定 70.7 % 実施 69.2 % 差 -1.5%

下流部



《今月作業》底板工：コンクリート打設
伐採工：伐採、運搬処分

《2月作業》伐採工：伐採、運搬処分

令和元年12月末 上松出張所 工事進捗状況

①	平成29年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	平成30年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	平成30年度 上松出張所整備工事 施工業者 奥田工業(株)	平成30年度 木曽川水系 下洞沢砂防施設工事 施工業者 大宗土建(株)
	進捗率(予定工程) % 100.0 H30.3.30 ~ R1.10.31	進捗率(予定工程) % 89.8 H30.5.25 ~ R2. 2.28	進捗率(予定工程) % 120.0 H31.3.27 ~ R2. 3.31	進捗率(予定工程) % 99.1 H31.3.29 ~ R2. 2.28
				
今月作業	—	コンクリート側壁工・片付け	指示No.10 南木曽町 桜洞砂防堰堤堆砂域伐採	土工、準備工
来月予定	—	工事完了	指示No.10 南木曽町 桜洞砂防堰堤堆砂域伐採	準備工、完成検査

⑤	平成30年度 木曽川水系 和合工事用道路工事 施工業者 (株)宮坂組	平成30年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)	平成30年度 木曽川水系 下在蛇抜沢砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)	平成30年度 木曽川水系 上松管内砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)
	進捗率(予定工程) % 88.7 H31.3.29 ~ R2. 2.28	進捗率(予定工程) % 100.0 H31.4.3 ~ R2. 2.28	進捗率(予定工程) % 59.1 H31.4.9 ~ R2. 2.28	進捗率(予定工程) % 46.5 H31.4.16 ~ R2. 3.28
				
今月作業	道路土工・擁壁工・排水構造物工・防護柵工	—	床固め工〔側壁・水叩(型枠組立・コンクリート打設)〕 仮設工(仮水路移設)	越百第2砂防ダム地区 砂防土工
来月予定	道路土工・法面工・排水構造物工・防護柵工	—	コンクリート堰堤工〔側壁・水叩(土工・型枠組立・コンクリート打設)〕 床固め工〔側壁・水叩(土工・型枠組立・コンクリート打設)〕	越百第2砂防ダム地区 砂防土工 滑川地区 根固め・水制工(仮設工)

令和元年12月末 上松出張所 工事進捗状況

⑨	令和元年度 木曽川水系 滑川整備工事 施工業者 木曽土建工業(株)	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)
	進捗率(予定工程) % 93.1 R1. 7.27 ~ R2. 2.14	進捗率(予定工程) % 14.3 R1. 8.27 ~ R3. 2.15	進捗率(予定工程) % 5.4 R1. 8.27 ~ R2. 6.23	進捗率(予定工程) % 53.7 R1. 8.27 ~ R2. 2.21


																
今月 作業	後片付け			工場製作工(鋼製スリット製作) コンクリート堰堤工(型枠組立、コンクリート打設)			準備工			作業土工、構造物取壊し工						
来月 予定	完 成			工場製作工(鋼製スリット製作) 砂防土工(堆積土石撤去)			準備工			コンクリート堰堤本体工						
	⑬	令和元年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事			⑭				⑮				⑯			
		施工業者 神稲建設(株)														
		進捗率(予定工程) % 0.3														
	R1. 9.12 ~ R2. 2.28															
																
今月 作業	準備工															
来月 予定	準備工															

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(中) 53.45kp～53.90kp 道路除草工
工 期：平成31年04月01日～平成33年03月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp
R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

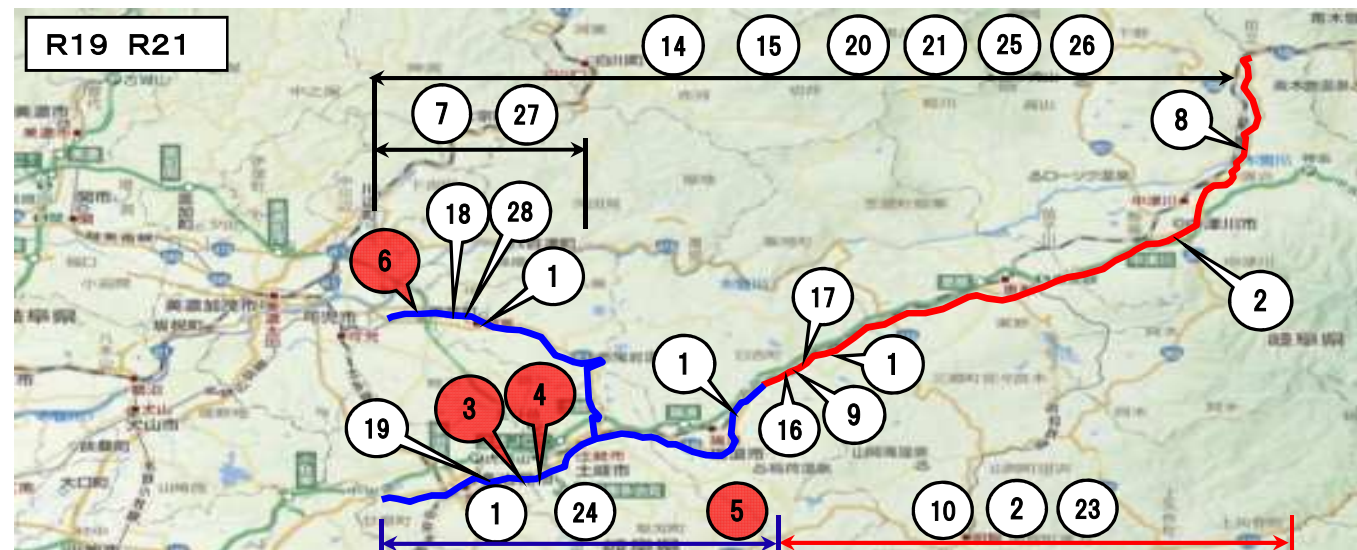

平成30年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号68.900kp(上) 防草シート工
工 期：平成30年04月01日～令和2年03月31日
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp

平成30年度 19号土岐口道路建設工事

③



19号39.90kp～40.30kp付近
工 期：平成30年04月27日～平成31年09月30日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先

完

平成30年度 19号土岐口道路改良工事

④



19号 39.9kp～上り線 舗装工
工 期：平成30年04月26日～平成31年09月30日
施工業者：(株)藤本組
施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先

完

平成30年度多治見国道管内交通事故対策整備工事

⑤



19号 70.7kp～70.9kp 薄層カラー舗装工
工 期：平成30年07月12日～令和元年06月10日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

完

平成30年度 多治見国道21号御嵩御嵩地区亜炭坑充填工事

⑥



確認ボーリング(大庭工区)
工 期：平成30年10月06日～令和元年07月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

完

平成30年度多治見管内橋梁補修工事

⑦



御嵩工区 舗装工
工 期：平成31年01月24日～平成32年02月28日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：多治見市、土岐市、御嵩町、恵那市

平成30年度多治見国道東部橋梁補修工事

⑧



乙姫大橋(検査路工)前野橋 完了
工 期：平成31年01月24日～令和2年03月13日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：中津川市山口

平成30年度瑞浪恵那道路瑞浪地区下部工事

⑨



U型擁壁工、新滝沢川橋A1、仮設道路、西半入道西定線
工 期：平成31年01月19日～令和2年03月27日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

⑩



藤橋、駒場跨道橋 橋梁支承工(鉄筋探索)
工 期：平成31年03月09日～平成32年02月28日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：恵那市～中津川市

平成30年度多治見国道防災対策工事

⑪



排水構造物工
工 期：平成31年03月26日～令和元年12月27日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市、御嵩町

平成30年度多治見国道21号顔戸地区亜炭坑充填工事

⑫



完了
工 期：令和元年05月07日～令和2年01月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地先

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

⑬



A2橋台 躯体施工中 側道(L7) 施工中
工 期：平成31年04月05日～令和2年05月25日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成30年度 多治見国道CCTV設備工事

⑭



植栽伐採
工 期：平成31年04月15日～平成32年01月31日
施工業者：(株)シーテック
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

平成31年度多治見電気通信設備維持工事

⑮



CCTV設備工(映像蓄積HDD記録装置)設置
工 期：平成31年04月01日～平成32年03月31日
施工業者：(株)ミライト
施工箇所：多治見砂防国道事務所無線室

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑯



A1橋台 堅壁, P3橋脚 掘削
工 期：令和元年06月28日～令和03年02月26日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑰



新滝沢川橋A2 橋台躯体工
工 期：令和元年06月28日～令和02年03月30日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市土岐町～恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区亜炭坑充填工事

⑱



充填孔設置工、充填プラント組立工
工 期：令和元年07月27日～令和02年02月28日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑲



上山町横断歩道橋(防食塗装・舗装工・足場工)完了
工 期：令和元年08月07日～令和02年02月28日
施工業者：ウノインフラプランテック(株)
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道管内整備工事

⑳



舗装工 区画線工 落石防護網工
工 期：令和元年08月20日～令和02年03月30日
施工業者：(株)鳴海組
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道ブロープ情報用電源設備工事

㉑



無停電電源設備設置工(泉東窯町上り)
工 期：令和元年08月07日～令和02年02月28日
施工業者：サンケン電気(株)
施工箇所：多治見管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

㉒



橋脚巻土工(コンクリート削孔)
工 期：平成31年08月27日～令和元年07月31日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市中津川地先

令和元年度多治見国道東部除雪作業

㉓



凍結防止剤散布・積込
工 期：令和元年10月09日～令和02年03月31日
施工業者：(株)鳴海組
施工箇所：瑞浪市土岐町～木曽郡南木曽町

令和元年度多治見国道西部除雪作業

㉔



凍結防止剤散布工
工 期：令和元年10月08日～令和02年03月31日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：内津～土岐町、泉寺田町～中恵土

令和元年度多治見国道管内道の駅改修工事

㉕

準備工

準備工
工 期：令和元年11月07日～令和02年02月28日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：道の駅内公共便所及び情報館

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

㉖

準備工

準備工(機器製作)
工 期：令和元年11月25日～令和02年08月31日
施工業者：大藤電設(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号整備工事

㉗

準備工

準備工
工 期：令和2年01月10日～令和02年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区亜炭坑充填工事

28

準備工

準備工

工期：令和2年03月10日～令和2年08月31日

施工業者：徳倉建設（株）

施工箇所：可児郡御嵩町地先

