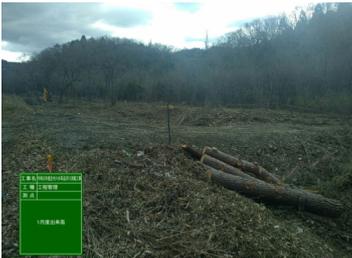


## 令和2年1月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (中津川流域)		進捗率		② (落合川流域)		進捗率		③ (中津川出張所管内)		進捗率	
工事名: 平成30年度 中津川第2防堰堤改築工事		予定	82.4%	工事名: 平成30年度 本谷砂防堰堤工事用道路工事		予定	84.9%	工事名: 平成31年度 中津川出張所整備工事		予定	81.0%
契約工期: 平成31年3月28日 ~ 令和2年3月31日 変更工期: 令和1年5月13日 ~ 令和2年3月31日		実施	79.5%	契約工期: 平成31年3月30日 ~ 令和2年3月31日		実施	83.4%	工期: 平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日		実施	86.0%
請負業者名: (株) 加藤工務店		差	-2.9%	請負業者名: (株) 鳴海組		差	-1.5%	請負業者名: (株) 吉川工務店		差	5.0%
											
今月作業: 護岸工(下流部) 多自然型護岸工巨石積(練)、道路工 排水構造物工		今月作業: 高強度ネット工完了時(1/27 中間技術検査)		今月作業: 道路改良工 帯鋼補強土壁工 盛土完了時(1/29 中間技術検査)		今月作業: 宮前橋下流右岸道路整備工事 樋管工鉄筋組立					
来月予定: 道路改良工 ブロック積工・排水構造物工・防護柵工、舗装工準備		来月予定: 高強度ネット工完了		来月予定: 道路改良工 路側防護柵工、流路工 床固め工		来月予定: 宮前橋下流右岸道路整備工事 盛土工、四ツ目川遊砂工整備工事					
④ (中津川流域)		進捗率		⑤ (落合川流域)		進捗率		⑥ (落合川流域)		進捗率	
工事名: 平成31年度 川上流路工宮前橋工事		予定	51.6%	工事名: 令和元年度 荒道工事用道路工事		予定	5.7%	工事名: 令和元年度 薬師沢砂防堰堤工事		予定	15.8%
工期: 令和元年6月26日 ~ 令和2年5月29日		実施	51.5%	補強土壁工: 工事の一部一時中止(令和2年2月11日まで) 工期: 令和元年9月12日 ~ 令和2年2月20日 (繰越予定工期): 令和2年4月22日		実施	5.7%	工期: 令和元年9月12日 ~ 令和2年5月22日		実施	15.9%
請負業者名: (株) 中島工務店		差	-0.1%	請負業者名: (株) 鳴海組		差	0.0%	請負業者名: (株) 吉川工務店		差	0.1%
											
今月作業: 橋梁下部 A1橋台コンクリート打設、2号帯工コンクリート		今月作業: 仮設工 砂防締切工、道路改良 ブロック積工、法面工 法枠施工		今月作業: 仮用水路工、カルバート工 鉄筋組立及び型枠組立		今月作業:					
来月予定: 橋梁下部 A1橋台コンクリート打設、P1橋脚床掘		来月予定: 仮設工 砂防締切工、道路改良 ブロック積工、法面工 法枠施工		来月予定: 仮用水路工、カルバート工 型枠組立及びコンクリート打設		来月予定:					

余 白

# 令和2年1月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名：平成30年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事</p> <p>工期：平成31年3月9日～令和2年4月14日 (令和2年3月16日に変更予定)</p> <p>施工業者：(株)藤本組</p> <p>進捗率：予定 99.9%      実施 99.9%      差 0.0%</p>	<p>②</p> <p>工事名：平成30年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期：平成31年3月30日～令和2年3月31日</p> <p>施工業者：(株)藤本組</p> <p>進捗率：予定 80.0%      実施 79.5%      差 -0.5%</p>
<p>堰堤部</p>  <p>1月度 月末写真</p>	<p>指示2：市之倉作業道</p>  <p>指示9：窯洞流路</p> 
<p>《今月作業》 準備工(片付け) 2/19 工事完成予定</p> <p>《3月作業》 -</p>	<p>《今月作業》 指示2 舗装工、法面工 指示9 護床ブロック設置</p> <p>《3月作業》 指示9 護床ブロック設置 指示11 舗装(市之倉)</p>
<p>③</p> <p>工事名：平成30年度 庄内川水系 妻木管内流木対策整備工事</p> <p>工期：平成31年4月8日～令和2年2月28日 (令和2年3月19日に変更予定)</p> <p>施工業者：(株)藤本組</p> <p>進捗率：予定 87.3%      実施 86.8%      差 -0.5%</p>	<p>④</p> <p>工事名：令和元年度 庄内川水系 追沢川流路工事</p> <p>工期：令和元年7月30日～令和2年2月7日 (令和2年3月19日に変更予定)</p> <p>施工業者：(株)吉川組</p> <p>進捗率：予定 78.7%      実施 81.0%      差 2.3%</p>
<p>水道川地区</p> 	<p>水路部</p>  <p>伐採部</p> 
<p>《今月作業》 水道川地区：工事用道路盛土</p> <p>《3月作業》 水道川地区：工事用道路盛土</p>	<p>《今月作業》 伐採工：伐採、運搬処分</p> <p>《3月作業》 準備工(片付け)</p>

## 令和2年1月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 平成29年度 木曾川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 100.0 H30.3.30 ~ R1.10.31	② 平成30年度 木曾川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % 100.0 H30.5.25 ~ R2. 2.28	③ 平成30年度 上松出張所整備工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 125.0 H31.3.27 ~ R2. 3.31	④ 平成30年度 木曾川水系 下洞沢砂防施設工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % 100.0 H31.3.29 ~ R2. 2.28
				
今月作業	—	側壁工・後片付け。	指示No.10 南木曾町桜洞砂防堰堤堆砂域伐採	1月20日完成検査。
来月予定	—	2月21日完成検査。	指示No.10 南木曾町桜洞砂防堰堤堆砂域伐採	—
	⑤ 平成30年度 木曾川水系 和合工事用道路工事 施工業者 (株)宮坂組 進捗率(予定工程) % 99.0 H31.3.29 ~ R2. 2.28	⑥ 平成30年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株) 進捗率(予定工程) % 100.0 H31.4.3 ~ R2. 2.28	⑦ 平成30年度 木曾川水系 下在蛇抜沢砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 73.2 H31.4.9 ~ R2. 3.30(予定)	⑧ 平成30年度 木曾川水系 上松管内砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 65.6 H31.4.16 ~ R2. 3.28
				
今月作業	道路土工・法面工・排水構造物工・防護柵工	—	コンクリート堰堤工【側壁・水叩(土工・型枠組立・コンクリート打設)】 床固め工【側壁・水叩(土工・型枠組立・コンクリート打設)】	越百第2砂防ダム地区 砂防土工 滑川地区 根固め・水制工(仮設工)
来月予定	2月26日完成検査。	—	コンクリート堰堤工【側壁(型枠組立・コンクリート打設)作業土工(埋戻)】 床固め工【側壁・水叩(型枠組立・コンクリート打設)】 流木対策工(スリット架設)・現場塗装工・流路護岸工	滑川地区 根固め・水制工(根固めブロック制作)


## 令和2年 1月末 上松出張所 工事進捗状況

	令和元年度 木曾川水系 滑川整備工事 施工業者 木曾土工業(株)	令和元年度 木曾川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	令和元年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	令和元年度 木曾川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)
	進捗率(予定工程)   %   100.0 R1. 7.27 ~ R2. 2.14	進捗率(予定工程)   %   14.4 R1. 8.27 ~ R3. 2.15	進捗率(予定工程)   %   6.6 R1. 8.27 ~ R2. 6.19	進捗率(予定工程)   %   72.7 R1. 8.27 ~ R2. 2.21
				
今月作業	-	工場製作工(鋼製スリット製作) 砂防土工(堆積土石撤去)	準備工	コンクリート堰堤本体工
来月予定	2月14日完成検査。	工場製作工(鋼製スリット製作) 砂防土工(堆積土石撤去)	仮設工(伐採工)	コンクリート堰堤本体工
	令和元年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)			
	進捗率(予定工程)   %   0.3 R1. 9.12 ~ R2. 2.28			
				
今月作業	準備工・伐採工			
来月予定	伐採工・工事用道路拡幅工			

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

① 

21BP号(上) 17.00kp~16.10kp 道路除草工  
 工 期：平成31年04月01日~平成33年03月31日  
 施工業者：日本ハイウェイ・サービス (株)  
 施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp  
 R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

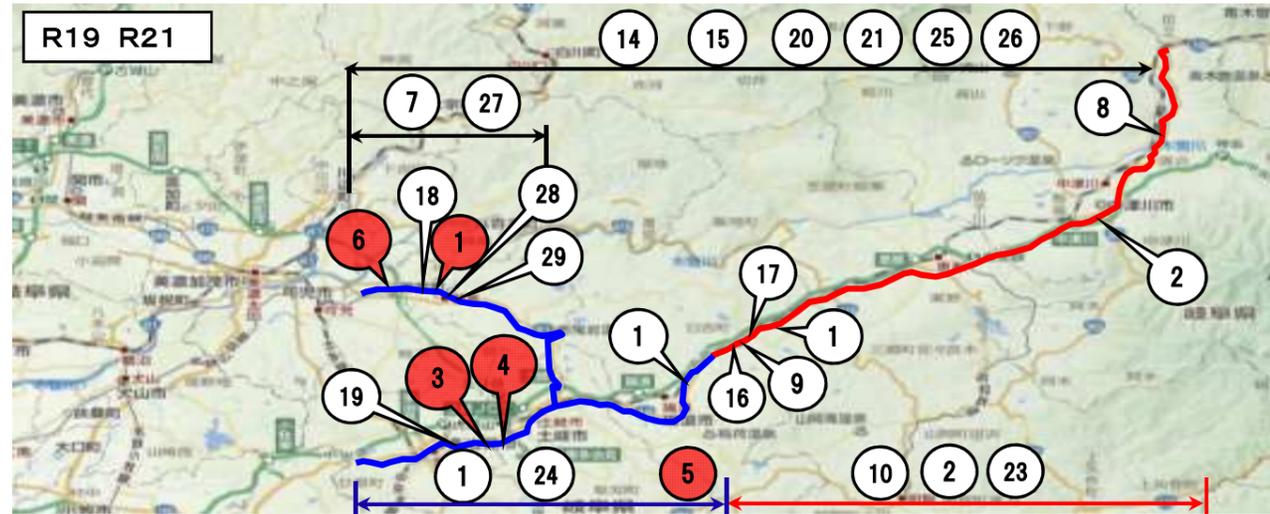

平成30年度 多治見国道東部維持修繕工事

② 

19号90.380kp(下) 損傷復旧工  
 工 期：平成30年04月01日~令和2年03月31日  
 施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス  
 施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度 19号土岐口道路建設工事

③ 

19号39.90kp ~40.30kp付近  
 工 期：平成30年04月27日~平成31年09月30日  
 施工業者：(株)吉川組  
 施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先 **完**

平成30年度 19号土岐口道路改良工事

④ 

19号 39.9kp~ 上り線 舗装工  
 工 期：平成30年04月26日~平成31年09月30日  
 施工業者：(株)藤本組  
 施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先 **完**

平成30年度多治見国道管内交通事故対策整備工事

⑤ 

19号 70.7kp~70.9kp 薄層カラー舗装工  
 工 期：平成30年07月12日~令和元年06月10日  
 施工業者：(株)加藤工務店  
 施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内 **完**

平成30年度 多治見国道21号御嵩御嵩地区亜炭坑充填工事

⑥ 

確認ボーリング (大庭工区)  
 工 期：平成30年10月06日~令和元年07月31日  
 施工業者：徳倉建設(株)  
 施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内 **完**

平成30年度多治見管内橋梁補修工事

⑦ 

多治見工区 現場塗替工  
 工 期：平成31年01月24日~平成32年03月27日  
 施工業者：(株)吉川工務店  
 施工箇所：多治見市、土岐市、御嵩町、恵那市

平成30年度多治見国道東部橋梁補修工事

⑧ 

乙姫大橋 足場解体、前野橋 完了  
 工 期：平成31年01月24日~令和2年03月13日  
 施工業者：(株)梅田組  
 施工箇所：中津川市山口

平成30年度瑞浪恵那道路瑞浪地区下部工事

⑨ 

U型擁壁工、新滝沢川橋A1、仮設道路  
 工 期：平成31年01月19日~令和2年03月27日  
 施工業者：板垣建設(株)  
 施工箇所：瑞浪市

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

⑩ 

駒場跨道橋 橋梁支承工 (支承取替)  
 工 期：平成31年03月09日~平成32年02月28日  
 施工業者：(株)中島工務店  
 施工箇所：恵那市~中津川市

平成30年度多治見国道防災対策工事

⑪ 

排水構造物工・道路付属施設工  
 工 期：平成31年03月26日~令和2年3月19日  
 施工業者：セントラル建設(株)  
 施工箇所：瑞浪市、御嵩町

平成30年度多治見国道21号顔戸地区亜炭坑充填工事

⑫ 

完了  
 工 期：令和元年05月07日~令和2年01月31日  
 施工業者：徳倉建設(株)  
 施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地先 **完**

⑬ 平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事



A2橋台 躯体施工中 用水付替工 施工中  
 工 期：平成31年04月05日～令和2年05月25日  
 施工業者：(株)中島工務店  
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

⑭ 平成30年度 多治見国道CCTV設備工事



CCTV設備工 CCTVカメラ設置  
 工 期：平成31年04月15日～令和2年03月19日  
 施工業者：(株)シーテック  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

⑮ 平成31年度多治見電気通信設備維持工事



CCTV設備工(次月情報板) HD簡易型IPカメラ設置  
 工 期：平成31年04月01日～平成32年03月31日  
 施工業者：(株)ミライト  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所無線室

⑯ 平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事



P3橋脚 鉄筋・型枠組立  
 工 期：令和元年06月28日～令和3年02月26日  
 施工業者：(株)加藤工務店  
 施工箇所：瑞浪市土岐町地先

⑰ 平成31年度瑞浪恵那道路整備工事



新滝沢川橋A2 橋台躯体工  
 工 期：令和元年06月28日～令和2年03月30日  
 施工業者：セントラル建設(株)  
 施工箇所：瑞浪市土岐町～恵那市武並町地先

⑱ 令和元年度多治見国道21号大庭地区亜炭坑充填工事



充填孔設置工、充填到達観測孔設置工  
 工 期：令和元年07月27日～令和2年02月28日  
 施工業者：飛鳥建設(株)  
 施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

⑲ 令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事



東町横断歩道橋(足場工・薄層カラー舗装工)  
 工 期：令和元年08月07日～令和2年05月01日  
 施工業者：ウノインフラプランテック(株)  
 施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

⑳ 令和元年度多治見国道管内整備工事



瀬田交差点(舗装工 区画線工)完了  
 工 期：令和元年08月20日～令和2年03月30日  
 施工業者：(株)鳴海組  
 施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

㉑ 令和元年度多治見国道ブロープ情報用電源設備工事



無停電源設備設置工(北小田町上り)  
 工 期：令和元年08月07日～令和2年02月28日  
 施工業者：サンケン電気(株)  
 施工箇所：多治見管内

㉒ 令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事



橋脚巻立工(下地処理、コンクリート切断)  
 工 期：平成31年08月27日～令和元年07月31日  
 施工業者：(株)吉川工務店  
 施工箇所：中津川市中津川地先

㉓ 令和元年度多治見国道東部除雪作業



凍結防止剤散布・積込  
 工 期：令和元年10月09日～令和2年03月31日  
 施工業者：(株)鳴海組  
 施工箇所：瑞浪市土岐町～木曾郡南木曾町

㉔ 令和元年度多治見国道西部除雪作業



凍結防止剤散布工  
 工 期：令和元年10月08日～令和2年03月31日  
 施工業者：セントラル建設(株)  
 施工箇所：内津～土岐町、泉寺田町～中恵土

㉕ 令和元年度多治見国道管内道の駅改修工事



仮設工 解体工 内装工 タイル工 耐震改修工 機械設備工 電気設備工  
 工 期：令和元年11月07日～令和2年02月28日  
 施工業者：恵中建設(株)  
 施工箇所：道の駅内公共便所及び情報館

㉖ 令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

準備工

準備工(機器製作)  
 工 期：令和元年11月25日～令和2年08月31日  
 施工業者：大藤電設(株)  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

㉗ 令和元年度多治見国道21号整備工事



準備工  
 工 期：令和2年01月10日～令和2年11月30日  
 施工業者：(株)中島工務店  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区亜炭坑充填工事

28

準備工

準備工

工期：令和2年03月10日～令和2年08月31日  
施工業者：徳倉建設（株）  
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道21号中畑地区亜炭坑充填工事

29

準備工

準備工

工期：令和2年04月07日～令和2年12月25日  
施工業者：小池土木（株）  
施工箇所：可児郡御嵩町地先

