

令和2年2月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（中津川流域）			進 捗 率		②（落合川流域）			進 捗 率		③（中津川出張所管内）			進 捗 率	
工 事 名：平成30年度 中津川第2砂防堰堤改築工事			予定	88.0%	工 事 名：平成30年度 本谷砂防堰堤工事用道路工事			予定	93.6%	工 事 名：平成31年度 中津川出張所整備工事			予定	90.5%
契約工期：平成31年3月28日～令和2年3月31日 変更工期：令和1年5月13日～令和2年3月31日			実施	90.0%	契約工期：平成31年3月30日～令和2年3月31日			実施	93.0%	工 期：平成31年4月1日～令和2年3月31日			実施	94.5%
請負業者名：（株）加藤工務店			差	2.0%	請負業者名：（株）鳴海組			差	-0.6%	請負業者名：（株）吉川工務店			差	4.0%
														
今月作業：道路改良工 ブロック積工・排水構造物工・防護柵工、アスファルト舗装工			今月作業：高強度ネット工完了			今月作業：道路改良工 路側防護柵工、流路工 床固め工、植生工			今月作業：宮前橋下流右岸道路整備工事 盛土工、四ツ目川遊砂工整備工事					
来月予定：道路改良工 アスファルト舗装工、後片付け 完成検査：3/30			来月予定：完成検査：3/30			来月予定：流路工 床固め工 後片付け 完成検査：3/30			来月予定：四ツ目川遊砂工整備工事 後片付け 完成検査：3/30					
④（中津川流域）		進 捗 率	⑤（落合川流域）		進 捗 率	⑥（落合川流域）		進 捗 率	⑦（落合川流域）		進 捗 率			
工 事 名：平成31年度 川上流路工宮前橋工事		予定 73.5%	工 事 名：令和元年度 荒道工事用道路工事 補強土壁工：工事の(一部)一時中止(令和2年4月26日まで) 工 期：令和元年9月12日～令和2年4月30日 (繰越予定工期)：～令和2年6月30日		予定 38.7%	工 事 名：令和元年度 薬師沢砂防堰堤工事		予定 47.8%	工 事 名：令和元年度 中津川管内砂防堰堤補強工事		予定 0.1%			
工 期：令和元年6月26日～令和2年5月29日		実施 76.8%	工 期：令和元年9月12日～令和2年4月30日 (繰越予定工期)：～令和2年6月30日		実施 34.3%	工 期：令和元年9月12日～令和2年5月22日		実施 46.5%	工 期：令和2年2月14日～令和2年7月31日		実施 0.1%			
請負業者名：（株）中島工務店		差 3.3%	請負業者名：（株）鳴海組		差 -4.4%	請負業者名：（株）吉川工務店		差 -1.3%	請負業者名：（株）加藤工務店		差 0.0%			
									準備工					
今月作業：橋梁下部 A1橋台:コンクリート打設・2号帯工:コンクリート打設			今月作業：仮設工: 砂防締切工 道路改良:法枠工(2/27現場推進会議開催)			今月作業：カルバート工:型枠組立及びコンクリート打設 1号床固工:コンクリート打設			今月作業：2/25:施工計画書(Webカメラ) 準備工					
来月予定：橋梁下部 A1橋台工:コンクリート打設 P1橋脚工:床掘、コンクリート打設			来月予定：仮設工: 砂防締切工 道路改良:盛土工 法面工:法枠施工			来月予定：カルバート工:養生、埋戻し 2号床固工:床掘			来月予定：本谷地区:伐採工、砂防ソイルセメント工:試験施工 池の谷地区:伐採工					

令和2年2月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工 事 名 : 平成30年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事 工 期 : 平成31年3月9日 ~ 令和2年3月16日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率: 予定 100 % 実施 100 % 差 0.0%	② 工 事 名 : 平成30年度 妻木出張所整備工事 工 期 : 平成31年3月30日 ~ 令和2年3月31日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率: 予定 90.0 % 実施 98.9 % 差 8.9%
堰堤部 	指示2: 市之倉里山作業道  指示9: 窯洞流路 
《今月作業》 3/2完成検査 《4月作業》 -	《今月作業》 指示9:護床ブロック設置、指示11(市之倉里山作業道):アスファルト舗装 3/31完成検査 《4月作業》 -
③ 工 事 名 : 平成30年度 庄内川水系 妻木管内流木対策整備工事 工 期 : 平成31年4月8日 ~ 令和2年3月19日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率: 予定 97.9 % 実施 97.9 % 差 0.0%	④ 工 事 名 : 令和元年度 庄内川水系 追沢川流路工事 工 期 : 令和元年7月30日 ~ 令和2年3月19日 施工業者: (株)吉川組 進 捗 率: 予定 95.1 % 実施 100 % 差 4.9%
水道川地区 	水路部  伐採部 
《今月作業》 水道川地区:工事用道路盛土(敷砂利)、準備工(片付け) 3/27完成検査 《4月作業》 -	《今月作業》 準備工(片付け) 3/27完成検査 《4月作業》 -

令和2年 2月末 上松出張所 工事進捗状況																
	①	平成29年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)			②	平成30年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			③	平成30年度 上松出張所整備工事 施工業者 奥田工業(株)			④	平成30年度 木曽川水系 下洞沢砂防施設工事 施工業者 大宗土建(株)		
		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	128.0		進捗率(予定工程)	%	100.0
		H30.3.30 ～ R1.10.31				H30.5.25 ～ R2. 2.28				H31.3.27 ～ R2. 3.31				H31.3.29 ～ R2. 2.28		
																
今月作業	—			2月21日完成検査。			桜洞堰堤伐採工(後片付け)			1月20日完成検査。						
来月予定	—			—			3月30日完成検査予定。			—						
	⑤	平成30年度 木曽川水系 和合工事用道路工事 施工業者 (株)宮坂組			⑥	平成30年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑦	平成30年度 木曽川水系 下在蛇抜沢砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)			⑧	平成30年度 木曽川水系 上松管内砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)		
		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	91.5		進捗率(予定工程)	%	85.0
		H31.3.29 ～ R2. 2.28				H31.4.3 ～ R2. 2.28				H31.4.9 ～ R2. 3.30				H31.4.16 ～ R2. 3.28		
																
今月作業	2月26日完成検査。			—			コンクリート堰堤工【側壁(型枠組立・コンクリート打設)作業土工(埋戻)】 床固め工【側壁・水叩(型枠組立・コンクリート打設)】 流木対策工(スリット架設)・現場塗装工・流路護岸工			滑川地区 根固め・水制工(根固めブロック制作)						
来月予定	—			—			コンクリート堰堤工・床固め工【作業土工(埋戻)】 法面工(わら伏せ)・境界工・銘板工・流路護岸工 流木対策工(ロープネット)・跡片付け工			滑川地区 根固め・水制工(根固めブロック制作・据付け) 3月30日完成検査予定。						

令和2年 2月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨	令和元年度 木曽川水系 滑川整備工事 施工業者 木曽土建工業(株)	⑩	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	⑪	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	⑫	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)
		進捗率(予定工程) % 100.0		進捗率(予定工程) % 15.6		進捗率(予定工程) % 11.0		進捗率(予定工程) % 78.9
		R1. 7.27 ~ R2. 2.14		R1. 8.27 ~ R3. 2.15		R1. 8.27 ~ R2. 6.19		R1. 8.27 ~ R2. 5.29
								
今月作業		2月14日完成検査。		工場製作工(鋼製スリット製作) 砂防土工(堆積土石撤去)		伐採工		コンクリート堰堤本体工
来月予定		-		工場製作工(鋼製スリット製作) コンクリート堰堤工(型枠組立・コンクリート打設) 3月26日既済検査(予定)。		伐採工(枝葉集積、運搬・処分) 仮設工(仮排水路、仮設道路)		コンクリート堰堤本体工

	⑬	令和元年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)	⑭	令和元年度 木曽川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	⑮	令和元年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)	⑯	令和元年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組
		進捗率(予定工程) % 0.3		進捗率(予定工程) % 0.0(0.0)		進捗率(予定工程) % 0.0(0.0)		進捗率(予定工程) % 0.0(0.0)
		R1. 9.12 ~ R2. 2.28		R2. 3. 2 ~ R2. 9.30		R2. 3. 2 ~ R2. 9.30		R2. 3. 16 ~ R2. 9.30
				写真無し		写真無し		写真無し
今月作業		準備工・伐採工・道路改良		-		-		-
来月予定		道路改良		施工計画書提出。		施工計画書提出。		施工計画書提出。


令和2年 2月末 上松出張所 工事進捗状況																				
	⑰	令和元年度 木曽川水系 下洞沢砂防堰堤工事				⑱	令和元年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事				⑲	令和元年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事								
		施工業者 松本土建(株)					施工業者					施工業者								
		進捗率(予定工程)		%	0.0(0.0)		進捗率(予定工程)		%			進捗率(予定工程)		%						
		R2. 〇. 〇 ~ R2. 9.30					～					～								
		写真無し					写真無し					写真無し								
今月 作業		-					-					-								
来月 予定		-					-					-								
今月 作業																				
来月 予定																				

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21BP号(下) 21.00kp~21.10kp 道路除草工
工 期：平成31年04月01日~平成33年03月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP
進 捗 率：予定 48.7% 実施 56.2%

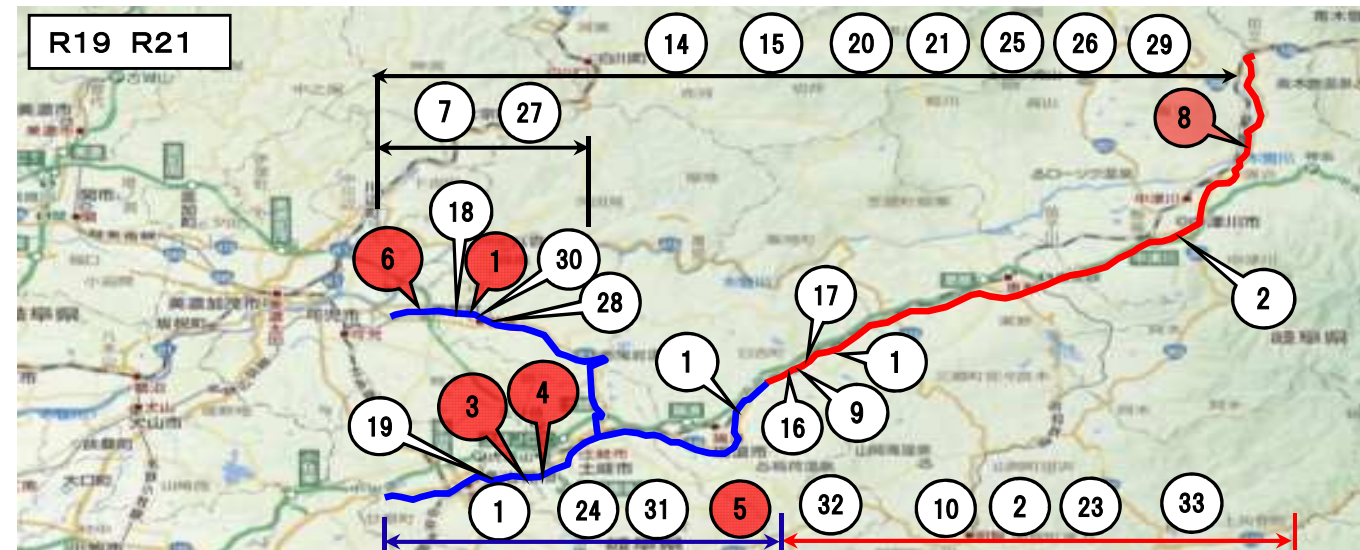

平成30年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



9号78.080kp(上) 道路照明維持工(LED灯具交換工)
工 期：平成30年04月01日~令和2年03月31日
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp
進 捗 率：予定 98.0% 実施 99.0%

平成30年度 19号土岐口道路建設工事

③



19号39.90kp ~40.30kp付近
工 期：平成30年04月27日~平成31年09月30日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先
進 捗 率：予100.0% 実施 100.0% **完**

平成30年度 19号土岐口道路改良工事

④



19号 39.9kp~ 上り線 舗装工
工 期：平成30年04月26日~平成31年09月30日
施工業者：(株)藤本組
施工箇所：岐阜県土岐市土岐口地先
進 捗 率：予定 100.0% 実施 100.0% **完**

平成30年度多治見国道管内交通事故対策整備工事

⑤



19号 70.7kp~70.9kp 薄層カラー舗装工
工 期：平成30年07月12日~令和元年06月10日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内
進 捗 率：予定 100.0% 実施 100.0% **完**

平成30年度 多治見国道21号御嵩御嵩地区亜炭坑充填工事

⑥



確認ボーリング(大庭工区)
工 期：平成30年10月06日~令和元年07月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内
進 捗 率：予定 100.0% 実施 100.0% **完**

平成30年度多治見管内橋梁補修工事

⑦



土岐1工区 完了
工 期：平成31年01月24日~平成32年03月27日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：多治見市、土岐市、御嵩町、恵那市
進 捗 率：予定98.1% 実施98.1%

平成30年度多治見国道東部橋梁補修工事

⑧



乙姫大橋 足場解体、前野橋 完了
工 期：平成31年01月24日~令和2年03月13日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：中津川市山口
進 捗 率：予定 99.8% 実施 100.0% **完**

平成30年度瑞浪恵那道路瑞浪地区下部工事

⑨



滝沢川橋A1、工事用道路、
工 期：平成31年01月19日~令和2年03月27日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市
進 捗 率：予定 97.6% 実施 95.2%

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

⑩



駒場跨道橋 橋梁支承工(支承の若返り)
工 期：平成31年03月09日~令和2年06月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：恵那市~中津川市
進 捗 率：予定 60.6% 実施 60.6%

平成30年度多治見国道防災対策工事

⑪



御嵩工区 落石雪害防止工
工 期：平成31年03月26日~令和2年3月19日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市、御嵩町
進 捗 率：予定 97.7% 実施 98.5%

平成30年度多治見国道21号顔戸地区亜炭坑充填工事

⑫



完了
工 期：令和元年05月07日~令和2年01月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地先
進 捗 率：予定 100.0% 実施 100.0% **完**

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

⑬



A2橋台 躯体施工中 用水付替工 施工中

工 期：平成31年04月05日～令和2年07月22日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先
進 捗 率：予定 60.8% 実施 60.8%

平成30年度 多治見国道CCTV設備工事

⑭



CCTV設備工 CCTVカメラ設置

工 期：平成31年04月15日～令和2年03月19日
施工業者：(株)シーテック
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内
進 捗 率：予定 96.3% 実施 97.0%

平成31年度多治見電気通信設備維持工事

⑮



CCTV設備工(次月交差点) HD簡易型IPカメラ設置

工 期：平成31年04月01日～平成32年03月31日
施工業者：(株)ミライト
施工箇所：多治見砂防国道事務所無線室
進 捗 率：予定 98.0% 実施 97.6%

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑯



P3橋脚 鉄筋・型枠組立

工 期：令和元年06月28日～令和03年02月26日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先
進 捗 率：予定 59.5% 実施 56.0%

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑰



滝沢川橋A2:橋台躯体工・排水構造物工

工 期：令和元年06月28日～令和02年03月30日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市土岐町～恵那市武並町地先
進 捗 率：予定 85.0% 実施 34.2%

令和元年度多治見国道21号大庭地区亜炭坑充填工事

⑱



充填孔設置工、充填工

工 期：令和元年07月27日～令和02年03月30日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内
進 捗 率：予定 84.6% 実施 83.5%

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑲



東町横断歩道橋(防食塗装完了)

工 期：令和元年08月07日～令和02年05月01日
施工業者：ウノインフラプランテック(株)
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内
進 捗 率：予定 85.0% 実施 85.0%

令和元年度多治見国道管内整備工事

⑳



御嵩3工区 御嵩町中切地内(舗装工 区画線工)

工 期：令和元年08月20日～令和02年03月30日
施工業者：(株)鳴海組
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内
進 捗 率：予定 80.1% 実施 81.2%

令和元年度多治見国道ブロープ情報用電源設備工事

㉑



無停電電源設備設置工(山口下り)

工 期：令和元年08月07日～令和02年03月10日
施工業者：サンケン電気(株)
施工箇所：中津川市山口下り
進 捗 率：予定 98.0% 実施 98.0%

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

㉒



橋脚巻立工(鉄筋工)

工 期：平成31年08月27日～令和元年07月31日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市中津川地先
進 捗 率：予定 64.8% 実施62.0%

令和元年度多治見国道東部除雪作業

㉓



凍結防止剤散布・積込

工 期：令和元年10月09日～令和02年03月31日
施工業者：(株)鳴海組
施工箇所：瑞浪市土岐町～木曽郡南木曽町
進 捗 率：実施散布数量 0.5 t

令和元年度多治見国道西部除雪作業

㉔



凍結防止剤散布工

工 期：令和元年10月08日～令和02年03月31日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：内津～土岐町、泉寺田町～中恵土
進 捗 率：実施散布数量 2.0 t

令和元年度多治見国道管内道の駅改修工事

㉕



仮設工 解体工 塗装工 建具工 内装工 タイル工 耐震改修工 雨水排水工 外構 機械設備工 電気設備工

工 期：令和元年11月07日～令和02年03月30日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：道の駅内公共便所及び情報館
進 捗 率：予定 91.8% 実施 83.1%

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

㉖

準備工

準備工(機器製作)

工 期：令和元年11月25日～令和02年08月31日
施工業者：大藤電設(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内
進 捗 率：予定 41.8% 実施 41.8%

令和元年度多治見国道21号整備工事

㉗



準備工

工 期：令和2年01月10日～令和02年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内
進 捗 率：予定 2% 実施 2%

令和元年度多治見国道21号御岳地区亜炭坑充填工事

28

準備工

準備工

工期：令和2年03月10日～令和2年08月31日
施工業者：徳倉建設（株）
施工箇所：可児郡御嵩町地先
進捗率：予定 0% 実施 0%

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事

29

準備工

準備工

工期：令和2年03月18日～令和3年02月26日
施工業者：（株）梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内
進捗率：予定 0% 実施 0%

令和元年度多治見国道21号中畑地区亜炭坑充填工事

30

準備工

準備工

工期：令和2年04月07日～令和2年12月25日
施工業者：小池土木（株）
施工箇所：可児郡御嵩町地先
進捗率：予定 0% 実施 0%

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事

31

準備工

準備工

工期：令和02年03月23日～令和03年01月22日
施工業者：（株）吉川組
施工箇所：多治見市地内、土岐市地内
進捗率：予定 0% 実施 0%

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事

32

準備工

準備工

工期：令和02年04月13日～令和03年02月18日
施工業者：恵中建設（株）
施工箇所：瑞浪市～恵那市
進捗率：予定 0% 実施 0%

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事

33

準備工

準備工

工期：令和02 年04月20日～令和03年02月18日
施工業者：（株）吉川工務店
施工箇所：中津川市地内
進捗率：予定 0% 実施 0%
