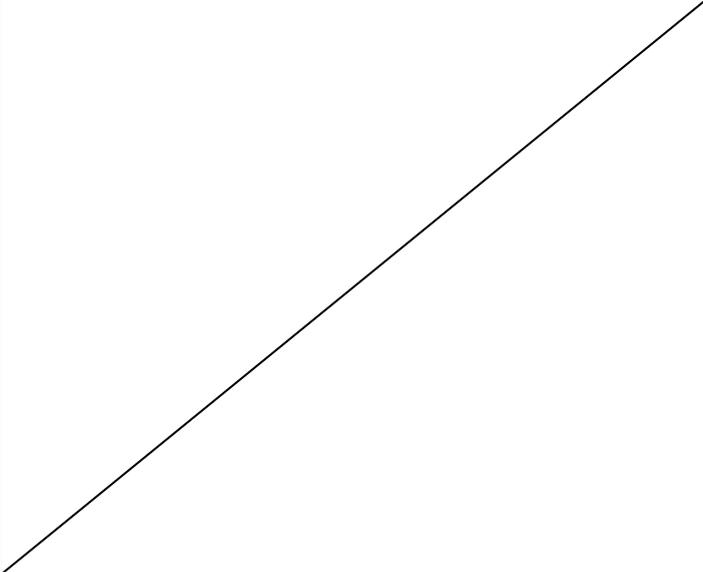


## 令和2年3月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (中津川流域)	進捗率	② (落合川流域)	進捗率	③ (落合川流域)	進捗率	④ (落合川流域)	進捗率
工事名：平成31年度 川上流路工宮前橋工事 契約工期：令和1年6月26日 ~ 令和2年5月29日 請負業者名：(株)中島工務店	予定 86.3% 実施 90.8% 差 4.5%	工事名：令和元年度 荒道工事用道路工事 ※令和2年4月26日まで工事の一部一時中止…補強土壁工 契約工期：令和1年9月12日 ~ 令和2年4月30日 変更予定工期：令和2年6月30日 請負業者名：(株)鳴海組	予定 48.2% 実施 48.2% 差 0.0%	工事名：令和元年度 薬師沢砂防堰堤工事口 契約工期：令和1年9月12日 ~ 令和2年5月22日 請負業者名：(株)吉川工務店	予定 76.7% 実施 71.4% 差 -5.3%	工事名：令和元年度 木曾川水系中津川管内砂防堰堤補強工事 契約工期：令和2年2月14日 ~ 令和2年7月31日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 16.2% 実施 6.9% 差 -9.3%
						<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">本谷第2砂防</div> 	
今月作業：橋梁下部 A1橋台(コンクリート打設)、P1橋脚工(床掘・コンクリート打設) 来月予定：床固め工(コンクリート打設・埋戻し)、流路護岸工(大型ブロック積み)		今月作業：仮設工(砂防締切工)、道路改良(盛土工)、法面工(法枠施工) 来月予定：道路土工(盛土工)、ブロック積み工、排水構造物工、河川横断工		今月作業：カルバート工(養生・埋戻し)、2号床固め工(床掘) 来月予定：1号床固め工・重力式擁壁(コンクリート打設)、護岸工(ブロック積み)		今月作業：仮設工、伐採工 来月予定：仮設工、砂防ソイルセメント工(試験施工)	
行程が遅れ気味である。理由として当初発注には伐採が入っておらず、工事着手に遅れた。 ・5月中に行程見直し(工期延期含む)を予定 工務一課と協議							
⑤ (落合川流域)	進捗率	⑥ (中津川出張所管内)	進捗率	⑦ (落合川流域)	進捗率	⑧ (中津川流域)	進捗率
工事名：令和元年度 本谷砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年4月1日 ~ 令和2年9月30日 請負業者名：(株)鳴海組	予定 0.0% 実施 0.0% 差 0.0%	工事名：令和元年度 中津川出張所管内整備工事 契約工期：令和2年3月28日 ~ 令和3年3月31日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 0.0% 実施 0.0% 差 0.0%	工事名：令和元年度 日陰第2砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年4月7日 ~ 令和3年2月21日 請負業者名：(株)中島工務店	予定 0.0% 実施 0.0% 差 0.0%	工事名：令和元年度 下平次第8砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年4月10日 ~ 令和3年2月12日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 0.0% 実施 0.0% 差 0.0%
余裕期間中		準備工		余裕期間中		余裕期間中	
今月作業：— 来月予定：準備工		今月作業：準備工 来月予定：準備工		今月作業：— 来月予定：準備工		今月作業：— 来月予定：準備工	

## 令和2年3月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名: 令和元年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事</p> <p>工期: 令和2年3月27日 ~ 令和3年2月12日</p> <p>施工業者: (株)藤本組</p> <p>進捗率: 予定 0.0%      実施 0.0%      差 0.0%</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">堰堤部</div>  <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">《今月作業》設計照査・施工計画作成 《5月作業》準備工(起工測量)、伐採工</p>	<p>②</p> <p>工事名: 令和元年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期: 令和2年3月31日 ~ 令和2年7月31日</p> <p>施工業者: (株)藤本組</p> <p>進捗率: 予定 0.0%      実施 0.0%      差 0.0%</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">水道川地区</div>  <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">岩山地区</div>  <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">《今月作業》設計照査・施工計画作成 《5月作業》水道川工区:準備工(工事用道路整備)、腹付け部(表面処理)</p>
<p>③</p> <p>工事名: 令和2年度 庄内川水系 妻木出張所整備工事</p> <p>工期: 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日</p> <p>施工業者: (株)藤本組</p> <p>進捗率: 予定 0.0%      実施 0.0%      差 0.0%</p> <div style="text-align: center; height: 300px; border: 1px solid black; margin-top: 10px;">  </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">《今月作業》施工計画作成 《5月作業》大洞川伐採工</p>	<p>④</p> <p>工事名: 0</p> <p>工期: 0</p> <p>施工業者: 0</p> <p>進捗率: 予定 %      実施 %      差 0.0%</p> <div style="text-align: center; height: 300px; border: 1px solid black; margin-top: 10px;">  </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">《今月作業》 《5月作業》</p>

## 令和2年 3月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 平成29年度 木曾川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)		② 平成30年度 木曾川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)		③ 平成30年度 上松出張所整備工事 施工業者 奥田工業(株)		④ 平成30年度 木曾川水系 下洞沢砂防施設工事 施工業者 大宗土建(株)	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	H30.3.30~R110.31	100.0	H30.5.25~R2.2.28	100.0	H31.3.27~R2.3.31	100.0	H31.3.29~R2.2.28	100.0
	 <span style="color: red; font-weight: bold;">完成</span>		 <span style="color: red; font-weight: bold;">完成</span>		 <span style="color: red; font-weight: bold;">完成</span>		 <span style="color: red; font-weight: bold;">完成</span>	
今月作業	-		-		3月30日完成検査。		-	
来月予定	-		-		-		-	
	⑤ 平成30年度 木曾川水系 和合工事用道路工事 施工業者 (株)宮坂組		⑥ 平成30年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)		⑦ 平成30年度 木曾川水系 下在蛇抜沢砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)		⑧ 平成30年度 木曾川水系 上松管内砂防施設工事 施工業者 奥田工業(株)	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	H31.3.29~R2.2.28	100.0	H31.4.3~R2.2.28	100.0	H31.4.9~R2.3.30	100.0	H31.4.16~R2.3.28	100.0
	 <span style="color: red; font-weight: bold;">完成</span>		 <span style="color: red; font-weight: bold;">完成</span>		 <span style="color: red; font-weight: bold;">完成</span>		 <span style="color: red; font-weight: bold;">完成</span>	
今月作業	-		-		3月26日完成検査。		3月30日完成検査。	
来月予定	-		-		-		-	

## 令和2年3月末 上松出張所 工事進捗状況

	令和元年度 木曾川水系 滑川整備工事 施工業者 木曾土建工業(株)		令和元年度 木曾川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)		令和元年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)		令和元年度 木曾川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	R1. 7.27~R2.2.14	100.0	R1. 8.27~R3.2.15	56.4	R1. 8.27~R2.6.19	16.0	R1. 8.27~R2.5.29	90.4
								
今月作業	-		工場製作工(鋼製スリット製作) コンクリート堰堤工(型枠組立・コンクリート打設)		伐採工 仮設工(仮排水工) 仮設工(仮設道路)		コンクリート堰堤本体工	
来月予定	-		コンクリート堰堤工(型枠組立・コンクリート打設)		仮設工(仮設道路) 作業土工(カルバート工) 作業土工(流路護岸工)		コンクリート堰堤本体工、作業土工	
	令和元年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)		令和元年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)		令和元年度 木曾川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株)		令和元年度 木曾川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	R1. 9.12~R2.6.19	1.6 週休2日	R2. 3. 2~R2.9.30	1.4 ICT	R2. 3. 2~R2.9.30	0.5 ICT・週休2日	R2. 3. 2~R2.9.30	2.0 週休2日
								
今月作業	道路改良(擁壁工、舗装工)		準備工、仮設工		書類作成		鋼製スリット 工場製作	
来月予定	伐採工、仮設工		砂防土工(掘削・運搬)		書類作成・仮設工		鋼製スリット 工場製作	


## 令和2年 3月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑰ 令和元年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組			⑱ 令和元年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑲ 令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曾土建工業(株)			⑳ 令和元年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)		
	進捗率(予定工程)	%	0.3	進捗率(予定工程)	%	0.0	進捗率(予定工程)	%	0.0	進捗率(予定工程)	%	0.0
	R2. 3. 16～R2.9.30 ICT			R2. 3.31～R3.2.12			R2. 4. 1～R3.3.31			R2. 4. 17～R3.2.12		
				写真無し			写真無し			写真無し		
今月作業	準備工			-			-			-		
来月予定	準備工(伐採)			施工計画書提出。			施工計画書提出。			-		
	⑰ 令和2年度 木曾川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)											
	進捗率(予定工程)	%	0.0									
	写真無し											
今月作業	-											
来月予定	-											

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事



①  
21BP号(下) 21.00kp~21.10kp 道路除草工  
工 期:平成31年04月01日~平成33年03月31日  
施工業者:日本ハイウェイ・サービス(株)  
施工箇所:R19 31.5kp~55.2kp  
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP  
進捗率:予定 57.75% 実績 57.75%

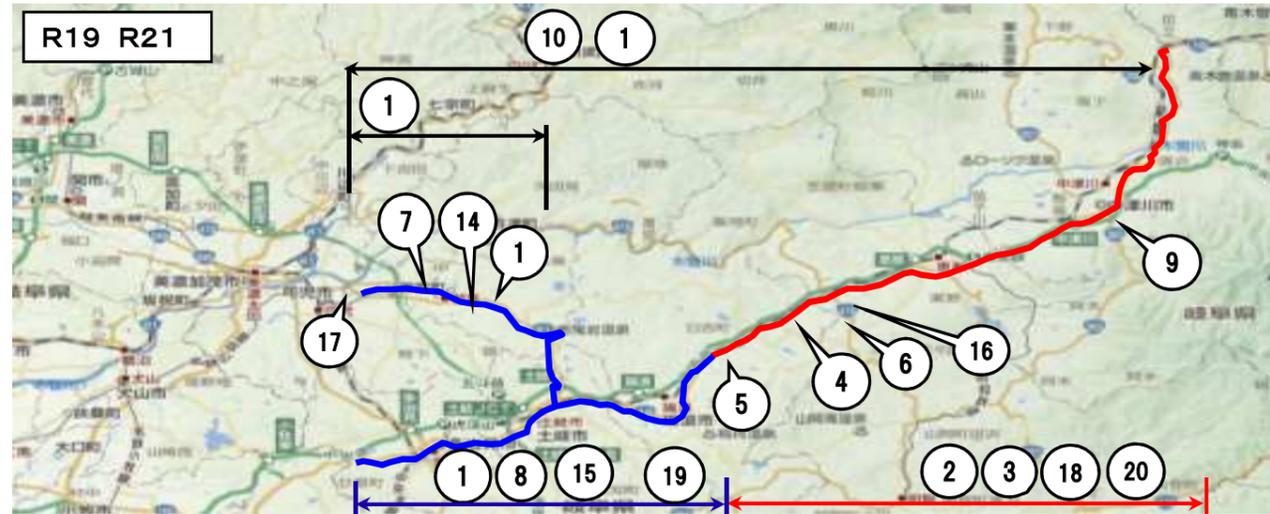

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②

準備中

工 期:令和2年04月01日~令和4年09月30日  
施工業者:(有)木曾ハイウェイサービス  
施工箇所:R19 55.2kp~97.0kp  
進捗率:予定 0.0% 実績 0.0%

平成30年度多治見国道橋梁補修工事



③  
駒場跨道橋 A1側 支承取替工 アソカ定着  
工 期:平成31年03月09日~令和2年06月30日  
施工業者:(株)中島工務店  
施工箇所:恵那市~中津川市  
進捗率:予定 67.7% 実績 67.4%

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事



④  
A2橋台 躯体施工中 用水付替工 施工中  
工 期:平成31年04月05日~令和2年07月22日  
施工業者:(株)中島工務店  
施工箇所:瑞浪市釜戸町地先  
進捗率:予定 68.9% 実績 70.3%

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事



⑤  
P3橋脚 足場解体、準備工  
工 期:令和元年06月28日~令和3年02月26日  
施工業者:(株)加藤工務店  
施工箇所:瑞浪市土岐町地先  
進捗率:予定 72.5% 実績 74.5%

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事



⑥  
滝沢川橋A2:橋台躯体工・排水構造物工  
工 期:令和元年06月28日~令和2年05月29日  
施工業者:セントラル建設(株)  
施工箇所:瑞浪市土岐町~恵那市武並町地先  
進捗率:予定 57.7% 実績 47.8%

令和元年度多治見国道21号大庭地区垂炭坑充填工事



⑦  
プラント整備工、保守管理  
工 期:令和元年07月27日~令和2年04月30日  
施工業者:飛鳥建設(株)  
施工箇所:岐阜県可児郡御嵩町地内  
進捗率:予定 83.9% 実績 83.9%

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事



⑧  
東町横断歩道橋(高欄設置完了)  
工 期:令和元年08月07日~令和2年05月01日  
施工業者:ウノインフラプランテック(株)  
施工箇所:瑞浪国道維持出張所管内  
進捗率:予定 93.1% 実績 92.1%

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事



⑨  
橋脚巻立工(打設完了)  
工 期:平成31年08月27日~令和元年07月31日  
施工業者:(株)吉川工務店  
施工箇所:中津川市中津川地先  
進捗率:予定 76.5% 実績 76.1%

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

⑩

準備工

準備工(機器製作)  
工 期:令和元年11月25日~令和2年08月31日  
施工業者:大藤電設(株)  
施工箇所:多治見砂防国道事務所管内  
進捗率:予定 54.8% 実績 54.8%

令和元年度多治見国道21号整備工事



⑪  
準備工  
工 期:令和2年01月10日~令和2年11月30日  
施工業者:(株)中島工務店  
施工箇所:多治見砂防国道事務所管内  
進捗率:予定 3.0% 実績 3.0%

令和元年度多治見国道21号御岳地区垂炭坑充填工事



⑫  
準備工  
工 期:令和2年03月10日~令和2年08月31日  
施工業者:徳倉建設(株)  
施工箇所:可児郡御嵩町地先  
進捗率:予定 0% 実績 0%

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事

⑬ 

準備工

工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日  
 施工業者：(株)梅田組  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内  
 進捗率：予定 0.5% 実績 0.3%

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事

⑭ 

準備工 多治見1工区

工 期：令和02年03月23日～令和03年01月22日  
 施工業者：(株)吉川組  
 施工箇所：多治見市地内、土岐市地内  
 進捗率：予定 0% 実績 0%

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事

⑮

準備工

準備工

工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日  
 施工業者：中部塗装(株)  
 施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内  
 進捗率：予定 0.0% 実績 0.0%

令和元年度多治見国道21号中畑地区垂炭坑充填工事

⑯

準備工

準備工

工 期：令和2年04月07日～令和2年12月25日  
 施工業者：小池土木(株)  
 施工箇所：可児郡御嵩町地先  
 進捗率：予定 0% 実績 0%

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事

⑰

準備工

準備工

工 期：令和02年04月13日～令和03年02月18日  
 施工業者：恵中建設(株)  
 施工箇所：瑞浪市～恵那市  
 進捗率：予定 0% 実績 0%

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事

⑱

準備工

準備工

工 期：令和02年04月20日～令和03年02月18日  
 施工業者：(株)吉川工務店  
 施工箇所：中津川市地内  
 進捗率：予定 0% 実績 0%

令和元年度多治見管内改築舗装工事

⑲

準備工

準備工

工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日  
 施工業者：(株)NIPPO  
 施工箇所：可児郡御嵩町地先  
 進捗率：予定 00.0% 実績 00.0%

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

⑳

準備工

準備工

工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日  
 施工業者：(株)吉川工務店  
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先  
 進捗率：予定 0.0% 実績 0.0%

Blank box for project information.

Blank box for project information.
