

令和2年4月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（中津川流域）		進 捗 率		②（落合川流域）		進 捗 率		③（落合川流域）		進 捗 率		④（落合川流域）		進 捗 率	
工 事 名：平成31年度 川上流路工宮前橋工事		予定	97.8%	工 事 名：令和元年度 荒道工用道路工事		予定	54.3%	工 事 名：令和元年度 薬師沢砂防堰堤工事		予定	91.2%	工 事 名：令和元年度 木曽川水系中津川管内砂防堰堤補強工事		予定	17.3%
契 約 工 期： 令和1年6月26日 ～ 令和2年5月29日		実施	98.0%	契 約 工 期： 令和1年9月12日 ～ 令和2年6月30日		実施	53.6%	契 約 工 期： 令和1年9月12日 ～ 令和2年5月22日		実施	93.4%	契 約 工 期： 令和2年2月14日 ～ 令和2年7月31日		実施	17.3%
請負業者名：（株）中島工務店		差	0.2%	請負業者名：（株）鳴海組		差	-0.7%	請負業者名：（株）吉川工務店		差	2.2%	請負業者名：（株）加藤工務店		差	0.0%
								本谷第2砂防							
今月作業：床固め工(コンクリート打設・埋戻し)、流路護岸工(大型ブロック積み)		今月作業：道路土工(盛土工)、ブロック積み工、排水構造物工、河川横断工		今月作業：1号床固め工・重力式擁壁(コンクリート打設)、護岸工(ブロック積み)		今月作業：準備工、仮設工、砂防ソイルセメント試験施工、コンクリート堰堤工									
来月予定：床固め工(埋戻し)、流路護岸工(大型ブロック埋戻し)、後片付け		来月予定：準備工、法面工		来月予定：道路土工(盛土)、仮設工(仮設物撤去)、後片付け		来月予定：コンクリート堰堤工									
⑤（落合川流域）		進 捗 率		⑥（中津川出張所管内）		進 捗 率		⑦（落合川流域）		進 捗 率		⑧（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和元年度 本谷砂防堰堤改築工事		予定	0.7%	工 事 名：令和元年度 中津川出張所管内整備工事		予定	2.1%	工 事 名：令和元年度 日陰第2砂防堰堤改築工事		予定	0.6%	工 事 名：令和元年度 下平次第8砂防堰堤改築工事		予定	1.2%
契 約 工 期： 令和2年4月1日 ～ 令和2年9月30日		実施	0.7%	契 約 工 期： 令和2年3月28日 ～ 令和3年3月31日		実施	2.1%	契 約 工 期： 令和2年4月7日 ～ 令和3年2月21日		実施	0.6%	契 約 工 期： 令和2年4月10日 ～ 令和3年2月12日		実施	1.2%
請負業者名：（株）鳴海組		差	0.0%	請負業者名：（株）加藤工務店		差	0.0%	請負業者名：（株）中島工務店		差	0.0%	請負業者名：（株）加藤工務店		差	0.0%
															
今月作業：準備工		今月作業：下平次第8倒木処理、四ツ目左岸用水路整備、杉流堰堤堆砂敷整備		今月作業：準備工		今月作業：準備工		今月作業：準備工、仮設工							
来月予定：構造物撤去工、仮設工(進入路設置)		来月予定：中津川第2法面崩落対策、横断幕揭示(土砂災害防止月間)		来月予定：準備工		来月予定：準備工、仮設工									

令和2年4月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

①

工事名： 令和元年度
庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事
工 期： 令和2年3月27日 ～ 令和3年2月12日

施工業者：(株)藤本組

進捗率： 予定 0.0% 実施 0.0% 差 0.0%

堰堤部



《今月作業》 準備工(起工測量)、伐採工、作業土工

《6月作業》 地盤改良、コンクリート堰堤本体工

②

工事名： 令和元年度
庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事
工 期： 令和2年3月31日 ～ 令和2年7月31日

施工業者：(株)藤本組

進捗率： 予定 0.0% 実施 0.0% 差 0.0%

水道川地区



《今月作業》 水道川工区：準備工(工事用道路整備)、コンクリート表面処理(腹付け部)

《6月作業》 水道川工区：コンクリート表面処理(腹付け部)、コンクリート堰堤工(腹付け部)

③

工事名： 令和2年度
妻木出張所整備工事
工 期： 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日

施工業者：(株)藤本組

進捗率： 予定 0.0% 実施 0.0% 差 0.0%



《今月作業》 大洞川伐採工

《6月作業》 大洞川伐採工

④

工事名： 令和2年度
庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事
工 期： 令和2年5月1日 ～ 令和3年2月21日

施工業者：(株)吉川組

進捗率： 予定 0.0% 実施 0.0% 差 0.0%



《今月作業》 準備工(施工計画等)

《6月作業》 準備工(伐採)、作業土工

令和2年 4月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)			②	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)			③	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			④	令和元年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)						
		進捗率(予定工程)		%		62.8	進捗率(予定工程)			%	31.1	進捗率(予定工程)		%	98.7	進捗率(予定工程)		%	4.9	
		R1. 8.27～R3.2.15				R1. 8.27～R2.6.19				R1. 8.27～R2.5.29				R1. 9.12～R2.6.19			週休2日			
																				
今月作業	コンクリート堰堤工(型枠組立・コンクリート打設)				仮設道路工 砂防土工(掘削・運搬)				コンクリート堰堤本体工				伐採工、仮設工							
来月予定	コンクリート堰堤工(型枠組立・コンクリート打設) 鋼製堰堤工(足場組立・スリット架設)				砂防土工(掘削・運搬) カルバート工 流路工(ブロック積み工)				書類整理				仮設工・橋台工							

	⑤	令和元年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑥	令和元年度 木曽川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株)			⑦	令和元年度 木曽川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑧	令和元年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組						
		進捗率(予定工程)		%		3.7	進捗率(予定工程)			%	4.2	進捗率(予定工程)		%	4.8	進捗率(予定工程)		%	1.8	
		R2. 3. 2～R2.9.30				ICT	R2. 3. 2～R2.9.30				ICT・週休2日	R2. 3. 2～R2.9.30			週休2日	R2. 3. 16～R2.9.30			ICT	
																				
今月作業	準備工、仮設工				仮設工(仮設ヤード設置等)				コンクリート堰堤工・構造物撤去工				準備工(伐採)							
来月予定	砂防土工(掘削・運搬)				砂防土工・掘削 伐採 仮設工(仮排水設置等)				コンクリート堰堤工				準備工(伐採)、道路土工、カルバート工							

令和2年 4月末 上松出張所 工事進捗状況


	⑨	令和元年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑩	令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑪	令和元年度 木曽川水系 蒲川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			⑫	令和2年度 木曽川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)									
		進捗率(予定工程)		%		0.1	進捗率(予定工程)			%	11.2	進捗率(予定工程)		%	0.1	進捗率(予定工程)		%	0.2				
		R2. 3.31～R3.2.12		週休2日		R2. 4. 1～R3.3.31				R2. 4. 17～R3.2.12		週休2日		R2. 4. 22～R3.2.12		週休2日							
																							
今月 作業	準備工				桜洞堆砂敷:伐採工 、 渡島蛇抜沢流路内:除草工				準備工(書類作成等)				準備工										
来月 予定	準備工				和合整備:伐採工・側溝蓋設置工				準備工(書類作成・現地調査・起工測量)				準備工、砂防土工、護床工・根固め工										
今月 作業																							
来月 予定																							

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21BP号(下) 19.00kp～18.45kp 防草対策工
工 期：平成31年04月01日～平成33年03月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp
R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

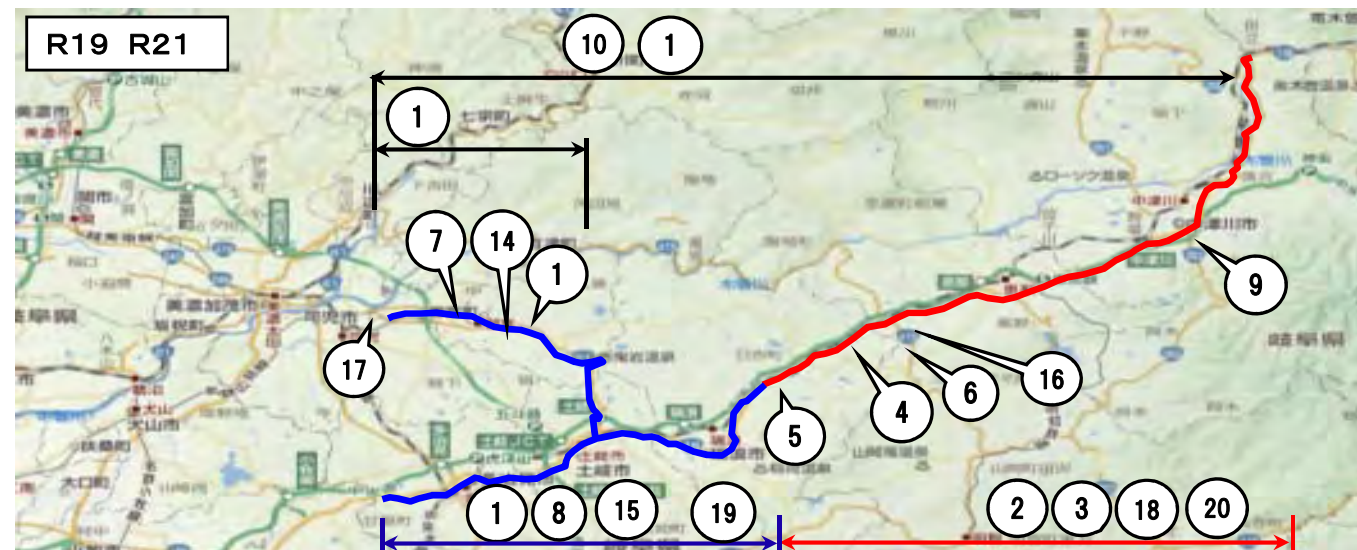

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



9号84.730kp(中) 防護柵復旧工(ロードセパレーター復旧工)
工 期：令和02年04月01日～令和04年09月30日
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp

③



駒場跨道橋 A1側 支承取替
工 期：平成31年03月09日～令和2年06月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：恵那市～中津川市

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

④



A2橋台 躯体施工中 道路土工 掘削
工 期：平成31年04月05日～令和2年07月22日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑤



P3橋脚 埋戻し、仮設工事用道路撤去
工 期：令和元年06月28日～令和03年02月26日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑥



滝沢川 護岸工・排水構造物工
工 期：令和元年06月28日～令和02年05月29日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市土岐町～恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区亜炭坑充填工事

⑦



充填孔設置工
工 期：令和元年07月27日～令和02年06月30日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑧



東町横断歩道橋(全工程完了)
工 期：令和元年08月07日～令和02年05月01日
施工業者：ウノインフラプランテック(株)
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

⑨



石・ブロック積(張)工(石張完了)
工 期：平成31年08月27日～令和元年07月31日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市中津川地先

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

⑩

準備工

準備工(機器製作)
工 期：令和元年11月25日～令和02年08月31日
施工業者：大藤電設(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号整備工事

⑪



準備工
工 期：令和2年01月10日～令和02年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区亜炭坑充填工事

⑫



準備工
工 期：令和2年03月10日～令和2年08月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事 ⑬  準備工 現地調査 工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日 施工業者：(株)梅田組 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内	令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事 ⑭  準備工 多治見1工区 工 期：令和02年03月23日～令和03年01月22日 施工業者：(株)吉川組 施工箇所：多治見市地内、土岐市地内	令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事 ⑮  準備工 工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日 施工業者：中部塗装(株) 施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内	令和元年度多治見国道21号中畑地区垂炭坑充填工事 ⑯ 準備工 工 期：令和2年04月07日～令和2年12月25日 施工業者：小池土木(株) 施工箇所：可児郡御嵩町地先	令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事 ⑰  準備工 工 期：令和02年04月13日～令和03年02月18日 施工業者：恵中建設(株) 施工箇所：瑞浪市～恵那市
令和元年度多治見国道中津川地区整備工事 ⑱  準備工 工 期：令和02 年04月20日～令和03年02月18日 施工業者：(株)吉川工務店 施工箇所：中津川市地内	令和元年度多治見管内改築舗装工事 ⑲ 準備工 工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日 施工業者：(株)NIPPO 施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内	令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事 ⑳ 準備工 工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日 施工業者：(株)吉川工務店 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先		
