


令和2年5月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (落合川流域)	進捗率	② (落合川流域)	進捗率
工事名: 令和元年度 木曾川水系 荒道工事用道路工事	予定 43.9%	工事名: 令和元年度 木曾川水系 中津川管内砂防堰堤補強工事	予定 28.0%
契約工期: 令和1年9月12日 ~ 令和2年6月30日 変更予定工期: 令和2年11月13日	実施 43.9%	契約工期: 令和2年2月14日 ~ 令和2年7月31日	実施 30.6%
請負業者名: (株)鳴海組	差 0.0%	請負業者名: (株)加藤工務店	差 2.6%
本谷第2砂防		日陰第1砂防	池の谷第1砂防
			
今月作業: 準備工、法面工		今月作業: 仮設工	今月作業: コンクリート堰堤工
来月予定: 法面工		来月予定: 仮設工、構造物撤去工、コンクリート堰堤工	来月予定: コンクリート堰堤工、仮設工
③ (落合川流域)	進捗率	④ (中津川出張所管内)	進捗率
工事名: 令和元年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事	予定 12.3%	工事名: 令和元年度 中津川出張所管内整備工事	予定 3.5%
契約工期: 令和2年4月1日 ~ 令和2年9月30日	実施 12.3%	契約工期: 令和2年3月28日 ~ 令和3年3月31日	実施 3.5%
請負業者名: (株)鳴海組	差 0.0%	請負業者名: (株)加藤工務店	差 0.0%
⑤ (落合川流域)	進捗率	⑥ (中津川流域)	進捗率
工事名: 令和元年度 木曾川水系 日陰第2砂防堰堤改築工事	予定 6.8%	工事名: 令和元年度 木曾川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事	予定 9.3%
契約工期: 令和2年4月7日 ~ 令和3年2月12日	実施 1.4%	契約工期: 令和2年4月10日 ~ 令和3年2月12日	実施 5.1%
請負業者名: (株)中島工務店	差 -5.4%	請負業者名: (株)加藤工務店	差 -4.2%
			
今月作業: 構造物撤去工、舗装工		今月作業: 横断幕掲示(土砂災害防止月間)、中津川第2崩落箇所整備	今月作業: 伐採工、仮設工
来月予定: 伐採工、L型擁壁工		来月予定: 中津川第2崩落箇所整備、除草作業(馬籠雨量観測所)、川上右岸道路工事	来月予定: 仮設工、構造物撤去工

令和2年5月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑦ (中津川流域)	進捗率		⑧	進捗率		⑨	進捗率		⑩	進捗率	
工事名: 令和2年度 木曾川水系 中津川第2護岸整備工事	予定	0.1%	工事名:	予定		工事名:	予定		工事名:	予定	
契約工期: 令和2年5月7日 ~ 令和3年2月19日	実施	0.1%	契約工期: ~	実施		契約工期: ~	実施		契約工期: ~	実施	
請負業者名: (株)加藤工務店	差	0.0%	請負業者名:	差		請負業者名:	差		請負業者名:	差	
											
今月作業: 準備工			今月作業:			今月作業:			今月作業:		
来月予定: 仮設工			来月予定:			来月予定:			来月予定:		
⑪	進捗率		⑫	進捗率		⑬	進捗率		⑭	進捗率	
工事名:	予定		工事名:	予定		工事名:	予定		工事名:	予定	
契約工期: ~	実施		契約工期: ~	実施		契約工期: ~	実施		契約工期: ~	実施	
請負業者名:	差		請負業者名:	差		請負業者名:	差		請負業者名:	差	
今月作業:			今月作業:			今月作業:			今月作業:		
来月予定:			来月予定:			来月予定:			来月予定:		

令和2年5月末 妻木出張所管内 工事進捗状況
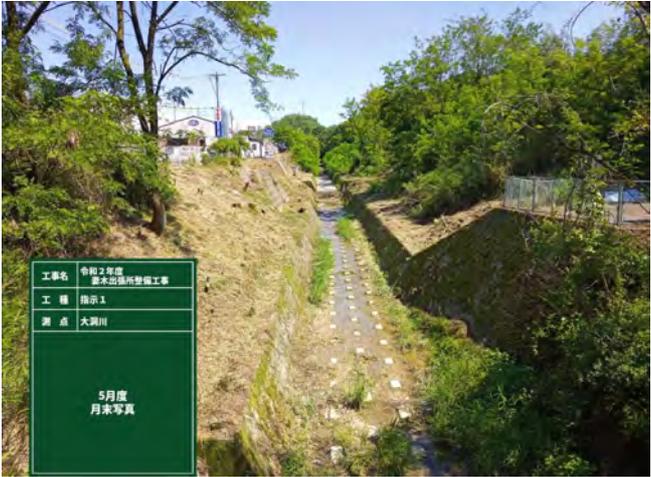
<p>①</p> <p>工事名： 令和元年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事</p> <p>工期： 令和2年3月27日 ~ 令和3年2月12日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 予定 7.0% 実施 11.2% 差 4.2%</p>	<p>②</p> <p>工事名： 令和元年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和2年3月31日 ~ 令和2年7月31日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 予定 6.0% 実施 7.1% 差 1.1%</p>
<p style="text-align: center;">堰堤部</p> 	<p style="text-align: center;">水道川地区</p> 
<p>《今月作業》 地盤改良工、コンクリート堰堤本体工</p> <p>《7月作業》 コンクリート堰堤本体工</p>	<p>《今月作業》 水道川工区：コンクリート堰堤工（腹付け部）、コンクリート表面処理（嵩上げ部） 碧山地区：準備工 起工測量</p> <p>《7月作業》 水道川工区：コンクリート堰堤工（嵩上げ部）、構造物撤去工（嵩上げ部、水通し部） 碧山地区：伐採工</p>
<p>③</p> <p>工事名： 令和2年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期： 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 予定 5.0% 実施 6.2% 差 1.2%</p>	<p>④</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事</p> <p>工期： 令和2年5月1日 ~ 令和3年2月19日</p> <p>施工業者： (株)吉川組</p> <p>進捗率： 予定 7.0% 実施 11.2% 差 0.0%</p>
 <div data-bbox="140 1765 306 1982" style="background-color: #006400; color: white; padding: 5px;"> <p>工事名 令和2年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工種 指示1</p> <p>河点 大淵川</p> <p>5月度 月末写真</p> </div>	
<p>《今月作業》 指示2 寺下護岸</p> <p>《7月作業》 指示3 追沢川伐採</p>	<p>《今月作業》 準備工（立木伐採）砂防土工（作業土工）</p> <p>《7月作業》 護床工・根固め工（根固めブロック製作）</p>

令和2年5月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 令和元年度 木曾川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 72.1 R1. 8.27~R3.2.15	② 令和元年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 38.2 R1. 8.27~R2.6.19	③ 令和元年度 木曾川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % 100.0 R1. 8.27~R2.5.29	④ 令和元年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株) 進捗率(予定工程) % 13.9 R1. 9.12~R2.6.19 週休2日
				
今月作業	コンクリート堰堤工(型枠組立・コンクリート打設) 鋼製堰堤工(足場組立・スリット架設)	カルバート工 ブロック積工	5月29日完成検査。	仮設工
来月予定	コンクリート堰堤工(型枠組立・コンクリート打設) 鋼製堰堤工(足場解体)	床固本體工 ブロック積工	—	仮設工・橋台工
	⑤ 令和元年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土工業(株) 進捗率(予定工程) % 32.0 R2. 3. 2~R2.9.30 ICT	⑥ 令和元年度 木曾川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株) 進捗率(予定工程) % 8.2 R2. 3. 2~R2.9.30 ICT・週休2日	⑦ 令和元年度 木曾川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % 9.3 R2. 3. 2~R2.9.30 週休2日	⑧ 令和元年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組 進捗率(予定工程) % 7.0 R2. 3. 16~R2.9.30 ICT
				
今月作業	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)	・砂防土工 掘削 ・法面工 足場・鉄筋挿入工 ・伐採工 伐採木等収集・搬出	コンクリート堰堤本體工	準備工(伐採)・道路土工・カルバート工
来月予定	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)	・砂防土工 掘削 ・法面工 足場・鉄筋挿入工	コンクリート堰堤本體工	道路土工・舗装工・カルバート工


令和2年 5月末 上松出張所 工事進捗状況

	令和元年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曾土建工業(株)			令和元年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			令和2年度 木曾川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)		
	⑨	進捗率(予定工程)	%	⑩	進捗率(予定工程)	%	⑪	進捗率(予定工程)	%	⑫	進捗率(予定工程)	%
		R2. 3.31~R3.2.12	0.2		R2. 4. 1~R3.3.31	14.6		R2. 4. 17~R3.2.12	0.1		R2. 4. 22~R3.2.12	3.2
												
今月作業	準備工			桜洞:伐採工、和合:伐採工			準備工(書類作成・現地調査・起工測量)			準備工、砂防土工、護床工・根固め工		
来月予定	伐採工、仮設工(工事用道路工)			板橋沢:舗装工、滑川:土砂搬出			準備工(現地調査・伐採準備) 仮設備			護床工・根固め工(根固めブロック製作)		
今月作業												
来月予定												

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事



①
19号(上) 51.8kp~51.7kp 防草対策工
工 期：平成31年04月01日~平成33年03月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

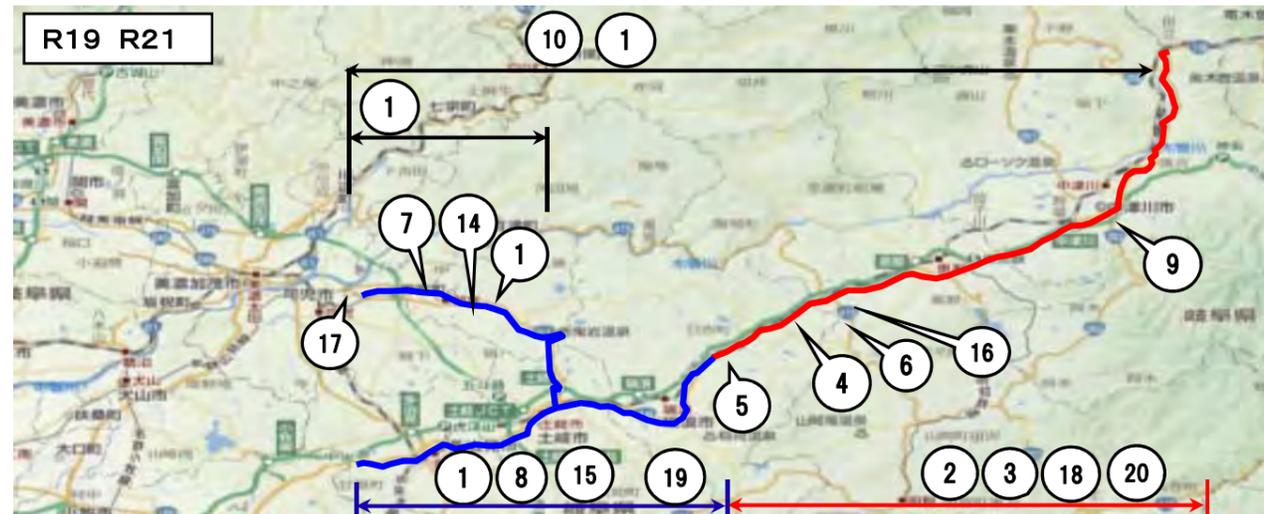

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事



②
19号81.800kp(下) 緑地管理工(道路除草)
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度多治見国道橋梁補修工事



③
駒場跨道橋 支承取替
工 期：平成31年03月09日~令和2年06月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：恵那市~中津川市

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事



④
A2橋台 躯体施工中 道路土工 掘削
工 期：平成31年04月05日~令和2年07月22日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事



⑤
A1橋台完了 P3橋脚 躯体工
工 期：令和元年06月28日~令和3年02月26日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事



⑥
滝沢川 護岸工・排水構造物工
工 期：令和元年06月28日~令和2年07月15日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市土岐町~恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区亜炭坑充填工事



⑦
充填孔設置工・充填工
工 期：令和元年07月27日~令和2年06月30日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事



⑧
東町横断歩道橋(全工程完了)
工 期：令和元年08月07日~令和2年05月01日
施工業者：ウノインフラプランテック(株) **完**
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事



⑨
石・ブロック積工(完了)・仮設工撤去(完了)
工 期：平成31年08月27日~令和元年07月31日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市中津川地先

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

⑩
準備工

準備工(機器製作)
工 期：令和元年11月25日~令和2年08月31日
施工業者：大藤電設(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号整備工事



⑪
準備工
工 期：令和2年01月10日~令和2年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区亜炭坑充填工事



⑫
充填孔、充填到達観測孔設置工・交通管理工
工 期：令和2年03月10日~令和2年08月31日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事

⑬



仮設工 足場設置

工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事

⑭



準備工 多治見1工区

工 期：令和02年03月23日～令和03年01月22日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：多治見市地内、土岐市地内

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事

⑮



準備工

工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日
施工業者：中部塗装(株)
施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内

令和元年度多治見国道21号中畑地区垂炭坑充填工事

⑯

準備工

準備工

工 期：令和2年04月07日～令和2年12月25日
施工業者：小池土木(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事

⑰



準備工

工 期：令和02年04月13日～令和03年02月18日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：瑞浪市～恵那市

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事

⑱



準備工

工 期：令和02年04月20日～令和03年02月18日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市地内

令和元年度多治見管内改築舗装工事

⑲



準備工

工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日
施工業者：(株)NIPPO
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

⑳



準備工

工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

㉑

6/1契約
フレックス工期

工 期：令和02年07月01日～令和03年02月26日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市～中津川市地先
