

## 令和2年6月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (落合川流域)	進捗率	② (落合川流域)	進捗率
工事名：令和元年度 木曾川水系 荒道工事用道路工事 契約工期：令和1年9月12日 ~ 令和2年11月30日 請負業者名：(株)鳴海組	予定 実施 47.9% 差	工事名：令和元年度 木曾川水系 中津川管内砂防堰堤補強工事 契約工期：令和2年2月14日 ~ 令和2年7月31日 変更予定工期：令和2年2月14日 ~ 令和2年9月30日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 実施 43.6% 差
本谷第2砂防		日陰第1砂防	
今月作業：法面工 来月予定：法面工	今月作業：仮設工、構造物撤去工、コンクリート堰堤工 来月予定：コンクリート堰堤工	今月作業：構造物撤去工、コンクリート堰堤工 来月予定：コンクリート堰堤工、仮設工	今月作業：コンクリート堰堤工、仮設工 来月予定：コンクリート堰堤工、仮設工
③ (落合川流域)	進捗率	④ (中津川出張所管内)	進捗率
工事名：令和元年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年4月1日 ~ 令和2年10月21日 請負業者名：(株)鳴海組	予定 実施 16.7% 差	工事名：令和元年度 中津川出張所管内整備工事 契約工期：令和2年3月28日 ~ 令和3年3月31日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 実施 5.5% 差
⑤ (落合川流域)	進捗率	⑥ (中津川流域)	進捗率
工事名：令和元年度 木曾川水系 日陰第2砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年4月7日 ~ 令和3年2月12日 請負業者名：(株)中島工務店	予定 実施 10.2% 差	工事名：令和元年度 木曾川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年4月10日 ~ 令和3年2月12日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 実施 25.1% 差
今月作業：伐採工、L型擁壁工 来月予定：災害復旧、L型擁壁工	今月作業：中津川第2崩落箇所整備、除草作業(馬籠雨量観測所)、中津川護岸洗堀箇所補修 来月予定：中津川第2崩落箇所整備、川上右岸道路工事、アラクラ工事用道路補修	今月作業：伐採工 来月予定：伐採工、仮設工	今月作業：仮設工、構造物撤去工 来月予定：仮設工、構造物撤去工

## 令和2年6月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑦ (中津川流域)	進捗率		⑧	進捗率		⑨	進捗率		⑩	進捗率	
工事名：令和2年度 木曾川水系 中津川第2護岸整備工事	予定		工事名：	予定		工事名：	予定		工事名：	予定	
契約工期： 令和2年5月7日 ~ 令和3年2月19日	実施	1.5%	契約工期： ~	実施		契約工期： ~	実施		契約工期： ~	実施	
請負業者名： (株)加藤工務店	差		請負業者名：	差		請負業者名：	差		請負業者名：	差	
											
今月作業： 仮設工、伐採工			今月作業：			今月作業：			今月作業：		
来月予定： 仮設工			来月予定：			来月予定：			来月予定：		
⑪	進捗率		⑫	進捗率		⑬	進捗率		⑭	進捗率	
工事名：	予定		工事名：	予定		工事名：	予定		工事名：	予定	
契約工期： ~	実施		契約工期： ~	実施		契約工期： ~	実施		契約工期： ~	実施	
請負業者名：	差		請負業者名：	差		請負業者名：	差		請負業者名：	差	
今月作業：			今月作業：			今月作業：			今月作業：		
来月予定：			来月予定：			来月予定：			来月予定：		

## 令和2年6月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名： 令和元年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事</p> <p>工期： 令和2年3月27日 ~ 令和3年2月12日</p> <p>施工業者：(株)藤本組</p> <p>進捗率： <span style="float: right;">実施 23.8%</span></p>	<p>②</p> <p>工事名： 令和元年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和2年3月31日 ~ 令和2年7月31日</p> <p>施工業者：(株)藤本組</p> <p>進捗率： <span style="float: right;">実施 12.4</span></p>
堰堤部	水道川地区
	
《今月作業》コンクリート堰堤本土工	《今月作業》水道川工区:コンクリート堰堤工(嵩上げ部)、構造物撤去工(水通し部) 碧山地区 :伐木除根工
《8月作業》コンクリート堰堤本土工	《8月作業》水道川工区:コンクリート堰堤工(嵩上げ部) 碧山地区 :伐木除根工
<p>③</p> <p>工事名： 令和2年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期： 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日</p> <p>施工業者：(株)藤本組</p> <p>進捗率： <span style="float: right;">実施 9.9%</span></p>	<p>④</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事</p> <p>工期： 令和2年5月1日 ~ 令和3年2月19日</p> <p>施工業者：(株)吉川組</p> <p>進捗率： <span style="float: right;">実施 4.6%</span></p>
	
《今月作業》指示3 追沢川伐採	《今月作業》砂防土工(掘削・残土処理)、護床工・根固め工(根固めブロック製作)
《8月作業》指示3 追沢川伐採	《8月作業》護床工・根固め工(根固めブロック製作・設置)

## 令和2年 6月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 令和元年度 木曾川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 79.0 R1. 8.27~R3.2.15	② 令和元年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 44.2 R1. 8.27~R2.10.30	③ 令和元年度 木曾川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % 100.0 R1. 8.27~R2.5.29	④ 令和元年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株) 進捗率(予定工程) % 27.2 R1. 9.12~R3.3.30 週休2日
				
今月作業	コンクリート堰堤工(型枠組立・コンクリート打設) 鋼製堰堤工(足場解体)	護岸流路工(ブロック積工) 垂直壁工	-	仮設工、橋台工
来月予定	コンクリート堰堤工	護岸流路工(ブロック積工) 垂直壁工 仮設工	-	仮設工、橋台工
	⑤ 令和元年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土工建業(株) 進捗率(予定工程) % 43.1 R2. 3. 2~R2.9.30 ICT	⑥ 令和元年度 木曾川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株) 進捗率(予定工程) % 15.8 R2. 3. 2~R2.10.14 ICT・週休2日	⑦ 令和元年度 木曾川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % 25.8 R2. 3. 2~R2.12.21 週休2日	⑧ 令和元年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組 進捗率(予定工程) % 22.8 R2. 3. 16~R2.9.30 ICT
				
今月作業	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)	砂防土工 掘削工 法面工 鉄筋挿入工・足場設置撤去 共通仮設 伐採工	コンクリート堰堤本體工	道路土工・舗装工・カルバート工
来月予定	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)	砂防土工 掘削工 法面工 鉄筋挿入工・足場設置撤去	コンクリート堰堤本體工	カルバート工


## 令和2年 6月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨ 令和元年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑩ 令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曾土建工業(株)			⑪ 令和元年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			⑫ 令和2年度 木曾川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)		
	進捗率(予定工程)	%	4.0	進捗率(予定工程)	%	49.6	進捗率(予定工程)	%	0.2	進捗率(予定工程)	%	17.8
	R2. 3.31~R3.2.12 週休2日			R2. 4. 1~R3.3.31			R2. 4. 17~R3.2.12 週休2日			R2. 4. 22~R3.2.12 週休2日		
												
今月作業	伐採工、仮設工(工事用道路)			板橋:舗装工 他			準備工(現地調査) 仮設備			6月 護床工・根固め工(根固めブロック製作)		
来月予定	伐採工、仮設工(工事用道路)			滑川:渡河工復旧 他			準備工(伐採工)			7月 護床工・根固め工(根固めブロック製作)		
今月作業												
来月予定												

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事



① 19号(上) 40.8kp~40.5kp 道路除草  
 工 期：平成31年04月01日~平成33年03月31日  
 施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)  
 施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp  
 R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

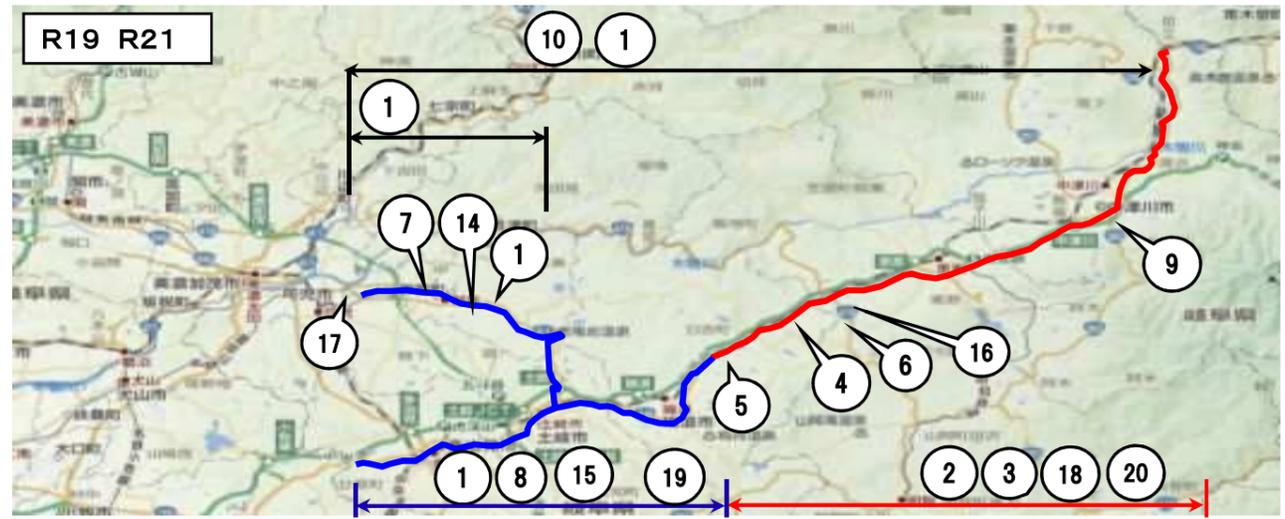


令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事



② 19号63.000kp(下) 緑地管理工(防草シート)  
 施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス  
 施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

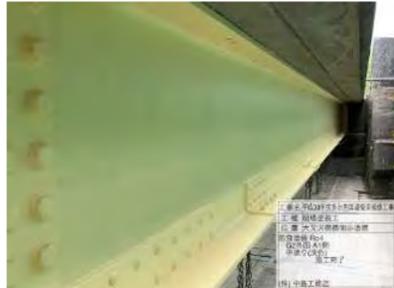

③ 山口1工区 現場塗装工  
 工 期：平成31年03月09日~令和2年08月31日  
 施工業者：(株)中島工務店  
 施工箇所：恵那市~中津川市

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事



④ 函渠工 躯体完了 道路土工 掘削  
 工 期：平成31年04月05日~令和2年07月22日  
 施工業者：(株)中島工務店  
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事



⑤ P3橋脚 躯体工  
 工 期：令和元年06月28日~令和03年02月26日  
 施工業者：(株)加藤工務店  
 施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事



⑥ 滝沢川 擁壁工・上部工  
 工 期：令和元年06月28日~令和02年11月27日  
 施工業者：セントラル建設(株)  
 施工箇所：瑞浪市土岐町~恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区垂炭坑充填工事



⑦ 充填工, 確認工  
 工 期：令和元年07月27日~令和02年07月22日  
 施工業者：飛鳥建設(株)  
 施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事



⑧ 東町横断歩道橋(全工程完了)  
 工 期：令和元年08月07日~令和02年05月01日  
 施工業者：ウノインフラプランテック(株) **完**  
 施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事



⑨ 完了  
 工 期：平成31年08月27日~令和元年07月31日  
 施工業者：(株)吉川工務店  
 施工箇所：中津川市中津川地先

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事



⑩ 機器製作、CCTV設備更新  
 工 期：令和元年11月25日~令和02年09月30日  
 施工業者：大藤電設(株)  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号整備工事



⑪ 可児工区(1) 舗装工 区画線工  
 工 期：令和2年01月10日~令和02年11月30日  
 施工業者：(株)中島工務店  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区垂炭坑充填工事



⑫ 充填孔、充填到達観測孔設置工・交通管理工  
 工 期：令和2年03月10日~令和2年08月31日  
 施工業者：徳倉建設(株)  
 施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事

⑬



恵那大橋 橋梁補修工 鋼桁工

工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日  
施工業者：(株)梅田組  
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事

⑭



準備工 多治見1工区

工 期：令和02年03月23日～令和03年01月22日  
施工業者：(株)吉川組  
施工箇所：多治見市地内、土岐市地内

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事

⑮



準備工

工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日  
施工業者：中部塗装(株)  
施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内

令和元年度多治見国道21号中畑地区亜炭坑充填工事

⑯



準備工・中工区削孔作業(7月下旬)

工 期：令和2年04月07日～令和2年12月25日  
施工業者：小池土木(株)  
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事

⑰



準備工、構造物撤去工

工 期：令和02年04月13日～令和03年02月18日  
施工業者：恵中建設(株)  
施工箇所：瑞浪市～恵那市

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事

⑱



準備工(試掘)

工 期：令和02年04月20日～令和03年02月18日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：中津川市地内

令和元年度多治見管内改築舗装工事

⑲



準備工

工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日  
施工業者：(株)NIPPO  
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

⑳



準備工

工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

㉑

準備工

準備工  
工 期：令和02年07月01日～令和03年02月26日  
施工業者：セントラル建設(株)  
施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

