

令和2年7月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (落合川流域)	進捗率	② (落合川流域)	進捗率				
工事名：令和元年度 木曾川水系 荒道工事用道路工事 契約工期：令和1年9月12日 ~ 令和2年11月30日 請負業者名：(株)鳴海組	予定 実施 60.9% 差	工事名：令和元年度 木曾川水系 中津川管内砂防堰堤補強工事 契約工期：令和2年2月14日 ~ 令和2年9月30日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 実施 69.2% 差				
							
今月作業：法面工 来月予定：法面工、補強土壁工	今月作業：コンクリート堰堤工 来月予定：コンクリート堰堤工	今月作業：コンクリート堰堤工、仮設工 来月予定：コンクリート堰堤工、仮設工	今月作業：コンクリート堰堤工、仮設工 来月予定：コンクリート堰堤工				
③ (落合川流域)	進捗率	④ (中津川出張所管内)	進捗率	⑤ (落合川流域)	進捗率	⑥ (中津川流域)	進捗率
工事名：令和元年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年4月1日 ~ 令和2年10月21日 変更予定工期：令和2年4月1日 ~ 令和3年3月30日 請負業者名：(株)鳴海組	予定 実施 20.1% 差	工事名：令和元年度 中津川出張所管内整備工事 契約工期：令和2年3月28日 ~ 令和3年3月31日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 実施 15.7% 差	工事名：令和元年度 木曾川水系 日陰第2砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年4月7日 ~ 令和3年2月12日 請負業者名：(株)中島工務店	予定 実施 12.5% 差	工事名：令和元年度 木曾川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年4月10日 ~ 令和3年2月12日 変更予定工期：令和2年4月10日 ~ 令和3年3月15日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 実施 35.8% 差
							
今月作業：災害復旧、擁壁工(L型擁壁) 来月予定：擁壁工(L型擁壁)	今月作業：中津川第2崩落箇所整備、川上右岸道路工事、アラクラ工事用道路補修 来月予定：川上右岸道路工事	今月作業：伐採工、仮設工 来月予定：仮設工	今月作業：仮設工、構造物撤去工 来月予定：構造物撤去工、残土処理工				

令和2年7月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑦ (中津川流域)	進捗率	⑧ (落合川流域)	進捗率	⑨	進捗率	⑩	進捗率
工事名：令和2年度 木曾川水系 中津川第2護岸整備工事 契約工期： 令和2年5月7日 ~ 令和3年2月19日 変更予定工期： 令和3年3月30日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 実施 7.0% 差	工事名：令和2年度 薬師沢砂防堰堤工事 契約工期： 令和2年7月16日 ~ 令和3年2月26日 請負業者名：(株)吉川工務店	予定 実施 2.5% 差	工事名：令和2年度 川上流路工 契約工期： ~ 請負業者名：中島工務店	予定 実施 差	工事名： 契約工期： ~ 請負業者名：	予定 実施 差
		<h1 style="font-size: 2em;">準備工</h1>					
今月作業：仮設工、流路護岸工		今月作業：準備工		今月作業：		今月作業：	
来月予定：仮設工、流路護岸工		来月予定：仮設工、構造物撤去工		来月予定：		来月予定：	
イベント関係 ・ 9/29 恵那神社 例大祭(関係者のみに変更) ・ 9/11(予定) 山口小 4年生 防災強教育(本沢第1砂防堰堤)							

令和2年7月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名： 令和元年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事</p> <p>工期： 令和2年3月27日 ~ 令和3年2月12日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 37.6%</p>	<p>②</p> <p>工事名： 令和元年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和2年3月31日 ~ 令和3年2月26日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 30.6%</p>
<p>堰堤部</p> 	<p>砦山地区</p>  <p>水道川地区</p> 
<p>《今月作業》 コンクリート堰堤本体工</p> <p>《9月作業》 コンクリート堰堤本体工、構造物取壊し工</p>	<p>《今月作業》 【砦山地区】伐採工 【水道川地区】コンクリート堰堤工、構造物撤去工</p> <p>《9月作業》 【砦山地区】伐採工、砂防土工、コンクリート堰堤工(作業土工) 【水道川地区】コンクリート堰堤工、砂防土工(盛土)</p>
<p>③</p> <p>工事名： 令和2年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期： 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 19.4%</p>	<p>④</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事</p> <p>工期： 令和2年5月1日 ~ 令和3年2月19日</p> <p>施工業者： (株)吉川組</p> <p>進捗率： 実施 12.1%</p>
<p>追沢第4砂防堰堤 堆砂敷伐採</p>  <p>工事名 令和2年度 妻木出張所整備工事 工種 除染3 測点 7月底 月末写真</p>	 <p>工事名 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事 工種 工程管理 測点 7月底 7月底出来高</p>
<p>《今月作業》 追沢第4砂防堰堤堆砂敷伐採、井戸洞布製型枠設置、砦山第7砂防堰堤補修</p> <p>《9月作業》 砦山第7砂防堰堤補修 市の倉砂防堰堤水路修繕</p>	<p>《今月作業》 根固めブロック製作・設置</p> <p>《9月作業》 根固めブロック製作・設置</p>

令和2年7月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 令和元年度 木曾川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 79.7 R1. 8.27~R3.2.15	② 令和元年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 46.5 R1. 8.27~R2.10.30	③ 令和元年度 木曾川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % 100.0 R1. 8.27~R2.5.29	④ 令和元年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株) 進捗率(予定工程) % 35.8 R1. 9.12~R3.3.30 週休2日
				
今月作業	コンクリート堰堤工	垂直壁工 ブロック積工	-	橋台工、仮設工
来月予定	コンクリート堰堤工	床固本体工 仮設工(仮排水工)	-	橋台工
	⑤ 令和元年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株) 進捗率(予定工程) % 69.3 R2. 3. 2~R2.9.30 ICT	⑥ 令和元年度 木曾川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株) 進捗率(予定工程) % 28.5 R2. 3. 2~R2.10.14 ICT・週休2日	⑦ 令和元年度 木曾川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % 44.1 R2. 3. 2~R2.12.21 週休2日	⑧ 令和元年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組 進捗率(予定工程) % 30.0 R2. 3. 16~R2.9.30 ICT
				
今月作業	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)	砂防土工 掘削 法面工 鉄筋挿入工	コンクリート堰堤本体工	カルバート工
来月予定	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)	砂防土工 掘削 法面工 鉄筋挿入工 コンクリート堰堤工 作業土工	コンクリート堰堤本体工	カルバート工・流路工

令和2年 7月末 上松出張所 工事進捗状況


	令和元年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)		令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曾土工建工業(株)		令和元年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)		令和2年度 木曾川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)	
	⑨ 進捗率(予定工程)	%	⑩ 進捗率(予定工程)	%	⑪ 進捗率(予定工程)	%	⑫ 進捗率(予定工程)	
	R2. 3.31~R3.2.12	8.1	R2. 4. 1~R3.3.31	64.9	R2. 4. 17~R3.2.12	1.1	R2. 4. 22~R3.2.12	35.6
	週休2日			週休2日			週休2日	
								
今月作業	伐採工、仮設工		下在:舗装工 板橋:応急復旧		準備工(伐採工)		護床工・根固め工(根固めブロック製作)	
来月予定	伐採工、仮設工		板橋:応急復旧 滑川:管理道路整備 他		伐採工・仮設工		護床工・根固め工(根固めブロック製作) (8月8日~8月16日まで夏期休暇)	
今月作業								
来月予定								

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21号(下) 3.4kp~3.5kp 道路除草
 工 期：平成31年04月01日~平成33年03月31日
 施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
 施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
 R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

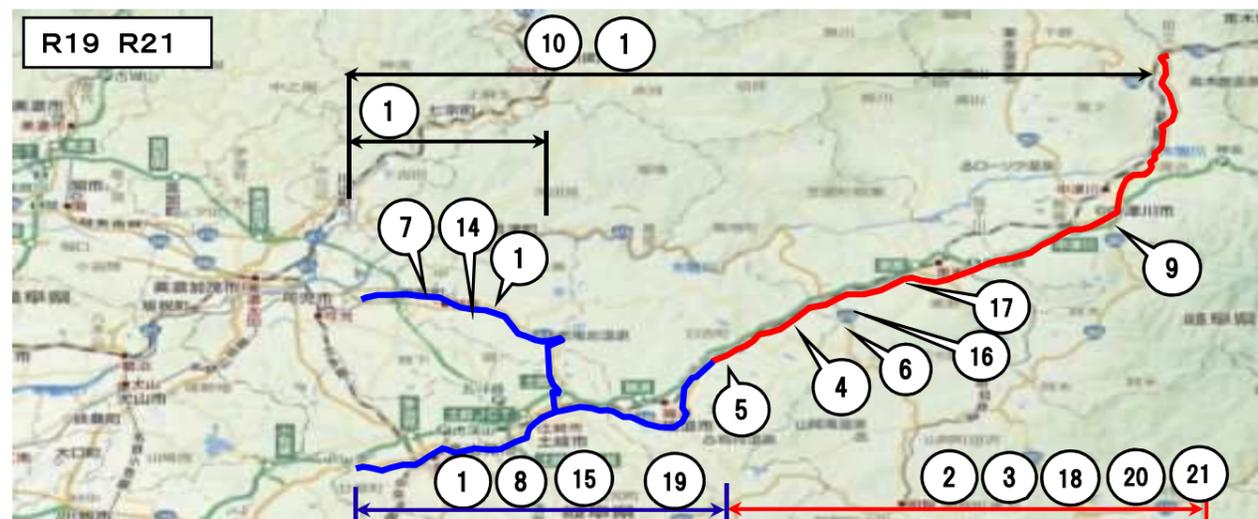

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号84.300kp(下) 緑地管理工(道路除草)
 施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
 施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

③



恵那工区 現場塗装工
 工 期：平成31年03月09日~令和2年08月31日
 施工業者：(株)中島工務店
 施工箇所：恵那市~中津川市

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

④



道路土工 掘削、土砂運搬
 工 期：平成31年04月05日~令和2年11月20日
 施工業者：(株)中島工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑤



P3橋脚 躯体工
 工 期：令和元年06月28日~令和3年02月26日
 施工業者：(株)加藤工務店
 施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑥



滝沢川 擁壁工・上部工
 工 期：令和元年06月28日~令和2年11月27日
 施工業者：セントラル建設(株)
 施工箇所：瑞浪市土岐町~恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区垂炭坑充填工事

⑦



充填工, 確認工
 工 期：令和元年07月27日~令和2年07月22日
 施工業者：飛鳥建設(株)
 施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内 **完**

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑧



東町横断歩道橋(全工程完了)
 工 期：令和元年08月07日~令和2年05月01日
 施工業者：ウノインフラプランテック(株) **完**
 施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

⑨



完了
 工 期：平成31年08月27日~令和元年07月31日
 施工業者：(株)吉川工務店 **完**
 施工箇所：中津川市中津川地先

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

⑩



CCTV設備更新
 工 期：令和元年11月25日~令和2年09月30日
 施工業者：大藤電設(株)
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内
 95.6%

令和元年度多治見国道21号整備工事

⑪



可児工区(2) 舗装工 区画線工
 工 期：令和2年01月10日~令和2年11月30日
 施工業者：(株)中島工務店
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区垂炭坑充填工事

⑫



充填到達観測孔設置工・交通管理工、観測工
 工 期：令和2年03月10日~令和2年08月31日
 施工業者：徳倉建設(株)
 施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事

⑬



大洞橋 橋梁補修工 鋼桁工 橋梁支承工
 工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日
 施工業者：(株)梅田組
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事

⑭



舗装工 多治見2工区(下り線)
 工 期：令和02年03月23日～令和03年01月22日
 施工業者：(株)吉川組
 施工箇所：多治見市地内、土岐市地内

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事

⑮



恵那工区 舟山横断歩道橋塗装工
 工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日
 施工業者：中部塗装(株)
 施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内

令和元年度多治見国道21号中畑地区亜炭坑充填工事

⑯



準備工・中工区削孔作業(8月下旬)
 工 期：令和2年04月07日～令和2年12月25日
 施工業者：小池土木(株)
 施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事

⑰



準備工
 工 期：令和02年04月13日～令和03年02月18日
 施工業者：恵中建設(株)
 施工箇所：瑞浪市～恵那市

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事

⑱



準備工(伐採)
 工 期：令和02年04月20日～令和03年02月18日
 施工業者：(株)吉川工務店
 施工箇所：中津川市地内

令和元年度多治見管内改築舗装工事

⑲



区画線工
 工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日
 施工業者：(株)NIPPO
 施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

⑳



工事用道路、中層混合処理工、排水構造物工
 工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日
 施工業者：(株)吉川工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

㉑

準備工

準備工
 工 期：令和02年07月01日～令和03年02月26日
 施工業者：セントラル建設(株)
 施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

Blank box for project information.

Blank box for project information.
