




## 令和2年8月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑦ (中津川流域)	進捗率	⑧ (落合川流域)	進捗率	⑨ (中津川流域)	進捗率	⑩	進捗率
工事名：令和2年度 木曾川水系 中津川第2護岸整備工事 契約工期： 令和2年5月7日 ~ 令和3年3月30日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 実施 14.0% 差	工事名：令和2年度 薬師沢砂防堰堤工事 契約工期： 令和2年7月16日 ~ 令和3年2月26日 請負業者名：(株)吉川工務店	予定 実施 7.2% 差	工事名：令和2年度 川上流路工宮前橋工事 契約工期： 令和2年8月18日 ~ 令和3年2月26日 請負業者名：(株)中島工務店	予定 実施 0.5% 差	工事名： 契約工期： ~ 請負業者名：	予定 実施 差
							
今月作業：仮設工、流路護岸工 来月予定：流路護岸工		今月作業：仮設工、コンクリート堰堤工(作業土工) 来月予定：仮設工、コンクリート堰堤工(作業土工)		今月作業：準備工 来月予定：準備工、仮設工		今月作業： 来月予定：	
<b>イベント関係</b> ・9/11 山口小 4年生 防災強教育(本沢第2砂防堰堤) ・9/29 恵那神社 例大祭(関係者のみに縮小) ・10/5 八幡神社 例大祭(関係者のみに縮小)		⑫ 工事名： 契約工期： ~ 請負業者名：	進捗率 予定 実施 差	⑬ 工事名： 契約工期： ~ 請負業者名：	進捗率 予定 実施 差	⑭ 工事名： 契約工期： ~ 請負業者名：	進捗率 予定 実施 差
							
今月作業： 来月予定：		今月作業： 来月予定：		今月作業： 来月予定：		今月作業： 来月予定：	





# 令和2年8月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名: 令和元年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事</p> <p>工期: 令和2年3月27日 ~ 令和3年2月12日</p> <p>施工業者: (株)藤本組</p> <p>進捗率: 実施 51.0%</p>	<p>②</p> <p>工事名: 令和元年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期: 令和2年3月31日 ~ 令和3年2月26日</p> <p>施工業者: (株)藤本組</p> <p>進捗率: 実施 44.2%</p>
<p>堰堤部</p> 	<p>砦山地区</p>  <p>水道川地区</p> 
<p>《今月作業》コンクリート堰堤本体工、構造物取壊し工</p> <p>《10月作業》作業土工、構造物取壊し工、垂直壁工</p>	<p>《今月作業》【砦山地区】伐採工、砂防土工、コンクリート堰堤工(作業土工) 【水道川地区】コンクリート堰堤工、砂防土工(盛土)、仮設工</p> <p>《10月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工(作業土工、コンクリート堰堤本体工) 【水道川地区】砂防土工(盛土)、仮設工</p>
<p>③</p> <p>工事名: 令和2年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期: 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日</p> <p>施工業者: (株)藤本組</p> <p>進捗率: 実施 38.7%</p>	<p>④</p> <p>工事名: 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事</p> <p>工期: 令和2年5月1日 ~ 令和3年2月19日</p> <p>施工業者: (株)吉川組</p> <p>進捗率: 実施 27.8%</p>
<p>井戸洞護岸整備</p>  <p>砦山第7砂防堰堤修繕</p> 	<p>根固めブロック製作</p> 
<p>《今月作業》砦山第7砂防堰堤補修 オリベ堰堤水路補修 堀切流路工整備</p> <p>《10月作業》オリベ堰堤水路補修</p>	<p>《今月作業》根固めブロック製作・設置 砂防土工 土砂掘削・残土処理</p> <p>《10月作業》根固めブロック製作・設置</p>

## 令和2年 8月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 令和元年度 木曾川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)		② 令和元年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)		③ 令和元年度 木曾川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)		④ 令和元年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	R1. 8.27~R3.2.15	80.4	R1. 8.27~R2.10.30	58.9	R1. 8.27~R2.5.29	100.0	R1. 9.12~R3.3.30	41.1
						完成		週休2日
今月作業	コンクリート堰堤工		流路工(ブロック積み・底張りコンクリート) 床固工(作業土工床掘、残土処理工)		-		橋台工(A1橋台、A2橋台)	
来月予定	コンクリート堰堤工		床固工(3号床固本体工)		-		橋台工(A1橋台、A2橋台)	
	⑤ 令和元年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)		⑥ 令和元年度 木曾川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株)		⑦ 令和元年度 木曾川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)		⑧ 令和元年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	R2. 3. 2~R2.9.30	93.2	R2. 3. 2~R2.10.14	34.3	R2. 3. 2~R2.12.21	47.4	R2. 3. 16~R2.9.30	71.9
		ICT		ICT・週休2日		週休2日		ICT
今月作業	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)		掘削工 右岸法面掘削3段目 法面工 鉄筋挿入工 コンクリート堰堤工 第一副提掘削		コンクリート堰堤本体工		カルバート工・流路工	
来月予定	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬) 後片付け		掘削工 右岸法面掘削4段目 法面工 鉄筋挿入工 コンクリート堰堤工 第二副提掘削 第一副堰堤型枠組立・コンクリート打設		コンクリート堰堤本体工・コンクリート側壁工・水叩工・作業土工		カルバート工・流路工・擁壁工	

## 令和2年 8月末 上松出張所 工事進捗状況

	令和元年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曾土建工業(株)			令和元年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			令和2年度 木曾川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)						
	⑨	進捗率(予定工程)	%	14.7	⑩	進捗率(予定工程)	%	71.1	⑪	進捗率(予定工程)	%	3.4	⑫	進捗率(予定工程)	%	51.0
		R2. 3.31~R3.2.12		週休2日		R2. 4. 1~R3.3.31				R2. 4. 17~R3.2.12		週休2日		R2. 4. 22~R3.2.12		週休2日
																
今月作業	伐採工、仮設工			板橋:道路下法面復旧			伐採工・仮設工			護床工・根固め工(根固めブロック製作)						
来月予定	仮設工、構造物撤去工			越百川:進入路整備			伐採工・仮設工			護床工・根固め工(根固めブロック製作)						
	令和2年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)															
⑬	進捗率(予定工程)	%	0.0													
	R2. 9. 28~R3.2.26															
	写真無し															
今月作業	-															
来月予定	-															


平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(下) 54.4kp~54.7kp 道路除草  
工 期：平成31年04月01日~令和2年10月30日  
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)  
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp  
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

工 期：平成31年04月01日~平成33年03月31日

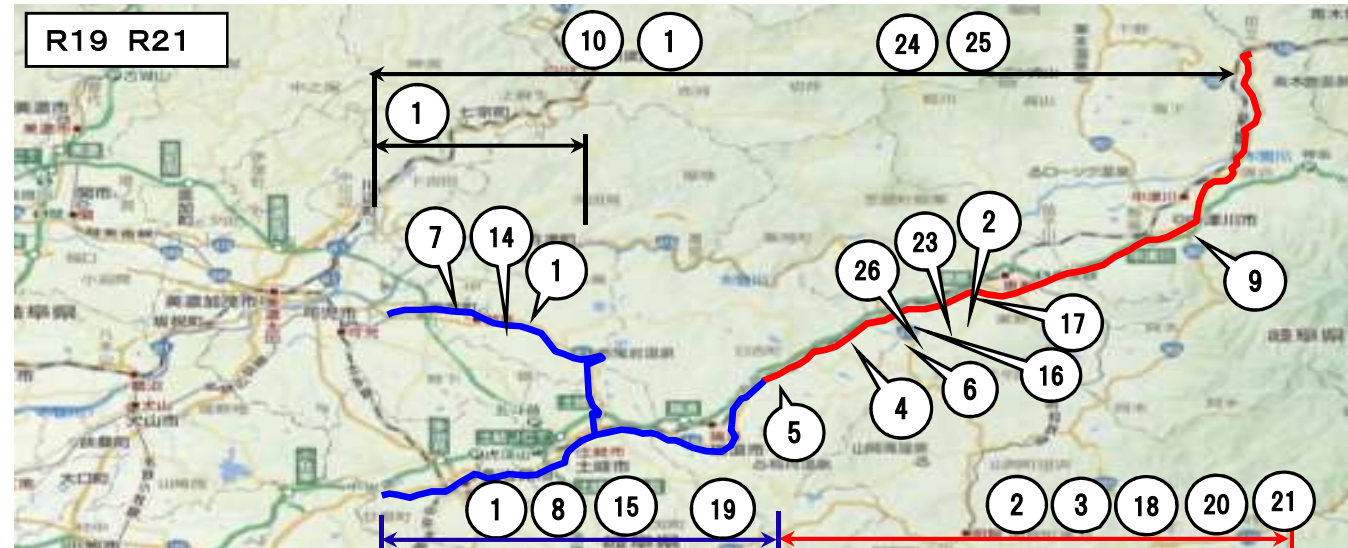

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号77.300kp(下) 構造物補修工(側溝設置)  
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス  
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

③



駒場跨道橋(完成)  
工 期：平成31年03月09日~令和2年08月31日  
施工業者：(株)中島工務店  
施工箇所：恵那市~中津川市

完

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

④



道路土工 掘削、土砂運搬  
工 期：平成31年04月05日~令和2年11月20日  
施工業者：(株)中島工務店  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑤



P3橋脚 躯体工  
工 期：令和元年06月28日~令和03年02月26日  
施工業者：(株)加藤工務店  
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑥



竜沢川 擁壁工・上部工・道路土工・排水構造物工  
工 期：令和元年06月28日~令和02年11月27日  
施工業者：セントラル建設(株)  
施工箇所：瑞浪市土岐町~恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区垂炭坑充填工事

⑦



充填工, 確認工  
工 期：令和元年07月27日~令和02年07月22日  
施工業者：飛鳥建設(株)  
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

完

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑧



東町横断歩道橋(全工程完了)  
工 期：令和元年08月07日~令和02年05月01日  
施工業者：ウノインフラプランテック(株)  
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

完

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

⑨



完了  
工 期：平成31年08月27日~令和元年07月31日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：中津川市中津川地先

完

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

⑩



CCTV設備更新  
工 期：令和元年11月25日~令和02年09月30日  
施工業者：大藤電設(株)  
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

95.6%

令和元年度多治見国道21号整備工事

⑪



可児工区(2) 舗装工 区画線工  
工 期：令和2年01月10日~令和02年11月30日  
施工業者：(株)中島工務店  
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区垂炭坑充填工事

⑫



充填工  
工 期：令和2年03月10日~令和3年01月29日  
施工業者：徳倉建設(株)  
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事



13 明世高架橋 鋼桁工 支承工 橋梁付属物工  
工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日  
施工業者：(株)梅田組  
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事



14 道路付属施設工 多治見2工区  
工 期：令和02年03月23日～令和03年01月22日  
施工業者：(株)吉川組  
施工箇所：多治見市地内、土岐市地内

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事



15 恵那工区 舟山横断歩道橋塗装工  
工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日  
施工業者：中部塗装(株)  
施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内

令和元年度多治見国道21号中畑地区垂坑充填工事



16 伏見工区削孔作業  
工 期：令和2年04月07日～令和2年12月25日  
施工業者：小池土木(株)  
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事



17 準備工、仮設工  
工 期：令和02年04月13日～令和03年02月18日  
施工業者：恵中建設(株)  
施工箇所：瑞浪市～恵那市

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事



18 準備工(ボーリング調査)  
工 期：令和02年04月20日～令和03年02月18日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：中津川市地内

令和元年度多治見管内改築舗装工事



19 構造物撤去工  
工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日  
施工業者：(株)NIPPO  
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事



20 工事用道路、函渠工、排水構造物工  
工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事



21 準備工  
工 期：令和02年07月01日～令和03年02月26日  
施工業者：セントラル建設(株)  
施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事



22 工 期：平成31年08月27日～令和元年07月31日  
施工業者：(株)中島工務店  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事



23 準備工  
工 期：令和02年09月04日～令和03年11月30日  
施工業者：板垣建設(株)  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道道路照明設備工事



24 準備工  
工 期：令和元年10月08日～令和02年03月31日  
施工業者：(株)関電工事  
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道通信設備工事



25 準備工  
工 期：令和02年00月00日～令和00年00月00日  
施工業者：松栄電子工業(株)  
施工箇所：

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事



26 準備工  
工 期：令和02年00月00日～令和00年00月00日  
施工業者：(株)加藤工務店  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先
