

令和2年9月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率		②（落合川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和元年度 木曽川水系 荒道工事用道路工事		予定		工 事 名：令和元年度 木曽川水系 中津川管内砂防堰堤補強工事		予定	
契 約 工 期： 令和1年9月12日 ～ 令和2年11月30日		実施	79.6%	契 約 工 期： 令和2年2月14日 ～ 令和2年9月30日		実施	100.0%
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差	
							
		完了		完了		完了	
今月作業：補強土壁工、路体盛土工、仮設工		今月作業：完成検査(R2.9.28)		今月作業：完成検査(R2.9.28)		今月作業：河床整形、後片付け、完成検査(R2.9.28)	
来月予定：補強土壁工		来月予定：—		来月予定：—		来月予定：—	
③（落合川流域）		進 捗 率		④（中津川出張所管内）		進 捗 率	
工 事 名：令和元年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：令和元年度 中津川出張所管内整備工事		予定	
契 約 工 期： 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月30日		実施	32.1%	契 約 工 期： 令和2年3月28日 ～ 令和3年3月31日		実施	27.7%
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差	
							
今月作業：場所打擁壁工(L型擁壁)、補強土壁工		今月作業：川上右岸道路工事、温川用水管理道補修、穴ヶ沢林道コンクリート舗装		今月作業：コンクリート堰堤工		今月作業：土工(砂防土工、作業土工)	
来月予定：補強土壁工		来月予定：川上右岸道路工事、穴ヶ沢林道コンクリート舗装		来月予定：コンクリート堰堤工		来月予定：土工(砂防土工、作業土工)	

令和2年9月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑦（中津川流域）		進捗率		⑧（落合川流域）		進捗率		⑨（中津川流域）		進捗率		⑩（本川筋）		進捗率	
工事名：令和2年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事		予定		工事名：令和2年度 木曽川水系 薬師沢砂防堰堤工事		予定		工事名：令和2年度 木曽川水系 川上流路工宮前橋工事		予定		工事名：令和2年度 木曽川水系 アラクラ沢工事用道路工事		予定	
契約工期： 令和2年5月7日 ～ 令和3年3月30日		実施	25.0%	契約工期： 令和2年7月16日 ～ 令和3年2月26日		実施	10.2%	契約工期： 令和2年8月18日 ～ 令和3年2月26日		実施	1.5%	契約工期： 令和2年9月29日 ～ 令和3年2月26日		実施	0.1%
請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）吉川工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差	
												準備工			
今月作業：流路護岸工				今月作業：仮設工、コンクリート堰堤工（作業土工）				今月作業：準備工				今月作業：準備工			
来月予定：流路護岸工				来月予定：仮設工、コンクリート堰堤工（作業土工）				来月予定：仮設工				来月予定：準備工			
⑪（落合川流域）		進捗率		⑫		進捗率		⑬		進捗率		⑭		進捗率	
工事名：令和2年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定		工事名：		予定		工事名：		予定		工事名：		予定	
契約工期： 令和2年12月7日 ～ 令和3年2月26日		実施	—	契約工期： ～		実施		契約工期： ～		実施		契約工期： ～		実施	
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差	
工事着手前															
今月作業： —				今月作業：				今月作業：				今月作業：			
来月予定： —				来月予定：				来月予定：				来月予定：			

令和2年9月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工事名： 令和元年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事 工期： 令和2年3月27日 ～ 令和3年2月12日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 実施 67.8%	② 工事名： 令和元年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事 工期： 令和2年3月31日 ～ 令和3年2月26日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 実施 50.4%
堰堤部 	砦山地区  水道川地区 
《今月作業》構造物取壊し工、垂直壁工 《11月作業》垂直壁工、側壁工	《今月作業》【砦山地区】砂防土工（掘削工） 【水道川地区】仮設工（工事用道路工）、砂防土工（残土処理工） 《11月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工（作業土工） 砂防土工（残土処理工） 【水道川地区】法面工（植生工）
③ 工事名： 令和2年度 妻木出張所整備工事 工期： 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 実施 56.3%	④ 工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事 工期： 令和2年5月1日 ～ 令和3年2月19日 施工業者：(株)吉川組 進捗率： 実施 49.9%
オリベ堰堤水路  堀切流路工 	根固めブロック製作 
《今月作業》生田下流流路工 《11月作業》生田下流流路工	《今月作業》根固めブロック製作・設置 《11月作業》根固めブロック製作・設置

令和2年 9月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)			②	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)			③	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			④	令和元年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)		
		進捗率(予定工程)	%	81.1		進捗率(予定工程)	%	95.2		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	53.6
		R1. 8.27～R3.2.15				R1. 8.27～R2.10.30				R1. 8.27～R2.5.29				R1. 9.12～R3.3.30		週休2日
																
今月 作業		コンクリート堰堤工				床固本体工(3号床固工)				-				橋台工		
来月 予定		コンクリート堰堤工(型枠組立、コンクリート打設) 砂防土工(堆積土石撤去)				床固本体工(3号床固工) 仮設工 片付け工				-				橋台工		
	⑤	令和元年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑥	令和元年度 木曽川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株)			⑦	令和元年度 木曽川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑧	令和元年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組		
		進捗率(予定工程)	%	100.0 (100.0)		進捗率(予定工程)	%	42.8		進捗率(予定工程)	%	67.7		進捗率(予定工程)	%	81.3
		R2. 3. 2～R2.9.30		ICT		R2. 3. 2～R3.2.26		ICT・週休2日		R2. 3. 2～R2.12.21		週休2日		R2. 3. 16～R3.2.26		ICT
																
今月 作業		砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)後片付け 完成検査				砂防土工 法面工 コンクリート副堰堤工 法面掘削(右岸) 鉄筋挿入・足場設置撤去 第一副堰堤 床掘～型枠～打設				コンクリート堰堤本体工 コンクリート側壁工				カルバート工・擁壁工		
来月 予定		-				砂防土工 法面工 コンクリート副堰堤工 法面掘削(右岸) 鉄筋挿入・足場設置撤去 第一副堰堤 床掘～型枠～打設 第二副堰堤 掘削				コンクリート側壁工・水叩工 仮水路工				擁壁工・流路工		


令和2年 9月末 上松出張所 工事進捗状況																				
	⑨	令和元年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑩	令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑪	令和元年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			⑫	令和2年度 木曽川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)						
		進捗率(予定工程)		%		23.4	進捗率(予定工程)			%	81.5	進捗率(予定工程)		%	4.7	進捗率(予定工程)		%	61.2	
		R2. 3.31～R3.2.12		週休2日		R2. 4. 1～R3.3.31				R2. 4. 17～R3.2.12		週休2日		R2. 4. 22～R3.2.12		週休2日				
今月 作業	工事用道路工(1)、コンクリート削孔				越百川:進入路整備 渡島蛇抜沢:除草作業				伐採工・仮設工				護床工・根固め工(根固めブロック製作)							
来月 予定	工事用道路工(1)、コンクリート切断				滑川:備蓄倉庫基礎工				仮設工・構造物撤去工				護床工・根固め工(根固めブロック製作)							
	⑬	令和2年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑭	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)														
		進捗率(予定工程)		%		0.1	進捗率(予定工程)			%	-									
		R2. 9. 28～R3.2.26		ICT		R2.11.30～R3. 2.26														
						写真無し														
今月 作業	施工計画				-															
来月 予定	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)				-															

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21号BP(下) 19.4kp~19.6kp 道路除草
工 期：平成31年04月01日~令和2年10月30日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

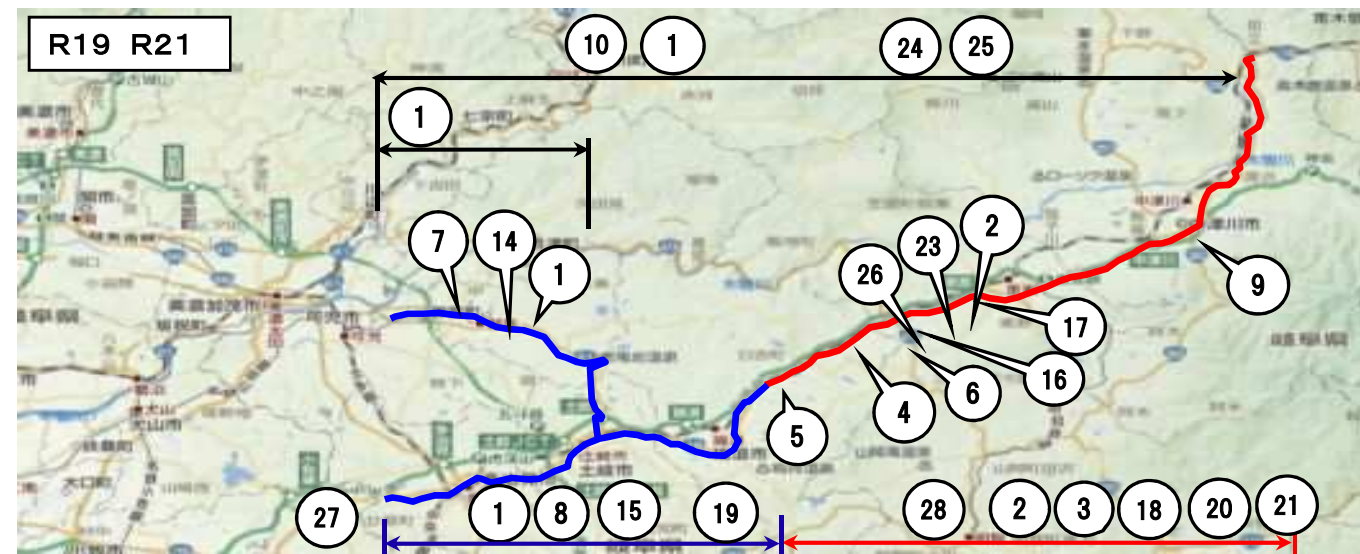

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号79.900kp(下) 緑地管理工(道路除草)
工 期：令和2年04月01日~令和4年09月30日
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

③



駒場跨道橋(完成)
工 期：平成31年03月09日~令和2年08月31日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：恵那市~中津川市

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

④



道路土工 掘削、土砂運搬
工 期：平成31年04月05日~令和2年11月20日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑤



仮設工、準備工
工 期：令和元年06月28日~令和2年11月30日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑥



滝沢川 舗装工・排水構造物工・防護柵工
工 期：令和元年06月28日~令和2年11月27日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市土岐町~恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区垂炭坑充填工事

⑦



充填工、確認工
工 期：令和元年07月27日~令和2年07月22日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑧



東町横断歩道橋(全工程完了)
工 期：令和元年08月07日~令和2年05月01日
施工業者：ウノインフラプランテック(株)
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

⑨



完了
工 期：平成31年08月27日~令和元年07月31日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市中津川地先

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

⑩



CCTV設備更新
工 期：令和元年11月25日~令和2年09月30日
施工業者：大藤電設(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号整備工事

⑪



次月工区 法面工 水抜きボーリング工
工 期：令和2年01月10日~令和3年01月29日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区垂炭坑充填工事

⑫



充填工
工 期：令和2年03月10日~令和3年01月29日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事

⑬



鶴城跨線橋 鋼桁工

工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日
 施工業者：(株)梅田組
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事

⑭



道路付属施設工他 多治見2工区

工 期：令和02年03月23日～令和03年01月22日
 施工業者：(株)吉川組
 施工箇所：多治見市地内、土岐市地内

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事

⑮



恵那工区 舟山横断歩道橋塗装工

工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日
 施工業者：中部塗装(株)
 施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内

令和元年度多治見国道21号中畑地区亜炭坑充填工事

⑯



伏見工区削孔作業

工 期：令和2年04月07日～令和2年12月25日
 施工業者：小池土木(株)
 施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事

⑰



仮設工、仮設防護柵

工 期：令和02年04月13日～令和03年03月29日
 施工業者：恵中建設(株)
 施工箇所：瑞浪市～恵那市

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事

⑱



地山補強土工

工 期：令和02年04月20日～令和03年02月18日
 施工業者：(株)吉川工務店
 施工箇所：中津川市地内

令和元年度多治見管内改築舗装工事

⑲



道路土工、舗装工

工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日
 施工業者：(株)NIPPO
 施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

⑳



工事用道路、函渠工、排水構造物工、地盤改良工

工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日
 施工業者：(株)吉川工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

㉑



瑞浪工区 区画線工

工 期：令和02年07月01日～令和03年02月26日
 施工業者：セントラル建設(株)
 施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

㉒



準備工

工 期：平成31年08月27日～令和元年07月31日
 施工業者：(株)中島工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

㉓



準備工

工 期：令和02年09月04日～令和03年11月30日
 施工業者：板垣建設(株)
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道道路照明設備工事

㉔



書類作成・現地調査・器材製作

工 期：令和02年08月17日～令和03年02月26日
 施工業者：(株)関電工事
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道通信設備工事

㉕



準備工、現地調査

工 期：令和02年08月24日～令和03年02月26日
 施工業者：松栄電子工業(株)
 施工箇所：

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

㉖

準備工

準備工

工 期：令和02年10月23日～令和04年02月25日
 施工業者：(株)加藤工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道西部除雪作業

㉗

準備工

準備工

工 期：令和2年01月10日～令和03年03月31日
 施工業者：(株)吉川組
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道東部除雪作業 ②8 準備工 準備工 工期：令和2年01月10日～令和03年03月31日 施工業者：（株）吉川工務店 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内				
--	--	--	--	--
