

令和2年10月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (落合川流域)	進捗率	② (落合川流域)	進捗率	③ (中津川出張所管内)	進捗率	④ (落合川流域)	進捗率
工事名: 令和元年度 木曾川水系 荒道工事用道路工事	予定	工事名: 令和元年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事	予定	工事名: 令和元年度 中津川出張所管内整備工事	予定	工事名: 令和元年度 木曾川水系 日陰第2砂防堰堤改築工事	予定
契約工期: 令和1年9月12日 ~ 令和2年11月30日	実施 93.0%	契約工期: 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月30日	実施 36.8%	契約工期: 令和2年3月28日 ~ 令和3年3月31日	実施 39.8%	契約工期: 令和2年4月7日 ~ 令和2年2月12日 変更予定工期: 令和2年4月7日 ~ 令和3年3月20日	実施 44.9%
請負業者名: (株)鳴海組	差	請負業者名: (株)鳴海組	差	請負業者名: (株)加藤工務店	差	請負業者名: (株)中島工務店	差
							
今月作業: 補強土壁工		今月作業: 場所打擁壁工		今月作業: 川上右岸道路工事、穴ヶ沢林道コンクリート舗装		今月作業: コンクリート堰堤工	
来月予定: 補強土壁工 12/3 完成検査予定		来月予定: 補強土壁工		来月予定: 中津川第2崩落箇所法面対策		来月予定: コンクリート堰堤工	
⑤ (中津川流域)	進捗率	⑥ (中津川流域)	進捗率	⑦ (落合川流域)	進捗率	⑧ (中津川流域)	進捗率
工事名: 令和元年度 木曾川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事	予定	工事名: 令和2年度 木曾川水系 中津川第2護岸整備工事	予定	工事名: 令和2年度 木曾川水系 薬師沢砂防堰堤工事	予定	工事名: 令和2年度 木曾川水系 川上流路工宮前橋工事	予定
契約工期: 令和2年4月10日 ~ 令和3年3月15日	実施 64.4%	契約工期: 令和2年5月7日 ~ 令和3年3月30日	実施 37.5%	契約工期: 令和2年7月16日 ~ 令和3年2月26日	実施 50.4%	契約工期: 令和2年8月18日 ~ 令和3年2月26日	実施 14.7%
請負業者名: (株)加藤工務店	差	請負業者名: (株)加藤工務店	差	請負業者名: (株)吉川工務店	差	請負業者名: (株)中島工務店	差
							
今月作業: コンクリート堰堤工		今月作業: 流路護岸工		今月作業: 仮設工、コンクリート堰堤工		今月作業: 仮設工、床固め工	
来月予定: コンクリート堰堤工		来月予定: 流路護岸工		来月予定: コンクリート堰堤工		来月予定: 仮設工、床固め工、排水構造物工	

令和2年10月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑨ (本川筋)	進捗率		⑩ (落合川流域)	進捗率		⑪	進捗率		進捗率			
工事名：令和2年度 木曾川水系 アラクラ沢工事用道路工事	予定		工事名：令和2年度 木曾川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事	予定	—	工事名：令和2年度 御嶽山CCTV設備工事	予定		工事名：	予定		
契約工期： 令和2年9月29日 ~ 令和3年2月26日	実施	1.2%	契約工期： 令和2年12月7日 ~ 令和3年2月26日	実施	—	契約工期： 令和2年10月1日 ~ 令和3年3月26日	実施		契約工期：	~	実施	
請負業者名：(株)中島工務店	差		請負業者名：(株)鳴海組	差	—	請負業者名：大藤電設(株)	差		請負業者名：		差	
準備工			工事着手前									
今月作業：準備工			今月作業：—			今月作業：準備工			今月作業：準備工			
来月予定：準備工			来月予定：—			来月予定：仮設工			来月予定：準備工			
工事名：	進捗率		工事名：	進捗率		工事名：	進捗率		工事名：	進捗率		
契約工期：	予定		契約工期：	予定		契約工期：	予定		契約工期：	予定		
請負業者名：	実施		請負業者名：	実施		請負業者名：	実施		請負業者名：	実施		
~	差		~	差		~	差		~	差		
今月作業：			今月作業：			今月作業：			今月作業：			
来月予定：			来月予定：			来月予定：			来月予定：			

令和2年10月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名: 令和元年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事</p> <p>工期: 令和2年3月27日 ~ 令和3年2月12日</p> <p>施工業者: (株)藤本組</p> <p>進捗率: 実施 73.5 %</p>	<p>②</p> <p>工事名: 令和元年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期: 令和2年3月31日 ~ 令和3年2月26日</p> <p>施工業者: (株)藤本組</p> <p>進捗率: 実施 52.6 %</p>
<p>堰堤部(垂直壁工)</p> 	<p>砦山地区</p>  <p>水道川地区</p> 
<p>《今月作業》垂直壁工 側壁工</p> <p>《12月作業》側壁工 水叩き工 流路護岸工</p>	<p>《今月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工(作業土工)、砂防土工(残土処理工)、構造物撤去工(構造物取壊し工、運搬処理工)【水道川地区】法面工(植生工)</p> <p>《12月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工(作業土工)、砂防土工(残土処理工)</p>
<p>③</p> <p>工事名: 令和2年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期: 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日</p> <p>施工業者: (株)藤本組</p> <p>進捗率: 実施 67.7 %</p>	<p>④</p> <p>工事名: 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事</p> <p>工期: 令和2年5月1日 ~ 令和3年2月19日</p> <p>施工業者: (株)吉川組</p> <p>進捗率: 実施 69.3 %</p>
<p>市之倉里山作業道</p>  <p>生田下流流路工</p> 	<p>根固めブロック製作</p> 
<p>《今月作業》市之倉里山作業道 ブロック積 生田下流流路工 ブロック積・土工</p> <p>《12月作業》市之倉里山作業道 土工・橋台</p>	<p>《今月作業》根固めブロック製作・設置</p> <p>《12月作業》根固めブロック製作・設置、防止柵工 基礎設置</p>

令和2年 10月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 令和元年度 木曾川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 87.8 R1. 8.27~R3.2.15	② 令和元年度 木曾川水系 下蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % 100.0 (100.0) R1. 8.27~R2.10.30	③ 令和元年度 木曾川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % 100.0 R1. 8.27~R2.5.29	④ 令和元年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株) 進捗率(予定工程) % 60.5 R1. 9.12~R3.3.30 週休2日
				
今月作業	コンクリート堰堤工(型枠組立、コンクリート打設) 砂防土工(堆積土石撤去)	後片付け	-	橋台工(足場解体、埋戻)
来月予定	コンクリート堰堤工(型枠組立、コンクリート打設) 鋼製堰堤工(鋼管保護工) 砂防土工(堆積土石撤去)	11月5日完成検査	-	PCポータルラーメン橋工(架設支保工、PCポータルラーメン製作工)
	⑤ 令和元年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株) 進捗率(予定工程) % 100.0 R2. 3. 2~R2.9.30 ICT	⑥ 令和元年度 木曾川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株) 進捗率(予定工程) % 53.0 R2. 3. 2~R3.2.26 ICT・週休2日	⑦ 令和元年度 木曾川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % 83.3 R2. 3. 2~R2.12.21 週休2日	⑧ 令和元年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組 進捗率(予定工程) % 86.1 R2. 3. 16~R3.2.26 ICT
				
今月作業	-	法面工 掘削・鉄筋挿入・足場設置 第一副堰堤工 型枠組立・コンクリート打設 仮設工 工事用道路設置	コンクリート側壁工・仮水路工・運搬処理工	擁壁工・流路工
来月予定	-	法面工 掘削・鉄筋挿入・足場設置 第一副堰堤工 型枠組立・コンクリート打設 鋼製堰堤工 鋼製枠設置・コンクリート打設 第二副堰堤工 掘削・型枠組立・コンクリート打設	仮水路工・運搬処理工・法面工	擁壁工・流路工・排水構造物工


令和2年 10月末 上松出張所 工事進捗状況

	令和元年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)		令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曾土建工業(株)		令和元年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)		令和2年度 木曾川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	R2. 3.31~R3.2.12	43.8	R2. 4. 1~R3.3.31	89.2	R2. 4. 17~R3.2.12	9.0	R2. 4. 22~R3.2.12	83.1
	週休2日				週休2日		週休2日	
								
今月作業	構造物撤去工(コンクリート切断)、工事用道路工(1)盛土		越百川: 進入路整備		構造物撤去工・仮設工		護床工・根固め工(根固めブロック製作)	
来月予定	構造物撤去工(コンクリート切断)、工事用道路工(1)盛土		滑川: 備蓄倉庫建立		構造物撤去工・仮設工		砂防土工(残土運搬整地) 護床工・根固め工(根固めブロック据付) 流出抑制対策工(強じんワイヤーネット材料納入)	
	令和2年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)		令和2年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)					
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%				
	R2. 9. 28~R3.2.26	40.8	R2.11.30~R3. 2.26	-				
	ICT							
			写真無し					
今月作業	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)							
来月予定	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)							

① 平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事



19号(上) 44.4kp~43.8kp 舗装修繕工
 工期: 平成31年04月01日~令和2年10月30日
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)
 施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp
 R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

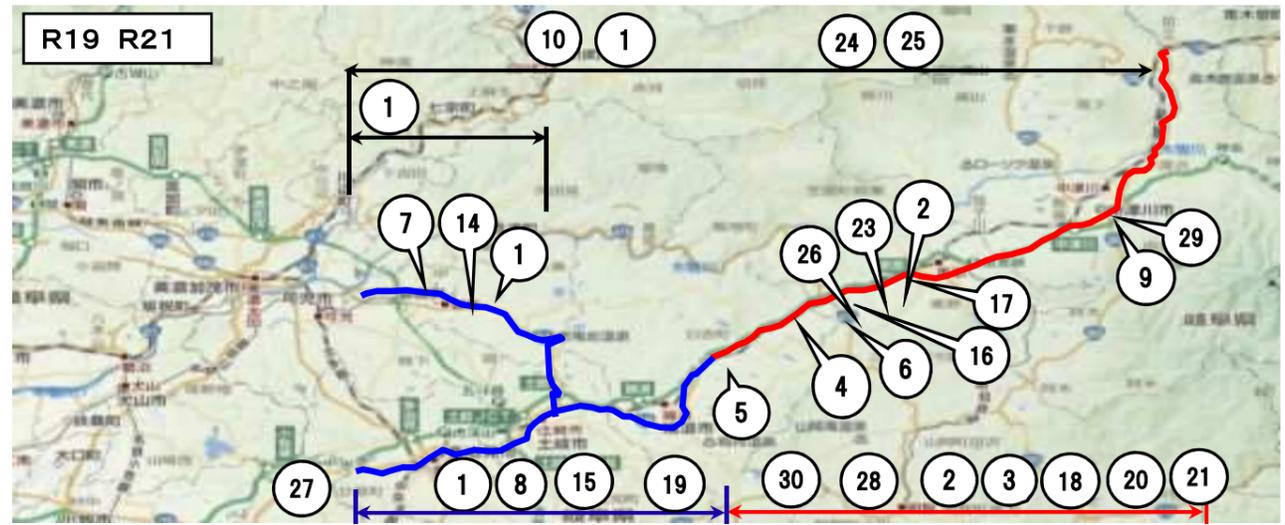

② 令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事



19号80.600kp(下) 緑地管理工(道路除草)
 工期: 令和2年04月01日~令和4年09月30日
 施工業者: (有)木曾ハイウェイサービス
 施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp

③ 平成30年度多治見国道橋梁補修工事



駒場跨道橋(完成)
 工期: 平成31年03月09日~令和2年08月31日
 施工業者: (株)中島工務店
 施工箇所: 恵那市~中津川市 **完**

④ 平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事



道路土工 掘削、土砂運搬
 工期: 平成31年04月05日~令和3年2月5日
 施工業者: (株)中島工務店
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

⑤ 平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事



仮設工、準備工
 工期: 令和元年06月28日~令和2年11月30日
 施工業者: (株)加藤工務店
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先

⑥ 平成31年度瑞浪恵那道路整備工事



市道西半入道・西定線: 舗装工・排水構造物工
 工期: 令和元年06月28日~令和2年11月27日
 施工業者: セントラル建設(株)
 施工箇所: 瑞浪市土岐町~恵那市武並町地先

⑦ 令和元年度多治見国道21号大庭地区垂炭坑充填工事



充填工、確認工
 工期: 令和元年07月27日~令和2年07月22日
 施工業者: 飛鳥建設(株)
 施工箇所: 岐阜県可児郡御嵩町地内 **完**

⑧ 令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事



東町横断歩道橋(全工程完了)
 工期: 令和元年08月07日~令和2年05月01日
 施工業者: ウノインフラプランテック(株)
 施工箇所: 瑞浪国道維持出張所管内 **完**

⑨ 令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事



完了
 工期: 平成31年08月27日~令和元年07月31日
 施工業者: (株)吉川工務店
 施工箇所: 中津川市中津川地先 **完**

⑩ 令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事



CCTV設備更新
 工期: 令和元年11月25日~令和2年09月30日
 施工業者: 大藤電設(株)
 施工箇所: 多治見砂防国道事務所管内 **完**
 100.0%

⑪ 令和元年度多治見国道21号整備工事



釜戸区 災害復旧 土工、排水工、舗装
 工期: 令和2年01月10日~令和3年01月29日
 施工業者: (株)中島工務店
 施工箇所: 多治見砂防国道事務所管内

⑫ 令和元年度多治見国道21号御岳地区垂炭坑充填工事



充填工
 工期: 令和2年03月10日~令和3年01月29日
 施工業者: 徳倉建設(株)
 施工箇所: 可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事

⑬



前野橋 現場塗装工

工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日
 施工業者：(株)梅田組
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事

⑭



排水構造物工 土岐工区

工 期：令和02年03月23日～令和03年03月22日
 施工業者：(株)吉川組
 施工箇所：多治見市地内、土岐市地内

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事

⑮



中津川工区 千旦林横断歩道橋塗装工

工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日
 施工業者：中部塗装(株)
 施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内

令和元年度多治見国道21号中畑地区亜炭坑充填工事

⑯



伏見工区充填作業

工 期：令和2年04月07日～令和2年12月25日
 施工業者：小池土木(株)
 施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事

⑰



仮設防護柵、掘削工

工 期：令和02年04月13日～令和03年03月29日
 施工業者：恵中建設(株)
 施工箇所：瑞浪市～恵那市

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事

⑱



地山補強土工

工 期：令和02年04月20日～令和03年02月18日
 施工業者：(株)吉川工務店
 施工箇所：中津川市地内

令和元年度多治見管内改築舗装工事

⑲



下層路盤工、排水構造物工、縁石工

工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日
 施工業者：(株)NIPPO
 施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

⑳



工事用道路、函渠工、排水構造物工、地盤改良工

工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日
 施工業者：(株)吉川工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

㉑



中津川(1)工区 ボーリング調査

工 期：令和02年07月01日～令和03年02月26日
 施工業者：セントラル建設(株)
 施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

㉒



P4橋脚 床掘

工 期：令和2年09月03日～令和3年11月30日
 施工業者：(株)中島工務店
 施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

㉓



準備工

工 期：令和02年09月04日～令和03年11月30日
 施工業者：板垣建設(株)
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道道路照明設備工事

㉔



書類作成・現地調査・器材製作

工 期：令和02年08月17日～令和03年02月26日
 施工業者：(株)関電工事
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道通信設備工事

㉕



準備工、現地調査

工 期：令和02年08月24日～令和03年03月24日
 施工業者：松栄電子工業(株)
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

㉖



準備工

工 期：令和02年10月23日～令和04年02月25日
 施工業者：(株)加藤工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道西部除雪作業

㉗



準備工

工 期：令和2年09月15日～令和03年03月31日
 施工業者：(株)吉川組
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道東部除雪作業

28



準備工

工 期：令和2年09月29日～令和3年03月31日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

29



準備工・現地調査・測量

工 期：令和2年10月14日～令和3年07月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

令和2年度多治見国道整備工事

30



準備工

工 期：令和2年10月17日～令和3年12月15日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

