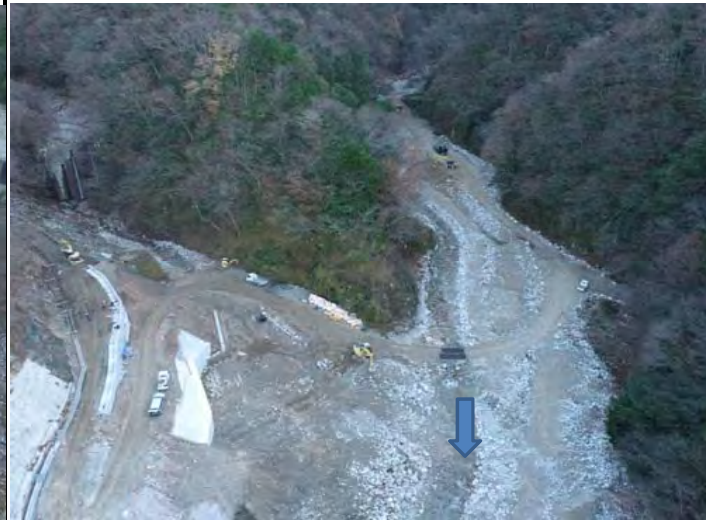


令和2年11月末 中津川出張所 工事進捗状況


①（落合川流域）		進 捗 率		②（落合川流域）		進 捗 率		③（中津川出張所管内）		進 捗 率		④（落合川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和元年度 木曽川水系 荒道工事用道路工事		予定		工 事 名：令和元年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：令和元年度 中津川出張所管内整備工事		予定		工 事 名：令和元年度 木曽川水系 日陰第2砂防堰堤改築工事		予定	
契 約 工 期： 令和1年9月12日 ～ 令和2年11月30日		実施	100.0%	契 約 工 期： 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月30日		実施	46.8%	契 約 工 期： 令和2年3月28日 ～ 令和3年3月31日		実施	50.1%	契 約 工 期： 令和2年4月7日 ～ 令和2年2月12日 変更予定工期： 令和2年4月7日 ～ 令和3年3月30日		実施	53.2%
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差	
		完了													
今月作業：補強土壁工、排水工、道路土工、後片付け				今月作業：補強土壁工、コンクリート張工、仮設工(工事用道路盛土)				今月作業：中津川第2堰堤崩落箇所整備その2				今月作業：コンクリート堰堤工			
来月予定：完成検査(R2.12.3)				来月予定：側溝工、仮設工(工事用道路盛土)				来月予定：中津川第2堰堤崩落箇所整備その2、中津川第2堰堤土捨場整備				来月予定：コンクリート堰堤工			
⑤（中津川流域）		進 捗 率		⑥（中津川流域）		進 捗 率		⑦（落合川流域）		進 捗 率		⑧（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和元年度 木曽川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事		予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 薬師沢砂防堰堤工事		予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 川上流路工宮前橋工事		予定	
契 約 工 期： 令和2年4月10日 ～ 令和3年3月15日		実施	81.0%	契 約 工 期： 令和2年5月7日 ～ 令和3年3月30日		実施	52.3%	契 約 工 期： 令和2年7月16日 ～ 令和3年2月26日		実施	78.9%	契 約 工 期： 令和2年8月18日 ～ 令和3年2月26日		実施	39.1%
請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）吉川工務店 R3.2月上旬完成検査予定		差		請負業者名：（株）中島工務店		差	
															
今月作業：コンクリート堰堤工				今月作業：流路護岸工				今月作業：コンクリート堰堤工				今月作業：仮設工、床固め工			
来月予定：コンクリート堰堤工				来月予定：流路護岸工				来月予定：コンクリート堰堤工				来月予定：仮設工、床固め工、PC橋工			

令和2年11月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑨（本川筋）			進 捗 率		⑩（落合川流域）			進 捗 率		⑪			進 捗 率					進 捗 率	
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 アラクラ沢工事用道路工事			予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事			予定	－	工 事 名：令和2年度 御嶽山CCTV設備工事			予定	33.4%	工 事 名：			予定	
契 約 工 期： 令和2年9月29日 ～ 令和3年2月26日			実施	2.4%	契 約 工 期： 令和2年12月7日 ～ 令和3年2月26日			実施	－	契 約 工 期： 令和2年10月1日 ～ 令和3年3月26日			実施	33.4%	契 約 工 期： ～			実施	
請負業者名： (株)中島工務店 変更による工期延期予定			差		請負業者名： (株)鳴海組 一部一時中止予定			差	－	請負業者名： 大藤電設(株)			差		請負業者名：			差	
					工 事 着 手 前														
今月作業：準備工					今月作業：－					今月作業：準備工					今月作業：準備工				
来月予定：仮設工					来月予定：－					来月予定：仮設工					来月予定：準備工				
工 事 名：			進 捗 率		工 事 名：			進 捗 率		工 事 名：			進 捗 率		工 事 名：			進 捗 率	
契 約 工 期： ～			予定		契 約 工 期： ～			予定		契 約 工 期： ～			予定		契 約 工 期： ～			予定	
請負業者名：			実施		請負業者名：			実施		請負業者名：			実施		請負業者名：			実施	
			差					差					差					差	
今月作業：					今月作業：					今月作業：					今月作業：				
来月予定：					来月予定：					来月予定：					来月予定：				

令和2年11月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工事名： 令和元年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事 工期： 令和2年3月27日 ～ 令和3年2月12日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 実施 81.9%	② 工事名： 令和元年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事 工期： 令和2年3月31日 ～ 令和3年2月26日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 実施 56.4%
	砦山地区 
《今月作業》側壁工、流路護岸工 《1月作業》流路護岸工、排水構造物工	【砦山地区】コンクリート堰堤工(作業土工)、砂防土工(残土処理工) 《今月作業》コンクリート堰堤工(コンクリート堰堤本体工) 【水道川地区】植生工(種子付きわら伏せ) 《1月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工(コンクリート堰堤本体工)
③ 工事名： 令和2年度 妻木出張所整備工事 工期： 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 実施 83.9%	④ 工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事 工期： 令和2年5月1日 ～ 令和3年2月19日 施工業者：(株)吉川組 進捗率： 実施 84.4%
 生田下流流路工  市之倉里山林道	根固めブロック製作  工事名 根固めブロック製作・設置、防止柵工 基礎設置 工種 工程管理 期 11年度 出庫高
《今月作業》市之倉里山林道 生田下流流路工 《1月作業》市之倉里山林道 寺下護岸	《今月作業》根固めブロック製作・設置、防止柵工 基礎設置 《1月作業》防止柵工 フェンス・門扉設置

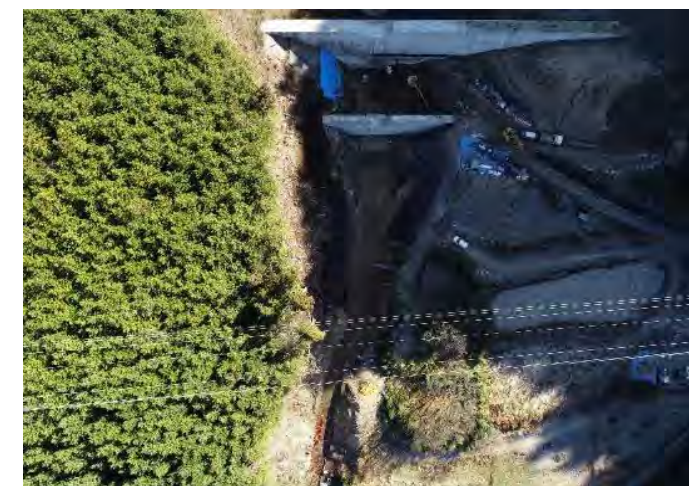令和2年 11月末 上松出張所 工事進捗状況																						
	①	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事			②	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事			③	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事			④	令和元年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事								
		施工業者		奥田工業(株)		施工業者		奥田工業(株)		施工業者		大宗土建(株)		施工業者		神稲建設(株)						
		進捗率(予定工程)		%		95.5	進捗率(予定工程)			%	100.0	進捗率(予定工程)		%	100.0	進捗率(予定工程)		%	64.0			
		R1. 8.27～R3.2.15				R1. 8.27～R2.10.30				R1. 8.27～R2.5.29				R1. 9.12～R3.3.30		週休2日						
																						
今月作業	コンクリート堰堤工(型枠組立、コンクリート打設) 鋼製堰堤工(鋼管保護工) 砂防土工(堆積土石撤去)			11月 5日完成検査			-			PCポータルラーメン橋工												
来月予定	砂防土工(堆積土石撤去) 仮設工撤去			-			-			PCポータルラーメン橋工												
	⑤	令和元年度 木曽川水系 上松管内除石工事			⑥	令和元年度 木曽川水系 下洞沢砂防堰堤工事			⑦	令和元年度 木曽川水系 額付砂防堰堤改築工事			⑧	令和元年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事								
		施工業者		木曽土建工業(株)		施工業者		松本土建(株)		施工業者		大宗土建(株)		施工業者		(株)宮坂組						
		進捗率(予定工程)		%		100.0	進捗率(予定工程)			%	63.6	進捗率(予定工程)		%	87.3	進捗率(予定工程)		%	93.7			
		R2. 3. 2～R2.9.30		ICT		R2. 3. 2～R3.2.26		ICT・週休2日		R2. 3. 2～R2.12.21		週休2日		R2. 3. 16～R3.2.26		ICT						
																						
今月作業	-			法面工(鉄筋挿入、植生基材吹付) コンクリート副堰堤工(第一副堰堤)			法面工			擁壁工・流路工												
来月予定	-			コンクリート副堰堤工(第二副堰堤、側壁工)			コンクリート堰堤本体工			擁壁工・法面工・排水構造物工												


令和2年 11月末 上松出張所 工事進捗状況																								
	⑨	令和元年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事				⑩	令和2年度 上松出張所整備工事				⑪	令和元年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事				⑫	令和2年度 木曽川水系 上松管内砂防施設整備工事							
		施工業者		大宗土建(株)			施工業者		木曽土建工業(株)			施工業者		奥田工業(株)			施工業者		奥田工業(株)					
		進捗率(予定工程)		%	59.3		進捗率(予定工程)		%	94.9		進捗率(予定工程)		%	35.0		進捗率(予定工程)		%	96.8				
		R2. 3.31～R3.2.12		週休2日			R2. 4. 1～R3.3.31					R2. 4. 17～R3.2.12		週休2日			R2. 4. 22～R3.2.12		週休2日					
																								
今月作業	工事用道路工(盛土、大型土のう)				滑川備蓄倉庫:基礎工				構造物撤去工・仮設工				後片付け											
来月予定	コンクリート構造物取壊し、工事用道路工(大型土のう)				滑川備蓄倉庫:外構・建立				構造物撤去工・仮設工				12月23日完成検査予定											
	⑬	令和2年度 木曽川水系 上松管内除石工事				⑭	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事																	
		施工業者		木曽土建工業(株)			施工業者		奥田工業(株)															
		進捗率(予定工程)		%	89.3		進捗率(予定工程)		%	0.0														
		R2. 9. 28～R3.2.26		ICT			R2.11.30～R3. 2.26		週休2日															
																								
今月作業	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)				準備工																			
来月予定	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)、片付け				準備工 床固工(作業土工)																			

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(上) 44.4kp~43.8kp 舗装修繕工
工 期：平成31年04月01日~令和2年10月30日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

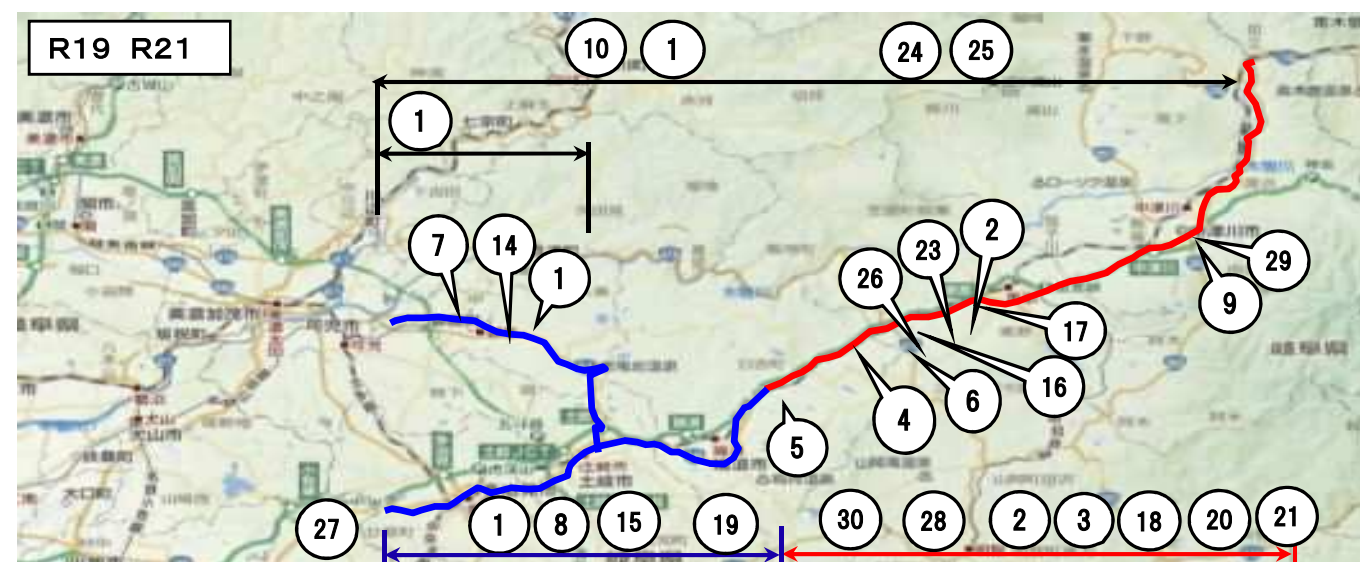

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号89.900kp(上) 舗装工(切削オーバーレイ工)
工 期：令和02年04月01日~令和04年09月30日
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

③



駒場跨道橋(完成)
工 期：平成31年03月09日~令和2年08月31日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：恵那市~中津川市

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

④



(一時)一部中止中
工 期：平成31年04月05日~令和3年2月5日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑤



仮設工、準備工
工 期：令和元年06月28日~令和02年11月30日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑥



瑞浪恵那道路本線側道：舗装工・防護施設工
工 期：令和元年06月28日~令和02年12月18日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市土岐町~恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区垂炭坑充填工事

⑦



充填工、確認工
工 期：令和元年07月27日~令和02年07月22日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑧



東町横断歩道橋(全工程完了)
工 期：令和元年08月07日~令和02年05月01日
施工業者：ウノインフラプランテック(株)
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

⑨



完了
工 期：平成31年08月27日~令和元年07月31日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市中津川地先

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

⑩



CCTV設備更新
工 期：令和元年11月25日~令和02年09月30日
施工業者：大藤電設(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号整備工事

⑪



可児工区(1) 土工、給水管、附帯施設
工 期：令和2年01月10日~令和03年01月29日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区垂炭坑充填工事

⑫



確認ボーリング
工 期：令和2年03月10日~令和3年01月29日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事

⑬



田邊橋 橋梁付属物工

工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事

⑭



排水構造物工他 土岐工区

工 期：令和02年03月23日～令和03年03月22日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：多治見市地内、土岐市地内

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事

⑮



中津川工区 千旦林横断歩道橋塗装工

工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日
施工業者：中部塗装(株)
施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内

令和元年度多治見国道21号中畑地区亜炭坑充填工事

⑯



プラント解体作業

工 期：令和2年04月07日～令和2年12月25日
施工業者：小池土木(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事

⑰



道路土工

工 期：令和02年04月13日～令和03年03月29日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：瑞浪市～恵那市

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事

⑱



地山補強土工

工 期：令和02 年04月20日～令和03年02月18日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市地内

令和元年度多治見管内改築舗装工事

⑲



舗装工、排水構造物工、縁石工

工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日
施工業者：(株)NIPPO
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

⑳



工事用道路、函渠工、排水構造物工、仮設工
工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

㉑



中津川(1)工区 擁壁工(作業土工・マルチ吹付)
工 期：令和02年07月01日～令和03年02月26日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

㉒



P4橋脚 床掘・切土補強

工 期：令和2年09月03日～令和3年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

㉓



切廻し道路、排水構造物工

工 期：令和02年09月04日～令和03年11月30日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道道路照明設備工事

㉔



道路照明設備工

工 期：令和02年08月17日～令和03年02月26日
施工業者：(株)関電工事
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道通信設備工事

㉕



準備工、機器製作

工 期：令和02年08月24日～令和03年03月26日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

㉖



準備工・現地調査・測量

工 期：令和02年10月23日～令和04年02月25日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道西部除雪作業

㉗



環境整備費

工 期：令和2年09月15日～令和03年03月31日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道東部除雪作業

28



準備工・環境整備

工 期：令和2年09月29日～令和03年03月31日

施工業者：（株）吉川工務店

施工箇所： 多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

29



仮設進入路、河川仮締切

工 期：令和2年10月14日～令和3年07月30日

施工業者：（株）吉川工務店

施工箇所： 岐阜県中津川市中津川地先

令和2年度多治見国道整備工事

30



準備工

工 期：令和2年10月17日～令和3年12月15日

施工業者：板垣建設(株)

施工箇所： 岐阜県中津川市山口地先

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

1



19号(中) 48.15kp～48.75kp 緑地管理工

工 期：令和2年10月30日～令和5年10月31日

施工業者：日本ハイウェイ・サービス（株）

施工箇所： R19 31.5kp～55.2kp

R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP
