

令和2年12月末中津川出張所工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率		②（中津川出張所管内）		進 捗 率		③（落合川流域）		進 捗 率		④（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和元年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：令和元年度 中津川出張所管内整備工事		予定		工 事 名：令和元年度 木曽川水系 日陰第2砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：令和元年度 木曽川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事		予定	
契 約 工 期： 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月30日		実施	61.9%	契 約 工 期： 令和2年3月28日 ～ 令和3年3月31日		実施	77.4%	契 約 工 期： 令和2年4月7日 ～ 令和2年2月12日 変更予定工期： 令和3年3月30日		実施	76.2%	契 約 工 期： 令和2年4月10日 ～ 令和3年3月15日		実施	93.5%
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）加藤工務店 令和3年2月18日完成検査予定		差	
															
今月作業：側溝工、仮設工(工事用道路盛土、砂防仮締切工)、コンクリート張工		今月作業：中津川第2(堰堤崩落箇所整備その2、土捨場整備)		今月作業：コンクリート堰堤工、かご工		今月作業：コンクリート堰堤工									
来月予定：コンクリート堰堤工		来月予定：中津川第2(堰堤崩落箇所整備その2、土捨場整備)、川上土捨場整備		来月予定：かご工、根固めブロック工		来月予定：コンクリート堰堤工									
⑤（中津川流域）		進 捗 率		⑥（落合川流域）		進 捗 率		⑦（中津川流域）		進 捗 率		⑧（本川筋）		進 捗 率	
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事		予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 薬師沢砂防堰堤工事		予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 川上流路工宮前橋工事		予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 アラクラ沢工事用道路工事		予定	
契 約 工 期： 令和2年5月7日 ～ 令和3年3月30日		実施	65.9%	契 約 工 期： 令和2年7月16日 ～ 令和3年2月26日		実施	95.9%	契 約 工 期： 令和2年8月18日 ～ 令和2年2月26日 変更予定工期： 令和3年7月30日		実施	55.5%	契 約 工 期： 令和2年9月29日 ～ 令和2年2月26日 変更予定工期： 令和3年7月30日		実施	19.5%
請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）吉川工務店 令和3年2月3日完成検査予定		差		請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差	
															
今月作業：流路護岸工		今月作業：コンクリート堰堤工		今月作業：仮設工、床固め工、PC橋工		今月作業：擁壁工、排水構造物工									
来月予定：流路護岸工		来月予定：埋戻し、仮設物撤去等		来月予定：床固め工、PC橋工		来月予定：擁壁工、排水構造物工、観測井戸設置工									

令和2年12月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑨（落合川流域）		進 捗 率		⑩		進 捗 率				進 捗 率	
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事 ※令和3年2月21日まで工事の(一部)一時中止		予定		工 事 名：令和2年度 御嶽山CCTV設備工事		予定		工 事 名：その他 現場カード		予定	
契 約 工 期：令和2年12月7日 ～ 令和3年2月26日 変更予定工期 令和3年4月30日		実施 4.9%		契 約 工 期：令和2年10月1日 ～ 令和3年3月26日		実施 66.8%		契 約 工 期： ～		契 約 工 期： ～	
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：大藤電設(株)		差		請負業者名：		請負業者名：	
				 日和田CCTV積雪状況 工 事 名 令和2年度 御嶽山CCTV設備工事 工 種 CCTV設備工 場 所 日和田CCTV 積雪状況確認 施 工 者 大藤電設株式会社 日和田CCTVに進入するための駐車場(元スキー場現在は営業していない)は除雪していないため進入できない状況でした。							
今月作業：ブロック積工				今月作業：				今月作業：			
来月予定：ガードレール基礎工				来月予定：				来月予定：			
		進 捗 率				進 捗 率				進 捗 率	
工 事 名：		予定		工 事 名：		予定		工 事 名：		予定	
契 約 工 期： ～		実施		契 約 工 期： ～		実施		契 約 工 期： ～		契 約 工 期： ～	
請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：		請負業者名：	
今月作業：				今月作業：				今月作業：			
来月予定：				来月予定：				来月予定：			

令和2年12月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工 事 名 : 令和元年度 庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事 工 期 : 令和2年3月27日 ~ 令和3年2月12日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率 : 実施 93.0%	② 工 事 名 : 令和元年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事 工 期 : 令和2年3月31日 ~ 令和3年3月15日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率 : 実施 64.7%
	砦山地区 
《今月作業》流路護岸工、道路改良工 《2月作業》道路改良工、法面工、砂防堰堤付属物工	《今月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工(コンクリート堰堤本体工) 《2月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工(コンクリート堰堤本体工、作業土工)
③ 工 事 名 : 令和2年度 妻木出張所整備工事 工 期 : 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率 : 実施 89.1%	④ 工 事 名 : 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事 工 期 : 令和2年5月1日 ~ 令和3年2月19日 施工業者: (株)吉川組 進 捗 率 : 実施 94.2%
 市之倉里山林道 寺下護岸	根固めブロック製作  工事名 根固めブロック製作 工種 工事管理 測点 12月度 出来高
《今月作業》市之倉里山林道 排水構造物工 寺下護岸 根継工 《2月作業》市之倉里山林道 舗装工 寺下護岸 根固ブロック設置	《今月作業》防止柵工 フェンス・門扉設置 《2月作業》準備工 書類整理

令和2年 12月末 上松出張所 工事進捗状況

①	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)			②	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)			③	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			④	令和元年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)		
	進捗率(予定工程)	%	97.1		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	67.9
	R1. 8.27～R3.2.15				R1. 8.27～R2.10.30				R1. 8.27～R2.5.29				R1. 9.12～R3.3.30		週休2日
															
今月 作業	砂防土工(堆積土石撤去) 仮設工撤去				-				-				PCポータルラーメン製作工		
来月 予定	砂防土工(堆積土石撤去)				-				-				PCポータルラーメン製作工		

⑤	令和元年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑥	令和元年度 木曽川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株)			⑦	令和元年度 木曽川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑧	令和元年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組		
	進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	79.8		進捗率(予定工程)	%	96.8		進捗率(予定工程)	%	97.6
	R2. 3. 2～R2.9.30		ICT		R2. 3. 2～R3.2.26		ICT・週休2日		R2. 3. 2～R3. 3.19		週休2日		R2. 3. 16～R3.2.26		ICT
															
今月 作業	-				コンクリート堰堤工 第二副堰堤・側壁				コンクリート堰堤工・法面工				道路土工・擁壁工・排水構造物工		
来月 予定	-				コンクリート堰堤工 第二副堰堤・側壁 基礎工 ブロック積工				法面工・河床整理・片付け				法面工・排水構造物工・舗装工		

令和2年 12月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨	令和元年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑩	令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑪	令和元年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			⑫	令和2年度 木曽川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)						
		進捗率(予定工程)		%		75.9	進捗率(予定工程)			%	102.3	進捗率(予定工程)		%	54.3	進捗率(予定工程)		%	100.0	
		R2. 3.31～R3.2.12		週休2日		R2. 4. 1～R3.3.31				R2. 4. 17～R3.2.12		週休2日		R2. 4. 22～R3.2.12		週休2日				
																				
今月作業	コンクリート構造物取壊し、コン殻運搬処分				滑川備蓄倉庫:外構・建立				構造物撤去工・仮設工				12月23日完成検査							
来月予定	コンクリート構造物取壊し、コン殻運搬処分、仮設工				滑川備蓄倉庫・越百川林道整備				構造物撤去工				—							


	⑬	令和2年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑭	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)										
		進捗率(予定工程)		%		96.8	進捗率(予定工程)			%	2.1					
		R2. 9. 28～R3.2.26		ICT		R2.11.30～R3. 2.26		週休2日								
																
今月作業	砂防土工(掘削・転石破碎・運搬)、片付け				準備工 仮設工 作業土工 掘削(2号床固工)											
来月予定	—				床固工(2号床固工)											

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21号(上) 17.30kp~16.30kp 緑地管理工
工 期：令和2年10月30日~令和5年10月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

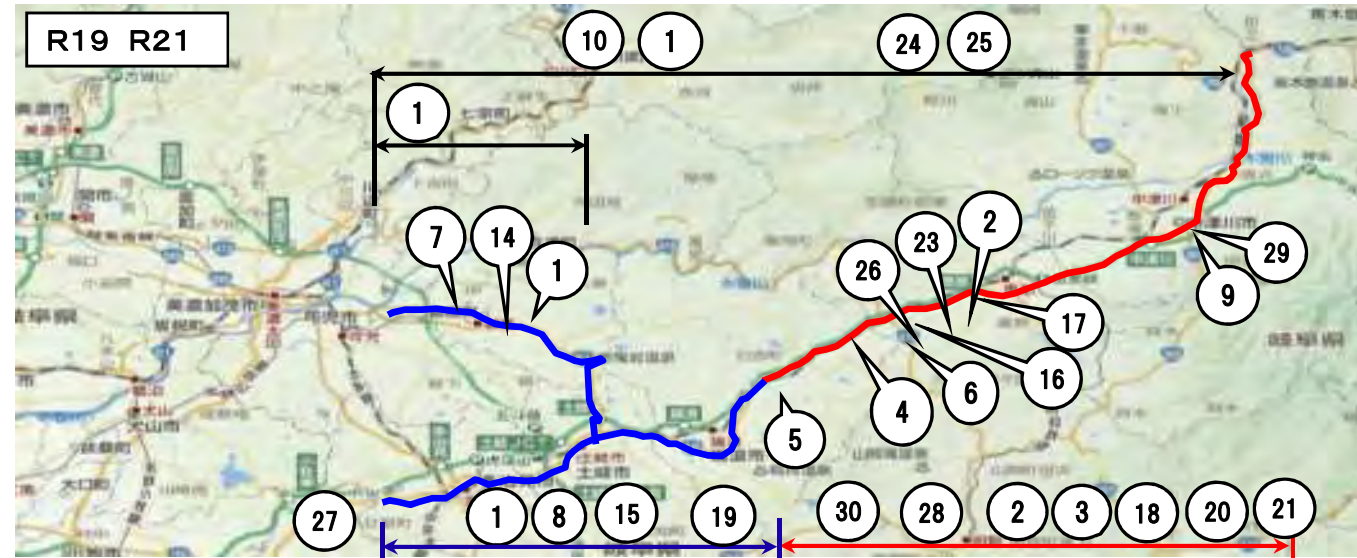

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



9号61.900kp(上下) 舗装工(切削オーバーレイ工)
工 期：令和2年04月01日~令和4年09月30日
施工業者：(有)木曾ハイウエーサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

③



駒場跨道橋(完成)
工 期：平成31年03月09日~令和2年08月31日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：恵那市~中津川市

完

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

④



(一時)一部中止中
工 期：平成31年04月05日~令和3年2月5日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑤



仮設工、準備工
工 期：令和元年06月28日~令和2年11月30日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

完

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑥



2工区土岐③：舗装工・仮設工
工 期：令和元年06月28日~令和3年1月13日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市土岐町~恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区垂炭坑充填工事

⑦



充填工、確認工
工 期：令和元年07月27日~令和2年07月22日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

完

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑧



東町横断歩道橋(全工程完了)
工 期：令和元年08月07日~令和2年05月01日
施工業者：ウノインフラプランテック(株)
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

完

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

⑨



完了
工 期：平成31年08月27日~令和元年07月31日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市中津川地先

完

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

⑩



CCTV設備更新
工 期：令和元年11月25日~令和2年09月30日
施工業者：大藤電設(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

完

令和元年度多治見国道21号整備工事

⑪



可児工区(1) 土工、給水管、附帯施設
工 期：令和2年01月10日~令和3年01月29日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区垂炭坑充填工事

⑫



片付け
工 期：令和2年03月10日~令和3年01月29日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事

⑬



山口工区 完了

工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事

⑭



排水構造物工他 土岐工区

工 期：令和02年03月23日～令和03年03月22日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：多治見市地内、土岐市地内

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事

⑮



中津川工区 千旦林横断歩道橋塗装工

工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日
施工業者：中部塗装(株)
施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内

令和元年度多治見国道21号中畑地区垂炭坑充填工事

⑯



完了

工 期：令和2年04月07日～令和3年2月26日
施工業者：小池土木(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事

⑰



道路土工、法面保護工

工 期：令和02年04月13日～令和03年03月29日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：瑞浪市～恵那市

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事

⑱



地山補強土工

工 期：令和02 年04月20日～令和03年02月18日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市地内

令和元年度多治見管内改築舗装工事

⑲



舗装工、排水構造物工、縁石工

工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日
施工業者：(株)NIPPO
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

⑳



工事用道路、函渠工、排水構造物工、仮設工
工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

㉑



中津川(1)工区 擁壁工(作業土工・マルチ吹付)
工 期：令和02年07月01日～令和03年02月26日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

㉒



P4橋脚 床掘・切土補強

工 期：令和2年09月03日～令和3年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

㉓



切廻し道路、排水構造物工

工 期：令和02年09月04日～令和03年11月30日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道道路照明設備工事

㉔



道路照明設備工

工 期：令和02年08月17日～令和03年02月26日
施工業者：(株)関電工事
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道通信設備工事

㉕



準備工、機器製作

工 期：令和02年08月24日～令和03年03月26日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

㉖



準備工・現地調査・測量

工 期：令和02年10月23日～令和04年02月25日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道西部除雪作業

㉗



凍結防止工

工 期：令和2年09月15日～令和03年03月31日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道東部除雪作業

28



凍結防止工

工 期：令和2年09月29日～令和03年03月31日

施工業者：（株）吉川工務店

施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

29



橋脚巻き立て工 床堀、構造物取壊し

工 期：令和2年10月14日～令和3年07月30日

施工業者：（株）吉川工務店

施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

令和2年度多治見国道整備工事

30



準備工

工 期：令和2年10月17日～令和3年12月15日

施工業者：板垣建設(株)

施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

1



舗装修繕工

工 期：平成31年04月01日～令和2年10月30日

施工業者：日本ハイウェイ・サービス（株）

施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp
R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

完
