

令和3年1月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進捗率		②（中津川出張所管内）		進捗率		③（落合川流域）		進捗率		④（中津川流域）		進捗率	
工事名：令和元年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定		工事名：令和元年度 中津川出張所管内整備工事		予定		工事名：令和元年度 木曽川水系 日陰第2砂防堰堤改築工事		予定		工事名：令和元年度 木曽川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事		予定	
契約工期：令和2年4月1日～令和3年3月30日		実施	67.9%	契約工期：令和2年3月28日～令和3年3月31日		実施	93.7%	契約工期：令和2年4月7日～令和3年3月30日		実施	81.8%	契約工期：令和2年4月10日～令和3年3月15日		実施	100.0%
請負業者名：(株)鳴海組		差		請負業者名：(株)加藤工務店		差		請負業者名：(株)中島工務店		差		請負業者名：(株)加藤工務店 2/18完成検査予定		差	
															
今月作業：コンクリート堰堤工				今月作業：中津川第2(堰堤崩落箇所整備その2、土捨場整備)、川上土捨場整備				今月作業：かご工、根固めブロック工				今月作業：コンクリート堰堤工、土工(埋戻し・河床整形)、後片付け			
来月予定：コンクリート堰堤工				来月予定：中津川第2(堰堤崩落箇所整備その2、土捨場整備)				来月予定：かご工、根固めブロック工等				来月予定：完成(R3.2.5)、検査(R3.2.18)			
⑤（中津川流域）		進捗率		⑥（落合川流域）		進捗率		⑦（中津川流域）		進捗率		⑧（本川筋）		進捗率	
工事名：令和2年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事		予定		工事名：令和2年度 木曽川水系 薬師沢砂防堰堤工事		予定		工事名：令和2年度 木曽川水系 川上流路工宮前橋工事		予定		工事名：令和2年度 木曽川水系 アラクラ沢工事用道路工事		予定	
契約工期：令和2年5月7日～令和3年3月30日		実施	83.0%	契約工期：令和2年7月16日～令和3年2月26日		実施	100.0%	契約工期：令和2年8月18日～令和2年2月26日 変更予定工期：令和2年8月18日～令和3年7月30日		実施	65.5%	契約工期：令和2年9月29日～令和3年7月30日		実施	23.6%
請負業者名：(株)加藤工務店		差		請負業者名：(株)吉川工務店 2/3完成検査終了		差		請負業者名：(株)中島工務店		差		請負業者名：(株)中島工務店		差	
															
				完了											
今月作業：流路護岸工				今月作業：埋戻し、仮設物撤去、完成(R3.1.29)				今月作業：床固め工、橋梁付属物工、流路護岸工等				今月作業：道路土工、排水構造物工、観測井戸設置工			
来月予定：流路護岸工、残土処理工				来月予定：検査(R3.2.5)				来月予定：床固め工、橋梁付属物工、流路護岸工等				来月予定：道路土工等			

令和3年1月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑨（落合川流域）		進捗率		⑩		進捗率				進捗率	
工事名：令和2年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事 ※令和3年2月21日まで工事の(一部)一時中止		予定		工事名：令和2年度 御嶽山CCTV設備工事		予定		工事名：		予定	
契約工期：令和2年12月7日 ～ 令和3年2月26日 変更予定工期：令和3年4月28日		実施	7.8%	契約工期：令和2年10月1日 ～ 令和3年3月26日		実施	93.5%	契約工期：～		実施	
請負業者名：(株)鳴海組		差		請負業者名：大藤電設(株)		差		請負業者名：		差	
								令和3年度 出張あおぞら教室 中津川市内 18小学校に依頼済み 3校から参加申し込み(2/15現在)			
今月作業：ガードレール基礎工、排水構造物工				今月作業：				今月作業：			
来月予定：ガードレール基礎工、排水構造物工、道路土工				来月予定：				来月予定：			
		進捗率				進捗率				進捗率	
工事名：		予定		工事名：		予定		工事名：		予定	
契約工期：～		実施		契約工期：～		実施		契約工期：～		実施	
請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差	
今月作業：				今月作業：				今月作業：			
来月予定：				来月予定：				来月予定：			

令和3年1月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

①

工事名： 令和元年度
庄内川水系 平園第6砂防堰堤工事
工 期： 令和2年3月27日 ～ 令和3年2月12日

施工業者：(株)藤本組

進捗率： 実施 98.5%



《今月作業》 立入防止柵工、道路改良工、舗装工

《3月作業》

②

工事名： 令和元年度
庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事
工 期： 令和2年3月31日 ～ 令和3年3月15日

施工業者：(株)藤本組

進捗率： 実施 79.9 %

砦山地区



《今月作業》 コンクリート堰堤本体工、作業土工

《3月作業》 コンクリート堰堤本体工、作業土工、仮設工、道路土工、舗装工

③

工事名： 令和2年度
妻木出張所整備工事
工 期： 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月31日

施工業者：(株)藤本組

進捗率： 実施 110.1 %



寺下護岸

市之倉里山林道

《今月作業》 市之倉里山林道 舗装工、排水構造物工、防護柵工
寺下護岸 根継工、根固めブロック設置工

《3月作業》 寺下護岸 土工、仮設工撤去

④

工事名： 令和2年度
庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事
工 期： 令和2年5月1日 ～ 令和3年2月19日

施工業者：(株)吉川組

進捗率： 実施 100%

防止柵設置



《今月作業》 準備工 書類整理

《3月作業》

令和3年 1月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	令和元年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)
		進捗率(予定工程) % 97.4 R1. 8.27～R3.3.19	進捗率(予定工程) % 100.0 R1. 8.27～R2.10.30	進捗率(予定工程) % 100.0 R1. 8.27～R2.5.29	進捗率(予定工程) % 74.1 R1. 9.12～R3.3.30 週休2日
					
今月作業		砂防土工(堆積土石撤去)	-	-	PCポータルラーメン製作用
来月予定		砂防土工(堆積土石撤去)	-	-	擁壁工・構造物撤去工
	⑤	令和元年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)	令和元年度 木曽川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株)	令和元年度 木曽川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	令和元年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組
		進捗率(予定工程) % 100.0 R2. 3. 2～R2.9.30 ICT	進捗率(予定工程) % 88.4 R2. 3. 2～R3.2.26 ICT・週休2日	進捗率(予定工程) % 100.0 R2. 3. 2～R3.3.19 週休2日	進捗率(予定工程) % 99.8 R2. 3. 16～R3.2.26 ICT
					
今月作業		-	コンクリート堰堤工 第二副堰堤 側壁工 基礎工・ブロック積工	河床整理・片付け	排水構造物工・法面工・舗装工・道路付属物工
来月予定		-	コンクリート堰堤工 側壁工 基礎工・ブロック積工 水叩き 片付け	2月26日完成検査	2月25日完成検査

令和3年 1月末 上松出張所 工事進捗状況


	⑨	令和元年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	⑩	令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曽土建工業(株)	⑪	令和元年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	⑫	令和2年度 木曽川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) % 96.1		進捗率(予定工程) % 103.9		進捗率(予定工程) % 73.3		進捗率(予定工程) % 100.0
		R2. 3.31～R3.3.19 週休2日		R2. 4. 1～R3.3.31		R2. 4. 17～R3.3.19 週休2日		R2. 4. 22～R3.2.12 週休2日
								
今月作業		構造物撤去工、仮設工		滑川備蓄倉庫建立		構造物撤去工		—
来月予定		仮設工、準備工		越百川道路整備工		構造物撤去工		—
	⑬	令和2年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)	⑭	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	⑮	令和2年度 木曽川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曽土建工業(株)	⑯	令和2年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) % 100.0		進捗率(予定工程) % 10.1		進捗率(予定工程) % 0.0		進捗率(予定工程) % 0.0
		R2. 9. 28～R3.2.26 ICT		R2.11.30～R3. 7.30 週休2日		R3. 2. 8～R3. 7.30		R3. 3.29～R3. 7.30
						写真無し		写真無し
今月作業		—		床固め本体工(2号床固)		—		—
来月予定		2月5日完成検査		床固め本体工(2号床固)		—		—

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(下) 38.70kp～39.00kp 舗装修繕工
工 期：令和2年10月30日～令和5年10月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp
R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

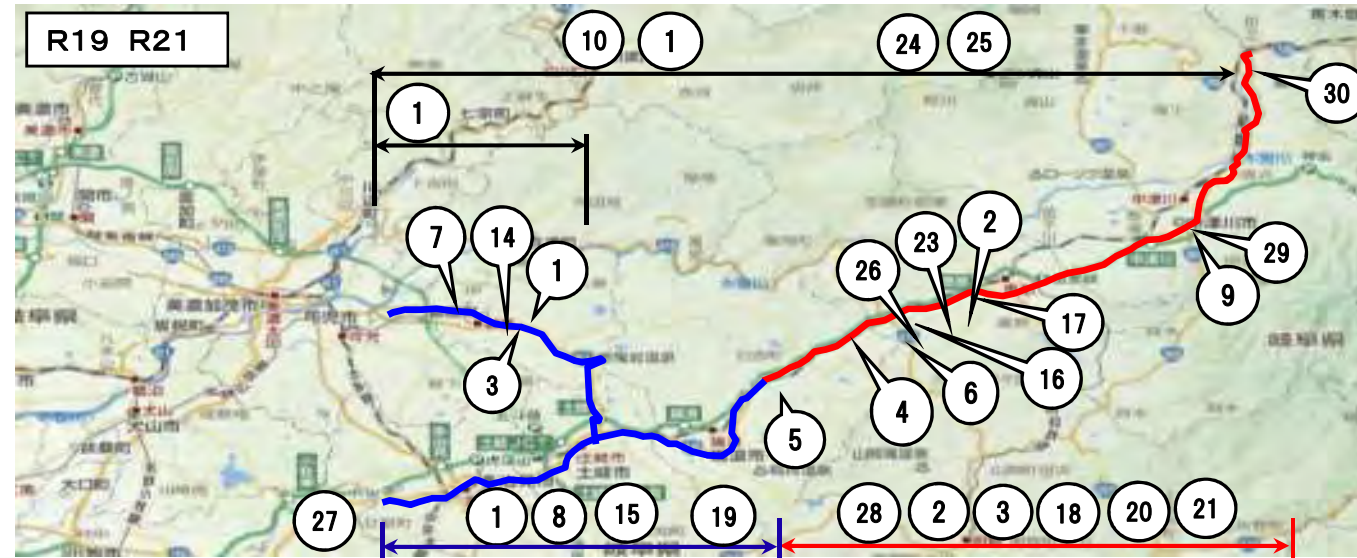

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号61.400kp(上) 緑地管理工防草シート工
工 期：令和2年04月01日～令和4年09月30日
施工業者：(有) 木曾ハイウエーサービス
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp

平成30年度多治見国道橋梁補修工事

③



駒場跨道橋(完成)
工 期：平成31年03月09日～令和2年08月31日
施工業者：(株) 中島工務店
施工箇所：恵那市～中津川市

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事

④



完了
工 期：平成31年04月05日～令和3年2月5日
施工業者：(株) 中島工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事

⑤



仮設工、準備工
工 期：令和元年06月28日～令和2年11月30日
施工業者：(株) 加藤工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

平成31年度瑞浪恵那道路整備工事

⑥



2工区土岐③：舗装工・仮設工
工 期：令和元年06月28日～令和3年1月13日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市土岐町～恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区垂炭坑充填工事

⑦



充填工、確認工
工 期：令和元年07月27日～令和2年07月22日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事

⑧



東町横断歩道橋(全工程完了)
工 期：令和元年08月07日～令和2年05月01日
施工業者：ウノインフラプランテック(株)
施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事

⑨



完了
工 期：平成31年08月27日～令和元年07月31日
施工業者：(株) 吉川工務店
施工箇所：中津川市中津川地先

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事

⑩



CCTV設備更新
工 期：令和元年11月25日～令和2年09月30日
施工業者：大藤電設(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号整備工事

⑪



可児工区(1) 土工、給水管、附帯施設
工 期：令和2年01月10日～令和3年01月29日
施工業者：(株) 中島工務店
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区垂炭坑充填工事

⑫



片付け
工 期：令和2年03月10日～令和3年01月29日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事

⑬



山口工区 完了

工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事

⑭



次月工区 区画線工・授乳室新設工・横断歩道橋手摺増設工
工 期：令和02年03月23日～令和03年03月22日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：多治見市地内、土岐市地内

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事

⑮



中津川工区 千旦林横断歩道橋塗装工

工 期：令和02年03月31日～令和03年02月26日
施工業者：中部塗装(株)
施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内

令和元年度多治見国道21号中畑地区垂炭坑充填工事

⑯



完了

工 期：令和2年04月07日～令和3年2月26日
施工業者：小池土木(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事

⑰



排水構造物工、緑石工、舗装工

工 期：令和02年04月13日～令和03年03月29日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：瑞浪市～恵那市

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事

⑱



地山補強土工

工 期：令和02年04月20日～令和03年02月18日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：中津川市地内

令和元年度多治見管内改築舗装工事

⑲



防護柵工、舗装工、区画線工

工 期：令和02年05月07日～令和03年02月26日
施工業者：(株)NIPPO
施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

⑳



函渠工、排水構造物工、仮設工、立坑工

工 期：令和02年05月11日～令和03年02月26日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

㉑



中津川1工区 擁壁工(地山補強土工)

工 期：令和02年07月01日～令和03年02月26日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

㉒



橋脚工、道路土工

工 期：令和2年09月03日～令和3年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

㉓



切廻し道路、排水構造物工

工 期：令和02年09月04日～令和03年11月30日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道道路照明設備工事

㉔



道路照明設備工

工 期：令和02年08月17日～令和03年02月26日
施工業者：(株)関電工事
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道通信設備工事

㉕



準備工、機器製作

工 期：令和02年08月24日～令和03年03月26日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

㉖



放流工、仮設工

工 期：令和02年10月23日～令和04年02月25日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道西部除雪作業

㉗



凍結防止工

工 期：令和2年09月15日～令和03年03月31日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道東部除雪作業

28



凍結防止工

工 期：令和2年09月29日～令和03年03月31日

施工業者：（株）吉川工務店

施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

29



橋脚巻き立て工 足場、鉄筋工

工 期：令和2年10月14日～令和3年07月30日

施工業者：（株）吉川工務店

施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

令和2年度多治見国道整備工事

30



仮設工、基部補修工、現場塗装工

工 期：令和2年10月17日～令和3年12月15日

施工業者：板垣建設(株)

施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

1



19号(上) 44.4kp～43.8kp 舗装修繕工

工 期：平成31年04月01日～令和2年10月30日

施工業者：日本ハイウェイ・サービス（株）

施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp

R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

令和2年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事工事

31

準備工

工 期：令和3年3月29日～令和4年2月17日

施工業者：徳倉建設（株）

施工箇所：可児郡御嵩町地先
