





## 令和3年2月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (落合川流域)	進捗率	② (中津川出張所管内)	進捗率	③ (落合川流域)	進捗率	④ (中津川流域)	進捗率
工事名: 令和元年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事	予定	工事名: 令和元年度 中津川出張所管内整備工事	予定	工事名: 令和元年度 木曾川水系 日陰第2砂防堰堤改築工事	予定	工事名: 令和2年度 木曾川水系 中津川第2護岸整備工事	予定
契約工期: 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月30日	実施 92.7%	契約工期: 令和2年3月28日 ~ 令和3年3月31日	実施 98.6%	契約工期: 令和2年4月7日 ~ 令和3年3月30日	実施 92.2%	契約工期: 令和2年5月7日 ~ 令和3年3月30日	実施 94.5%
請負業者名: (株)鳴海組	差	請負業者名: (株)加藤工務店	差	請負業者名: (株)中島工務店	差	請負業者名: (株)加藤工務店	差
							
今月作業: コンクリート堰堤工		今月作業: 中津川第2(堰堤崩落箇所整備その2、土捨場整備)		今月作業: かご工、根固めブロック工等		今月作業: 流路護岸工、張コンクリート工	
来月予定: コンクリート堰堤工、舗装工、後片付け、完成検査(R3.3.30)		来月予定: 中津川第2堰堤崩落箇所整備その2、完成検査(R3.3.30)		来月予定: 残土処理工、工事用道路工、法面工、後片付け、完成検査(R3.3.23)		来月予定: 流路護岸工、張コンクリート工、残土処理工、後片付け、完成検査(R3.3.23)	
⑤ (中津川流域)	進捗率	⑥ (本川筋)	進捗率	⑦ (落合川流域)	進捗率	⑧	進捗率
工事名: 令和2年度 木曾川水系 川上流路工宮前橋工事	予定	工事名: 令和2年度 木曾川水系 アクラ沢工事用道路工事	予定	工事名: 令和2年度 木曾川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事	予定	工事名: 令和2年度 御嶽山CCTV設備工事	予定
契約工期: 令和2年8月18日 ~ 令和3年6月30日	実施 68.9%	契約工期: 令和2年9月29日 ~ 令和3年7月30日	実施 30.4%	契約工期: 令和2年12月7日 ~ 令和3年4月28日 変更予定工期: 令和3年8月31日	実施 11.1%	契約工期: 令和2年10月1日 ~ 令和3年3月26日	実施
請負業者名: (株)中島工務店	差	請負業者名: (株)中島工務店	差	請負業者名: (株)鳴海組	差	請負業者名: 大藤電設(株)	差
						令和3年度 出張あおぞら教室  中津川市内小学校に文書送付  16校より申し込み 現在スケジュールを調整中	
今月作業: 床固め工、橋梁付属物工、流路護岸工等		今月作業: 道路土工、排水構造物工等		今月作業: ガードレール基礎工、排水構造物工、道路土工		今月作業:	
来月予定: 床固め工、舗装工等、完済部分検査(R3.3.22)、宮前橋開通式(R3.3.25)		来月予定: 排水構造物工、法面工等		来月予定: 舗装工、仮設工、掘削工		来月予定:	



# 令和3年2月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名： 令和元年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和2年3月31日 ~ 令和3年3月15日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 98.2 %</p>	<p>②</p> <p>工事名： 令和2年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期： 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 126.2 %</p>
	 <p>寺下護岸</p> <p>市之倉里山林道(完成)</p>
<p>《今月作業》 道路土工、舗装工、準備工 3/29完成検査</p> <p>《4月作業》 ---</p>	<p>《今月作業》 寺下護岸 3/29完成検査</p> <p>《4月作業》 ---</p>
<p>③</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事</p> <p>工期： 令和2年5月1日 ~ 令和3年2月19日</p> <p>施工業者： (株)吉川組</p> <p>進捗率： 実施 100 %</p>	<p>④</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和3年3月3日 ~ 令和3年9月30日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 --- %</p>
	<p>準備中</p>
<p>《今月作業》 工事完成 3/4完成検査</p> <p>《4月作業》 ---</p>	<p>《今月作業》 施工計画書作成</p> <p>《4月作業》 準備工・起工測量</p>



## 令和3年 2月末 上松出張所 工事進捗状況

①	令和元年度 木曾川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)	進捗率(予定工程)	%	99.8	②	令和元年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	進捗率(予定工程)	%	100.0	③	令和元年度 木曾川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	進捗率(予定工程)	%	100.0	④	令和元年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稻建設(株)	進捗率(予定工程)	%	80.4	
	R1. 8.27~R3.3.19		R1. 8.27~R2.10.30			R1. 8.27~R2.5.29		R1. 9.12~R3.3.30			週休2日									
																				
今月作業	砂防土工(堆積土石撤去)				-					-						仮設工、路体盛土工				
来月予定	後片付け 3月18日完成検査				-					-						後片付け 3月26日完成検査				
⑤	令和元年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)	進捗率(予定工程)	%	100.0	⑥	令和元年度 木曾川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株)	進捗率(予定工程)	%	100.0	⑦	令和元年度 木曾川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	進捗率(予定工程)	%	100.0	⑧	令和元年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組	進捗率(予定工程)	%	100.0	
	R2. 3. 2~R2.9.30		R2. 3. 2~R3.2.26			R2. 3. 2~R3.3.19		R2. 3. 16~R3.2.26			ICT・週休2日									
																				
今月作業	-				側壁工 ブロック積擁壁工 仮設工(仮排水排水撤去等)					2月26日完成検査					2月25日完成検査					
来月予定	-				3月9日完成検査					-					-					




## 令和3年 2月末 上松出張所 工事進捗状況

	令和元年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曾土建工業(株)	令和元年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	令和2年度 木曾川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)
	進捗率(予定工程) % 99.8 R2. 3.31~R3.3.19 週休2日	進捗率(予定工程) % 104.6 R2. 4. 1~R3.3.31	進捗率(予定工程) % 99.4 R2. 4. 17~R3.3.19 週休2日	進捗率(予定工程) % 100.0 R2. 4. 22~R3.2.12 週休2日
				
今月作業	仮設工、準備工(片付け)	越百川道路整備	構造物撤去工	-
来月予定	後片付け 3月12日完成検査	越百川道路整備 3月26日完成検査	仮設工・作業土工・片付け工 3月18日完成検査	-
	令和2年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)	令和2年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	令和2年度 木曾川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曾土建工業(株)	令和2年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)
	進捗率(予定工程) % 100.0 R2. 9. 28~R3.2.26 ICT	進捗率(予定工程) % 25.4 R2.11.30~R3. 7.30 週休2日	進捗率(予定工程) % 2.8 R3. 2. 8~R3. 7.30 週休2日	進捗率(予定工程) % 0.0 R3. 3.29~R3. 7.30
				写真無し
今月作業	2月5日完成検査	2号床固め工	準備工、仮設工	
来月予定	-	2号床固め工・側壁工・水叩工	仮設工、砂防土工、コンクリート堰堤工	




令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事




①

19号(下) 38.46kp~38.73kp 舗装修繕工  
 工期: 令和2年10月30日~令和5年10月31日  
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)  
 施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp  
 R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

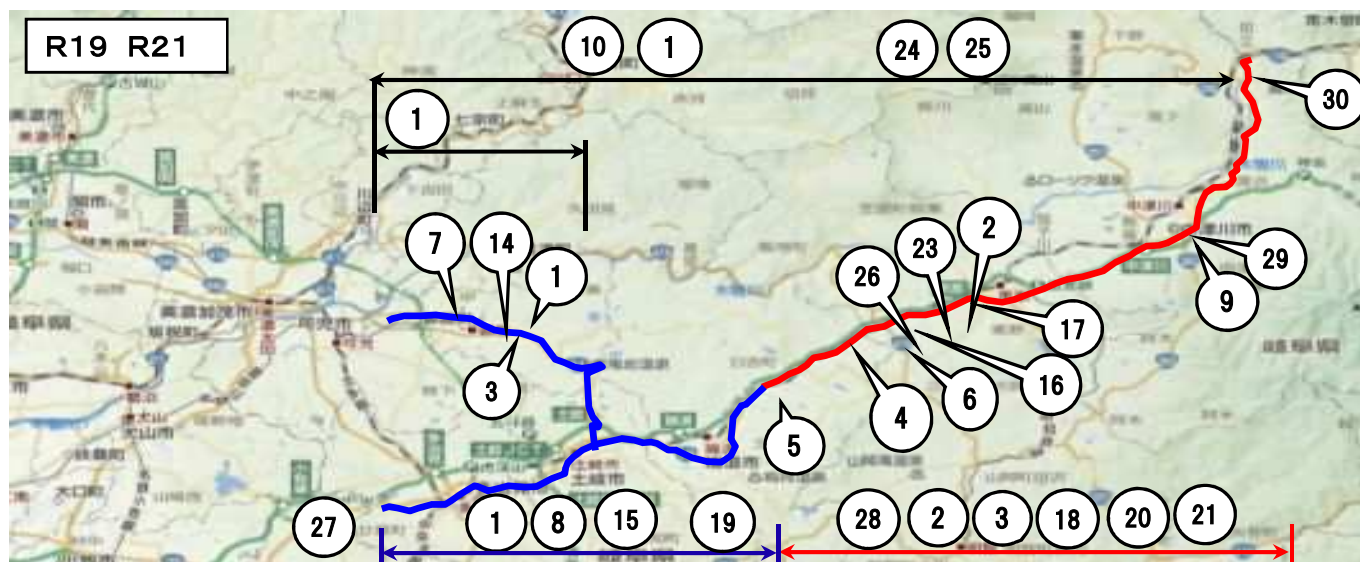


令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事



②

19号79.900kp(下) 緑地管理工 道路除草工  
 工期: 令和02年04月01日~令和04年09月30日  
 施工業者: (有)木曾ハイウエーサービス  
 施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp

平成30年度多治見国道橋梁補修工事



③

駒場跨道橋(完成)  
 工期: 平成31年03月09日~令和2年08月31日  
 施工業者: (株)中島工務店  
 施工箇所: 恵那市~中津川市

平成30年度瑞浪恵那道路釜戸地区下部工事



④

完了  
 工期: 平成31年04月05日~令和3年2月5日  
 施工業者: (株)中島工務店  
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

平成31年度瑞浪恵那道路土岐地区下部工事



⑤

仮設工、準備工  
 工期: 令和元年06月28日~令和02年11月30日  
 施工業者: (株)加藤工務店  
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先


平成31年度瑞浪恵那道路整備工事



⑥

2工区土岐③: 舗装工・仮設工  
 工期: 令和元年06月28日~令和03年1月13日  
 施工業者: セントラル建設(株)  
 施工箇所: 瑞浪市土岐町~恵那市武並町地先

令和元年度多治見国道21号大庭地区垂炭坑充填工事



⑦

充填工、確認工  
 工期: 令和元年07月27日~令和02年07月22日  
 施工業者: 飛鳥建設(株)  
 施工箇所: 岐阜県可児郡御嵩町地内

令和元年度多治見国道横断歩道橋塗装工事



⑧

東町横断歩道橋(全工程完了)  
 工期: 令和元年08月07日~令和02年05月01日  
 施工業者: ウノインフラプランテック(株)  
 施工箇所: 瑞浪国道維持出張所管内

令和元年度多治見国道四ツ目川橋左岸耐震補強工事



⑨

完了  
 工期: 平成31年08月27日~令和元年07月31日  
 施工業者: (株)吉川工務店  
 施工箇所: 中津川市中津川地先

令和元年度多治見国道管内CCTV設備工事



⑩

CCTV設備更新  
 工期: 令和元年11月25日~令和02年09月30日  
 施工業者: 大藤電設(株)  
 施工箇所: 多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号整備工事



⑪

可児工区(1) 土工、給水管、附帯施設  
 工期: 令和2年01月10日~令和03年01月29日  
 施工業者: (株)中島工務店  
 施工箇所: 多治見砂防国道事務所管内

令和元年度多治見国道21号御岳地区垂炭坑充填工事



⑫

片付け  
 工期: 令和2年03月10日~令和3年01月29日  
 施工業者: 徳倉建設(株)  
 施工箇所: 可児郡御嵩町地先



令和元年度多治見国道管内橋梁補修工事



山口工区 完了

工 期：令和2年03月18日～令和3年02月26日  
 施工業者：(株)梅田組  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

完


令和元年度多治見国道多治見土岐地区整備工事



次月工区 授乳室新設工・横断歩道橋手摺増設工

工 期：令和2年03月23日～令和3年03月22日  
 施工業者：(株)吉川組  
 施工箇所：多治見市地内、土岐市地内

令和元年度多治見国道東部横断歩道橋塗装工事



中津川工区 千旦林横断歩道橋塗装工

工 期：令和2年03月31日～令和3年03月12日  
 施工業者：中部塗装(株)  
 施工箇所：岐阜県恵那市～中津川市地内

完

令和元年度多治見国道21号中畑地区亜炭坑充填工事



完了

工 期：令和2年04月07日～令和3年2月26日  
 施工業者：小池土木(株)  
 施工箇所：可児郡御嵩町地先

完

令和元年度多治見国道瑞浪地区整備工事



縁石工、舗装工、道路付属施設工

工 期：令和2年04月13日～令和3年03月29日  
 施工業者：恵中建設(株)  
 施工箇所：瑞浪市～恵那市

令和元年度多治見国道中津川地区整備工事



擁壁工

工 期：令和2年04月20日～令和3年03月30日  
 施工業者：(株)吉川工務店  
 施工箇所：中津川市地内

令和元年度多治見管内改築舗装工事



舗装工、防護柵工、道路付属施設工

工 期：令和2年05月07日～令和3年03月12日  
 施工業者：(株)NIPPO  
 施工箇所：岐阜県可児郡御嵩町地内

完

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事



仮設工、立坑工、推進工

工 期：令和2年05月11日～令和3年07月2日  
 施工業者：(株)吉川工務店  
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事



津川1工区 擁壁工(地山補強土工)、ホーリング調工

工 期：令和2年07月01日～令和3年03月30日  
 施工業者：セントラル建設(株)  
 施工箇所：瑞浪市～中津川市地先


令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事



RC橋脚工

工 期：令和2年09月03日～令和3年11月30日  
 施工業者：(株)中島工務店  
 施工箇所：瑞浪市土岐町地先


令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事



道路改良工、伐採工、4号横断渠渠固結工

工 期：令和2年09月04日～令和3年11月30日  
 施工業者：板垣建設(株)  
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道道路照明設備工事



道路照明設備工

工 期：令和2年08月17日～令和3年02月26日  
 施工業者：(株)関電工事  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

完


令和2年度多治見国道通信設備工事



通信設備工

工 期：令和2年08月24日～令和3年03月26日  
 施工業者：松栄電子工業(株)  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事



放流工、仮設工

工 期：令和2年10月23日～令和4年02月25日  
 施工業者：(株)加藤工務店  
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道西部除雪作業



凍結防止工

工 期：令和2年09月15日～令和3年03月31日  
 施工業者：(株)吉川組  
 施工箇所：多治見砂防国道事務所管内



令和2年度多治見国道東部除雪作業

28



凍結防止工

工 期：令和2年09月29日～令和3年03月31日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

29



橋脚巻き立て工 足場、鉄筋工

工 期：令和2年10月14日～令和3年07月30日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

令和2年度多治見国道整備工事

30



仮設工、基部補修工、現場塗装工

工 期：令和2年10月17日～令和3年12月15日  
施工業者：板垣建設(株)  
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

平成31年度 多治見国道西部維持修繕工事

1



19号(上) 44.4kp～45.0kp 舗装修繕工  
工 期：平成31年04月01日～令和2年10月30日  
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株) **完**  
施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp  
R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

令和2年度 多治見国道橋梁補修工事

31

準備工

準備工

工 期：令和3年3月22日～令和3年12月28日  
施工業者：(株)梅田組  
施工箇所：可児郡御嵩町地先
