

令和3年3月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進捗率		②（中津川出張所管内）		進捗率		③（落合川流域）		進捗率		④（中津川流域）		進捗率	
工事名：令和元年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定		工事名：令和元年度 中津川出張所管内整備工事		予定		工事名：令和元年度 木曽川水系 日陰第2砂防堰堤改築工事		予定		工事名：令和2年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事		予定	
契約工期： 令和2年4月1日 ～ 令和3年3月30日		実施	100.0%	契約工期： 令和2年3月28日 ～ 令和3年3月31日		実施	100.0%	契約工期： 令和2年4月7日 ～ 令和3年3月30日		実施	100.0%	契約工期： 令和2年5月7日 ～ 令和3年3月30日		実施	100.0%
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差	
		完了				完了				完了				完了	
今月作業：コンクリート堰堤工、舗装工、後片付け、完成検査(R3.3.30)				今月作業：中津川第2堰堤崩落箇所整備その2、完成検査(R3.3.30)				今月作業：残土処理工、工事用道路工、法面工、後片付け、完成検査(R3.3.23)				今月作業：流路護岸工、張コンクリート工、残土処理工、後片付け、完成検査(R3.3.23)			
来月予定：－				来月予定：－				来月予定：－				来月予定：－			
⑤（中津川流域）		進捗率		⑥（本川筋）		進捗率		⑦（落合川流域）		進捗率		⑧		進捗率	
工事名：令和2年度 木曽川水系 川上流路工宮前橋工事		予定		工事名：令和2年度 木曽川水系 アクラ沢工事用道路工事		予定		工事名：令和2年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定		工事名：		予定	
契約工期： 令和2年8月18日 ～ 令和3年6月30日		実施	80.1%	契約工期： 令和2年9月29日 ～ 令和3年7月30日		実施	42.3%	契約工期： 令和2年12月7日 ～ 令和3年8月31日		実施	21.8%	契約工期： 令和3年4月6日		実施	
請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：道の駅 賤母		差	
		※令和3年3月22日 完済検査 ※令和3年3月25日 開通式													
今月作業：床固め工、舗装工等、完済部分検査(R3.3.22)、宮前橋開通式(R3.3.25)				今月作業：排水構造物工、法面工等				今月作業：舗装工、仮設工、掘削工				今月作業：			
来月予定：床固め工等				来月予定：排水構造物工、擁壁工等				来月予定：掘削工、法面工				来月予定：			

令和3年3月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工事名：令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事 工期：令和3年3月3日 ～ 令和3年9月30日 施工業者：(株)藤本組 進捗率：実施 0.0%	② 工事名：令和3年度 妻木出張所整備工事 工期：令和3年4月1日 ～ 令和3年11月30日 施工業者：(株)藤本組 進捗率：実施 0.0%
笠原地区  砦山地区 	準備中
《今月作業》【笠原地区】準備工 【砦山地区】準備工、仮設工 《5月作業》【笠原地区】準備工 【砦山地区】コンクリート堰堤工	《今月作業》準備工、施工計画 《5月作業》
③ 工事名：令和2年度 庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事 工期：令和3年4月5日 ～ 令和4年1月31日 施工業者：(株)吉川組 進捗率：実施 0.0%	④ 工事名：0 工期：0 施工業者：0 進捗率：実施 0.0%
準備中	
《今月作業》準備工、施工計画 《5月作業》	《今月作業》 《5月作業》

令和3年 3月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和元年度 木曽川水系 越百川第3砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)			②	令和元年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)			③	令和元年度 木曽川水系 額付第1砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			④	令和元年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)						
		進捗率(予定工程)		%		100.0	進捗率(予定工程)			%	100.0	進捗率(予定工程)		%	100.0	進捗率(予定工程)		%	100.0	
		R1. 8.27～R3.3.19					R1. 8.27～R2.10.30					R1. 8.27～R2.5.29				R1. 9.12～R3.3.30			週休2日	
																				
今月 作業	3月18日完成検査				-				-				3月26日完成検査							
来月 予定	-								-				-							

	⑤	令和元年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑥	令和元年度 木曽川水系 下洞沢砂防堰堤工事 施工業者 松本土建(株)			⑦	令和元年度 木曽川水系 額付砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑧	令和元年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 (株)宮坂組						
		進捗率(予定工程)		%		100.0	進捗率(予定工程)			%	100.0	進捗率(予定工程)		%	100.0	進捗率(予定工程)		%	100.0	
		R2. 3. 2～R2.9.30				ICT	R2. 3. 2～R3.2.26				ICT・週休2日	R2. 3. 2～R3.3.19			週休2日	R2. 3. 16～R3.2.26			ICT	
																				
今月 作業	-				3月9日完成検査				-				-							
来月 予定	-				-				-				-							

令和3年 3月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨	令和元年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑩	令和2年度 上松出張所整備工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑪	令和元年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			⑫	令和2年度 木曽川水系 上松管内砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)									
		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	100.0							
		R2. 3.31～R3.3.19	週休2日			R2. 4. 1～R3.3.31				R2. 4. 17～R3.7.10	週休2日			R2. 4. 22～R3.2.12	週休2日								
																							
今月作業	3月12日完成検査				3月26日完成検査				3月18日完成検査				—										
来月予定	—				—				—				—										

	⑬	令和2年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑭	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)			⑮	令和2年度 木曽川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑯	令和2年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)									
		進捗率(予定工程)	%	100.0		進捗率(予定工程)	%	33.0		進捗率(予定工程)	%	9.3		進捗率(予定工程)	%	0.0							
		R2. 9. 28～R3.2.26	ICT			R2.11.30～R3. 7.30	週休2日			R3. 2. 8～R3. 7.30	週休2日			R3. 3.29～R3. 7.30									
																				写真無し			
今月作業	—				2号床固工、2号側壁工、2号水叩工				仮設工、砂防土工、コンクリート堰堤工				—										
来月予定	—				2号側壁工、3号垂直壁工、3号側壁工				砂防土工、コンクリート堰堤工、流路護岸工				施工計画書										

令和3年 3月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑰	令和2年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事			⑱	令和2年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事			⑲	令和3年度 上松出張所整備工事			⑳	令和2年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事					
		施工業者		大宗土建(株)		施工業者		大宗土建(株)		施工業者		大宗土建(株)		施工業者		神稲建設(株)			
		進捗率(予定工程)		%		0.0		進捗率(予定工程)		%	0.0			進捗率(予定工程)		%	0.0		
		R3. 4. 1～R3. 7.30				R3. 4. 1～R4. 1.31				R3. 4. 1～R3.11.30				R3. 4.28～R4. 1.31					
		写真無し				写真無し				写真無し				写真無し					
今月作業		—				—				—				—					
来月予定		施工計画書				施工計画書				施工計画書				-					


今月作業																
来月予定																

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(下) 51.30kp~51.70kp 道路除草工
工 期：令和2年10月30日~令和5年10月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

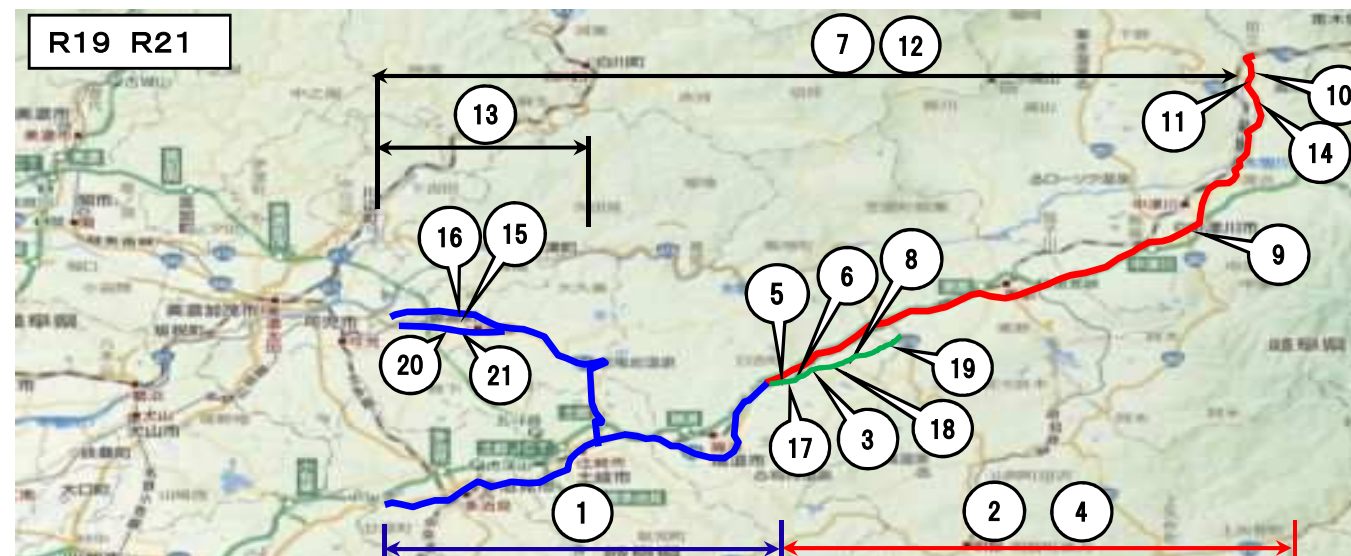

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号56.750kp(上) 緑地管理工(防草シート)
工 期：令和02年04月01日~令和04年10月31日
施工業者：(有)木曾ハイウエーサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

③



立坑工
工 期：令和02年05月11日~令和03年07月2日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

④



中津川2工区 舗装工・水道配管工
工 期：令和02年07月01日~令和03年07月30日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市~中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

⑤



橋脚工、道路土工、流末縦排水工
工 期：令和2年09月03日~令和3年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑥



仮設工 4号横断函渠仮設進入路、排水構造物
工 期：令和02年09月04日~令和03年11月30日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事

⑦



非常警報設備工、道路情報表示設備工
工 期：令和02年08月24日~令和03年06月10日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑧



放流工、仮設工、準備工
工 期：令和02年10月23日~令和04年02月25日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

⑨



橋脚巻き立て工 足場、鉄筋工
工 期：令和2年10月14日~令和3年07月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

令和2年度多治見国道整備工事

⑩



現場塗装工
工 期：令和2年10月17日~令和3年12月15日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事

⑪



準備工
工 期：令和2年12月22日~令和03年09月10日
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道橋梁補修工事

⑫



準備工
工 期：令和3年03月22日~令和3年12月28日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道西部整備工事 ⑬  準備工 工 期：令和3年03月25日～令和3年12月28日 施工業者：(株)藤本組 施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内	令和2年度多治見国道中津川地区整備工事 ⑭  準備工 工 期：令和02年03月29日～令和03年12月28日 施工業者：(株)加藤工務店 施工箇所：岐阜県中津川市山口地先	令和2年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事 ⑮  準備工 工 期：令和02年03月29日～令和04年02月17日 施工業者：徳倉建設(株) 施工箇所：可児郡御嵩町地先	令和2年度多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事 ⑯  準備工 工 期：令和02年03月25日～令和04年02月25日 施工業者：飛鳥建設(株) 施工箇所：可児郡御嵩町地先	令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事 ⑰ 準備工 工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日 施工業者：(株)吉川工務店 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先
令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事 ⑱ 準備工 工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日 施工業者：(株)鳴海組 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先	令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事 ⑲ 準備工 工 期：令和03年05月11日～令和04年03月18日 施工業者：恵中建設(株) 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先	令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事 ⑳ 準備工 工 期：令和03年05月19日～令和04年02月10日 施工業者：(株)市川工務店 施工箇所：可児郡御嵩町地内	令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事 ㉑ 準備工 工 期：令和03年04月15日～令和04年02月10日 施工業者：大有建設(株) 施工箇所：可児郡御嵩町地内	
