

令和3年4月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（中津川流域）			進 捗 率			②（本川筋）			進 捗 率			③（落合川流域）			進 捗 率			④（中津川出張所管内）			進 捗 率		
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 川上流路工宮前橋工事			予定			工 事 名：令和2年度 木曽川水系 アクラ沢工事用道路工事			予定			工 事 名：令和2年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事			予定			工 事 名：令和3年度 中津川出張所整備工事			予定		
契 約 工 期：令和2年8月18日 ～ 令和3年6月30日			実施	85.8%		契 約 工 期：令和2年9月29日 ～ 令和3年7月30日			実施	52.0%		契 約 工 期：令和2年12月7日 ～ 令和3年8月31日			実施	36.7%		契 約 工 期：令和3年4月1日 ～ 令和3年11月30日			実施	0.9%	
変更予定工期：令和3年7月31日						変更予定工期：令和3年11月30日						変更予定工期：令和3年11月30日						変更予定工期：令和3年11月30日					
請負業者名：（株）中島工務店			差			請負業者名：（株）中島工務店			差			請負業者名：（株）鳴海組			差			請負業者名：（株）鳴海組			差		
																							
今月作業：床固め工等			今月作業：排水構造物工、擁壁工等			今月作業：掘削工、法面工			今月作業：本谷管理道路流出土砂撤去、倒木・立木枝処理等			今月作業：掘削工、法面工			今月作業：掘削工、法面工			今月作業：本谷管理道路流出土砂撤去、倒木・立木枝処理等			今月作業：掘削工、法面工		
来月予定：構造物撤去工(旧橋の取壊し)等			来月予定：排水構造物工、擁壁工、道路土工等			来月予定：コンクリートブロック工(大型ブロック積)			来月予定：コンクリートブロック工(大型ブロック積)			来月予定：コンクリートブロック工(大型ブロック積)			来月予定：コンクリートブロック工(大型ブロック積)			来月予定：本谷管理道路崩落箇所整備、砂防教室補助等			来月予定：コンクリートブロック工(大型ブロック積)		
⑤（落合川流域）			進 捗 率			⑥（落合川流域）			進 捗 率			⑦（中津川流域）			進 捗 率			⑧			進 捗 率		
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 薬師沢第1砂防堰堤工事			予定			工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事			予定			工 事 名：令和3年度 木曽川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事			予定			工 事 名：			予定		
契 約 工 期：令和3年4月12日 ～ 令和4年1月31日			実施			契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年1月31日			実施	0.0%		契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年3月25日			実施	0.1%		契 約 工 期：～			実施		
請負業者名：（株）吉川工務店			差			請負業者名：（株）鳴海組			差			請負業者名：（株）加藤工務店			差			請負業者名：			差		
準備工			工事着手前			準備工			準備工			準備工			準備工			準備工			準備工		
今月作業：準備工			今月作業：－			今月作業：準備工			今月作業：準備工			今月作業：準備工			今月作業：準備工			今月作業：			今月作業：		
来月予定：準備工、仮設工、コンクリート堰堤工			来月予定：準備工、仮設工			来月予定：準備工、仮設工			来月予定：準備工、仮設工			来月予定：準備工、仮設工			来月予定：準備工、仮設工			来月予定：			来月予定：		

令和3年4月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工 事 名：令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事 工 期：令和3年3月3日 ～ 令和3年9月30日 施工業者：(株)藤本組 進 捗 率：実施 0.0% 砦山地区  《今月作業》【笠原地区】準備工 【砦山地区】準備工、仮設工 《6月作業》【笠原地区】準備工 【砦山地区】コンクリート堰堤工	② 工 事 名：令和3年度 妻木出張所整備工事 工 期：令和3年4月1日 ～ 令和3年11月30日 施工業者：(株)藤本組 進 捗 率：実施 0.0% 準備中 《今月作業》準備工、指示1 水道川法面工 指示2市之倉里山林道ブロック積 《6月作業》指示2 市之倉里山林道 ブロック積
③ 工 事 名：令和2年度 庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事 工 期：令和3年4月5日 ～ 令和4年1月31日 施工業者：(株)吉川組 進 捗 率：実施 0.0% 準備工  《今月作業》準備工 立木伐採、仮設工 工事用道路 《6月作業》法面工 砂防土工	④ 工 事 名：0 工 期：0 施工業者：0 進 捗 率：実施 0.0% 《今月作業》 《6月作業》

令和3年 4月末 上松出張所 工事進捗状況


	①	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)			②	令和2年度 木曽川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曽土建工業(株)			③	令和2年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			④	令和2年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)		
		進捗率(予定工程)	%	39.2		進捗率(予定工程)	%	21.2		進捗率(予定工程)	%	0.1		進捗率(予定工程)	%	1.2
		R2.11.30～R3. 7.30		週休2日		R3. 2. 8～R3. 7.30		週休2日		R3. 3.29～R3. 7.30		週休2日		R3. 4. 1～R3. 7.30		週休2日
																
今月 作業		床固本体工(2号側壁工、3号垂直壁工)				砂防土工、コンクリート堰堤工、流路護岸工				準備工(書類作成等)				準備工		
来月 予定		床固本体工(3号側壁工、3号水叩工)				砂防土工、床固め工、流路護岸工				準備工(起工測量等) 仮設工				伐採工		
	⑤	令和2年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑥	令和3年度 上松出張所整備工事 施工業者 大宗土建(株)			⑦	令和2年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)			⑧			
		進捗率(予定工程)	%	0.2		進捗率(予定工程)	%	7.8		進捗率(予定工程)	%	0.0				
		R3. 4. 1～R4. 1.31		週休2日		R3. 4. 1～R3.11.30		週休2日		R3. 4.28～R4. 1.31		週休2日				
																
今月 作業		仮設工				・越百沢周辺整備 ・滑川周辺整備 ・伐採工				準備工						
来月 予定		仮設工				・伐採工				伐採工						

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(中) 34.10kp～33.50kp 道路除草工
工 期：令和2年10月30日～令和5年10月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp
R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

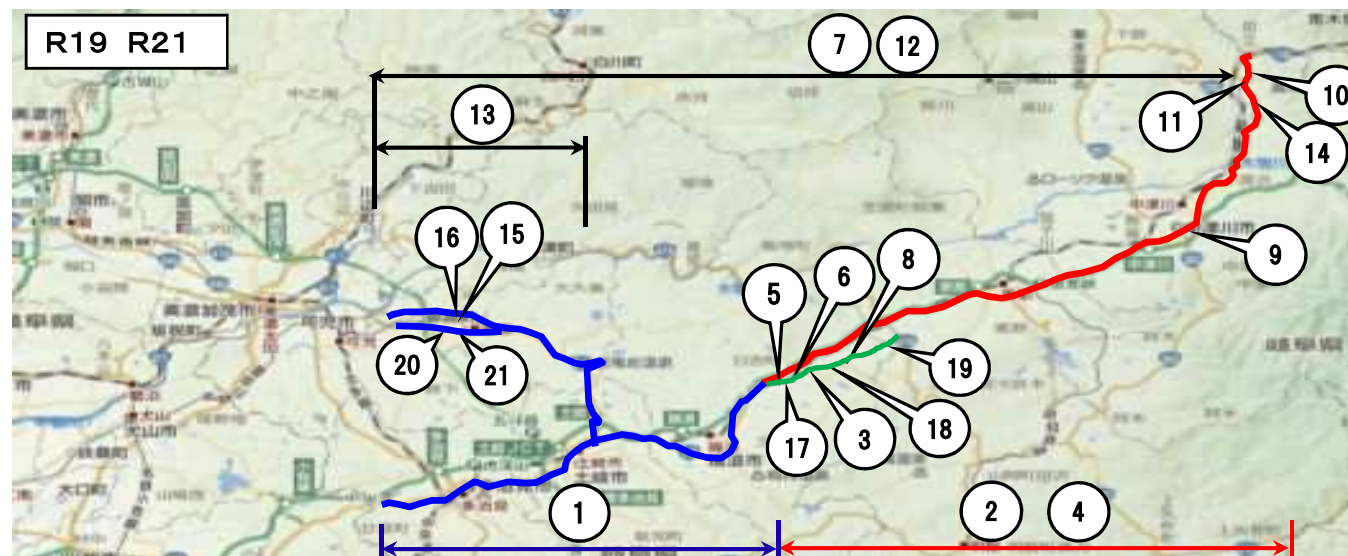

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号71.100kp(下) 緑地管理工(道路除草)
工 期：令和2年04月01日～令和4年10月31日
施工業者：(有)木曾ハイウエーサービス
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

③



立坑工
工 期：令和2年05月11日～令和3年07月2日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

④



中津川1工区 擁壁工
工 期：令和2年07月01日～令和3年07月30日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

⑤



橋脚工、橋台工、道路土工
工 期：令和2年09月03日～令和3年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑥



道路改良工、排水構造物、法面工
工 期：令和2年09月04日～令和3年11月30日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事

⑦



非常警報設備工、道路情報表示設備工
工 期：令和2年08月24日～令和3年06月10日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑧



2工区 仮設工、伐採工
工 期：令和2年10月23日～令和4年02月25日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事


⑨



石・ブロック積(張)工 石積み、ブロック張り
工 期：令和2年10月14日～令和3年07月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

令和2年度多治見国道整備工事

⑩

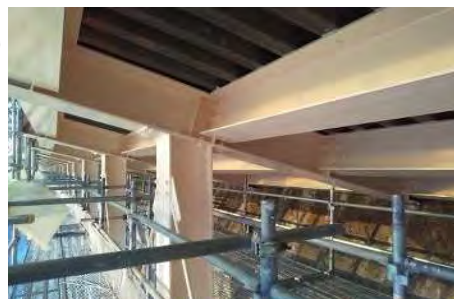

現場塗装工
工 期：令和2年10月17日～令和3年12月15日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事

⑪



準備工
工 期：令和2年12月22日～令和3年09月10日
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道橋梁補修工事

⑫



準備工
工 期：令和3年03月22日～令和3年12月28日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道西部整備工事 ⑬  準備工 工 期：令和3年03月25日～令和3年12月28日 施工業者：(株)藤本組 施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内	令和2年度多治見国道中津川地区整備工事 ⑭  準備工 工 期：令和02年03月29日～令和03年12月28日 施工業者：(株)加藤工務店 施工箇所：岐阜県中津川市山口地先	令和2年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事 ⑮  準備工 工 期：令和02年03月29日～令和04年02月17日 施工業者：徳倉建設(株) 施工箇所：可児郡御嵩町地先	令和2年度多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事 ⑯  準備工 工 期：令和02年03月25日～令和04年02月25日 施工業者：飛島建設(株) 施工箇所：可児郡御嵩町地先	令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事 ⑰ 準備工 工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日 施工業者：(株)吉川工務店 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先
令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事 ⑱ 準備工 工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日 施工業者：(株)鳴海組 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先	令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事 ⑲ 準備工 工 期：令和03年05月11日～令和04年03月18日 施工業者：恵中建設(株) 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先	令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事 ⑳ 準備工 工 期：令和03年05月19日～令和04年02月10日 施工業者：(株)市川工務店 施工箇所：可児郡御嵩町地内	令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事 ㉑ 準備工 工 期：令和03年04月15日～令和04年02月10日 施工業者：大有建設(株) 施工箇所：可児郡御嵩町地内	
