

令和3年5月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (中津川流域)	進捗率	② (本川筋)	進捗率	③ (落合川流域)	進捗率	④ (中津川出張所管内)	進捗率
工事名：令和2年度 木曾川水系 川上流路工宮前橋工事 契約工期：令和2年8月18日 ~ 令和3年6月30日 変更予定工期：令和3年8月13日 請負業者名：(株)中島工務店	予定 91.2% 実施 90.1% 差 -1.1%	工事名：令和2年度 木曾川水系 アラクラ沢工事用道路工事 契約工期：令和2年9月29日 ~ 令和3年7月30日 請負業者名：(株)中島工務店	予定 53.8% 実施 54.0% 差 0.2%	工事名：令和2年度 木曾川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年12月7日 ~ 令和3年11月30日 請負業者名：(株)鳴海組	予定 48.1% 実施 47.7% 差 -0.4%	工事名：令和3年度 中津川出張所整備工事 契約工期：令和3年4月1日 ~ 令和3年11月30日 請負業者名：(株)鳴海組	予定 3.9% 実施 3.9% 差 0.0%
							
今月作業：構造物撤去工(旧橋の取壊し)、流路護岸工(大型ブロック積)等 来月予定：流路護岸工(大型ブロック積)、排水構造物工等		今月作業：排水構造物工、擁壁工、道路土工等 来月予定：排水構造物工等		今月作業：コンクリートブロック工(大型ブロック積) 来月予定：ガードレール基礎工、排水構造物工、路体盛土工等		今月作業：本谷管理道路崩落箇所整備、砂防教室補助、本谷災害復旧作業等 来月予定：本谷管理道路崩落箇所整備、砂防教室補助、馬籠雨量観測所除草等	
⑤ (落合川流域)	進捗率	⑥ (落合川流域)	進捗率	⑦ (中津川流域)	進捗率	⑧	進捗率
工事名：令和2年度 木曾川水系 薬師沢第1砂防堰堤工事 契約工期：令和3年4月12日 ~ 令和4年1月31日 請負業者名：(株)吉川工務店	予定 14.1% 実施 14.1% 差 0.0%	工事名：令和2年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事 契約工期：令和3年4月20日 ~ 令和4年1月31日 請負業者名：(株)鳴海組	予定 3.1% 実施 3.1% 差 0.0%	工事名：令和3年度 木曾川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事 契約工期：令和3年4月20日 ~ 令和4年3月25日 請負業者名：(株)加藤工務店	予定 1.2% 実施 1.2% 差 0.0%	工事名： 契約工期： 請負業者名：	予定 実施 差
						<p>・5/21公告</p> <p>令和3年度木曾川水系川上流路工工事</p> <p>令和3年度木曾川水系中津川第2護岸整備工事</p> <p>・あおぞら教室実施状況(6/14現在)</p> <p>18校中16校終了 延べ参加人数 約570名(教員含む) 事務所からの応援に感謝します。</p>	
今月作業：準備工、仮設工、コンクリート堰堤本体工 来月予定：コンクリート堰堤本体工		今月作業：準備工 来月予定：準備工、仮設工		今月作業：仮設工、作業土工(床掘)、コンクリート堰堤本体工 来月予定：コンクリート堰堤本体工		今月作業： 来月予定：	

令和3年5月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和3年3月3日 ~ 令和3年9月30日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 予定 12.6% 実施 14.2% 差 1.6%</p>	<p>②</p> <p>工事名： 令和3年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期： 令和3年4月1日 ~ 令和3年11月30日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 予定 10.0% 実施 5.7% 差 -4.3%</p>
<p>砦山地区</p> 	<p>市之倉里山林道</p>  <p>水道川法面</p> 
<p>《今月作業》 【笠原地区】準備工 【砦山地区】コンクリート堰堤工</p> <p>《7月作業》 【笠原地区】準備工 【砦山地区】コンクリート堰堤工</p>	<p>《今月作業》 指示1 水道川法面 指示2 市之倉里山林道</p> <p>《7月作業》 指示2 市之倉里山林道</p>
<p>③</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事</p> <p>工期： 令和3年4月5日 ~ 令和4年1月31日</p> <p>施工業者： (株)吉川組</p> <p>進捗率： 予定 2.4% 実施 2.4% 差 0.0%</p>	<p>④</p> <p>工事名： 令和3年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和3年5月28日 ~ 令和4年3月25日</p> <p>施工業者： 小池土木(株)</p> <p>進捗率： 予定 0.0% 実施 0.0% 差 0.0%</p>
	<p>準備中</p>
<p>《今月作業》 法面工 砂防土工</p> <p>《7月作業》 砂防土工 コンクリート堰堤工</p>	<p>《今月作業》 施工計画 設計照査</p> <p>《7月作業》 市之倉工区: 伐採 工事用道路作成</p>

令和3年 5月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 令和2年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)		② 令和2年度 木曾川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曾土建工業(株)		③ 令和2年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)		④ 令和2年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	R2.11.30~R3. 7.30	48.8 (52.1)	R3. 2. 8~R3. 7.30	32.3 (37.5)	R3. 3.29~R3. 7.30	0.2(3.7)	R3. 4. 1~R3. 7.30	11.1(11.1)
	週休2日		週休2日		週休2日		週休2日	
								
今月作業	3号側壁工 3号水叩工 排水構造物工		砂防土工、床固め工、流路護岸工		準備工		伐採工	
来月予定	3号側壁工 流路護岸工(2号~3号) 排水構造物工		砂防土工、床固め工、流路護岸工		準備工・仮設工		伐採工	
	⑤ 令和2年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)		⑥ 令和3年度 上松出張所整備工事 施工業者 大宗土建(株)		⑦ 令和2年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)		⑧ 令和3年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 大宗土建(株)	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	R3. 4. 1~R4. 1.31	2.4(2.8)	R3. 4. 1~R3.11.30	54.1	R3. 4.28~R4. 1.31	0.5(0.8)	R3. 6. 10~R4. 3.25	0.0(0.0)
	週休2日		週休2日		週休2日			
							写真無し	
今月作業	仮設工		・伐採工 ・仮設工		準備工		-	
来月予定	仮設工、砂防土工(水叩土砂撤去)		・伐採工 ・舗装工		伐採工		-	


令和3年 5月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨ 令和3年度 木曾川水系 宮の沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			⑩ 施工業者			⑪ 施工業者			⑫ 施工業者		
	進捗率(予定工程)	%	0.0(0.0)	進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%	
	R3. 6.22~R4. 3.25											
	写真無し											
今月作業	-											
来月予定	-											
	⑬ 施工業者			⑭ 施工業者			⑮ 施工業者			⑯ 施工業者		
	進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%	
今月作業												
来月予定												

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事



①
19号(上) 41.90kp~40.80kp 道路除草工
工 期：令和2年10月30日~令和5年10月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

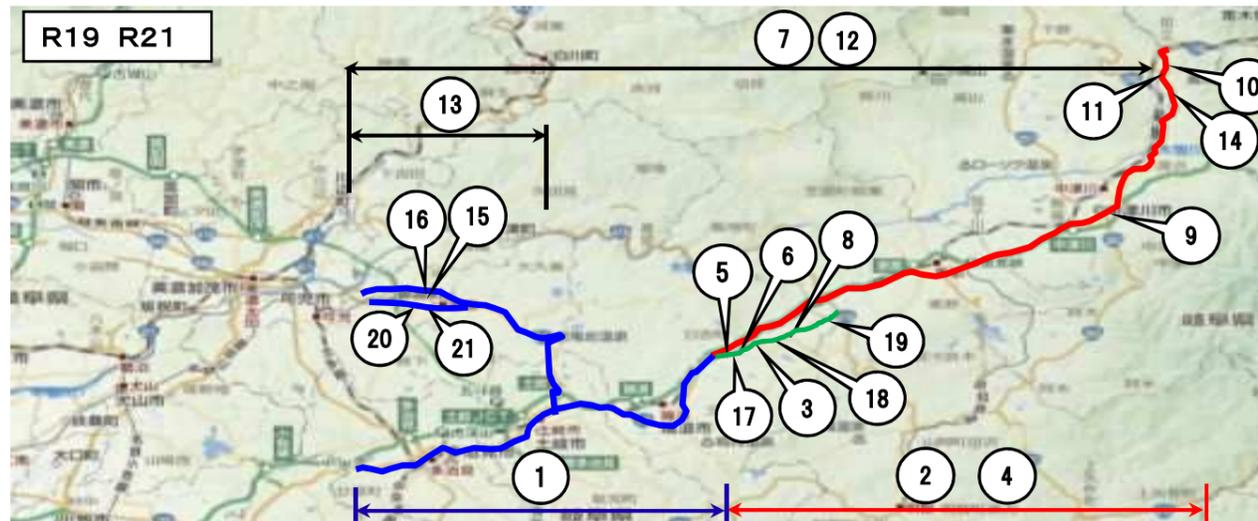

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事



②
19号82.750kp(下) 緑地管理工(道路除草)
工 期：令和02年04月01日~令和04年10月31日
施工業者：(有)木曾ハイウエーサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事



③
打ち切り
工 期：令和02年05月11日~令和03年07月2日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事



④
中津川1工区 擁壁工
工 期：令和02年07月01日~令和03年07月30日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市~中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事



⑤
A2橋台 土留・仮締切 工事用道路 路体盛上
工 期：令和2年09月03日~令和3年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事



⑥
道路改良工、排水構造物工、4号横断函渠工
工 期：令和02年09月04日~令和03年11月30日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事



⑦
非常警報設備工、道路情報表示設備工
工 期：令和02年08月24日~令和03年08月31日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事



⑧
(2工区)排水構造物工、仮設工、伐採工
工 期：令和02年10月23日~令和04年02月25日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事



⑨
仮設工、準備工
工 期：令和2年10月14日~令和3年07月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

令和2年度多治見国道整備工事



⑩
現場塗装工
工 期：令和2年10月17日~令和3年12月15日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事



⑪
準備工
工 期：令和2年12月22日~令和03年09月10日
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道橋梁補修工事



⑫
準備工・仮設工
工 期：令和3年03月22日~令和3年12月28日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道西部整備工事

⑬



擁壁工、落石防止工

工 期：令和3年03月25日～令和3年12月28日
施工業者：(株)藤本組
施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

⑭



準備工

工 期：令和02年03月29日～令和03年12月28日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道21号御嵩地区垂炭坑充填工事

⑮



準備工(休憩所ヤード設置、埋設探査)

工 期：令和02年03月29日～令和04年02月17日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度多治見国道21号中地区垂炭坑充填工事

⑯



準備工

工 期：令和02年03月25日～令和04年02月25日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事

⑰



準備工

工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事

⑱



準備工

工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日
施工業者：(株)鳴海組
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑲



準備工

工 期：令和03年05月11日～令和04年03月18日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：恵那市武並町地先

令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事

⑳



準備工

工 期：令和03年05月19日～令和04年02月10日
施工業者：(株)市川工務店
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事

㉑



準備工

工 期：令和03年04月15日～令和04年02月10日
施工業者：大有建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和3年度瑞浪恵那道路整備工事

㉒



準備工

工 期：令和03年05月28日～令和04年03月18日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～釜戸町地内

