






令和3年6月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (中津川流域)	進捗率	② (本川筋)	進捗率	③ (落合川流域)	進捗率	④ (中津川出張所管内)	進捗率																								
工事名：令和2年度 木曾川水系 川上流路工宮前橋工事 契約工期：令和2年8月18日 ~ 令和3年8月13日 請負業者名：(株)中島工務店	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>予定</td><td></td></tr> <tr><td>実施</td><td>95.0%</td></tr> <tr><td>差</td><td></td></tr> </table>	予定		実施	95.0%	差		工事名：令和2年度 木曾川水系 アラクラ沢工用道路工事 契約工期：令和2年9月29日 ~ 令和3年7月30日 請負業者名：(株)中島工務店	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>予定</td><td></td></tr> <tr><td>実施</td><td>95.8%</td></tr> <tr><td>差</td><td></td></tr> </table>	予定		実施	95.8%	差		工事名：令和2年度 木曾川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事 契約工期：令和2年12月7日 ~ 令和3年11月30日 請負業者名：(株)鳴海組	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>予定</td><td></td></tr> <tr><td>実施</td><td>55.3%</td></tr> <tr><td>差</td><td></td></tr> </table>	予定		実施	55.3%	差		工事名：令和3年度 中津川出張所整備工事 契約工期：令和3年4月1日 ~ 令和3年11月30日 請負業者名：(株)鳴海組	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>予定</td><td></td></tr> <tr><td>実施</td><td>11.1%</td></tr> <tr><td>差</td><td></td></tr> </table>	予定		実施	11.1%	差	
予定																															
実施	95.0%																														
差																															
予定																															
実施	95.8%																														
差																															
予定																															
実施	55.3%																														
差																															
予定																															
実施	11.1%																														
差																															
						 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;"> 本谷管理道路崩落箇所整備 工事名 令和3年度 中津川出張所整備工事 工種 大型ブロック積工 測点 本谷管理道路 大型ブロック据付状況 6段目 </div>																									
今月作業：流路護岸工(大型ブロック積)、排水構造物工等 来月予定：流路護岸工、根固め・水制工、後片付け等		今月作業：排水構造物工等 来月予定：舗装工、後片付け等		今月作業：ガードレール基礎工、排水構造物工、路体盛土等 来月予定：仮設工(砂防仮締切)、残土処理工等		今月作業：本谷管理道路崩落箇所整備、砂防教室補助、馬籠雨量観測所除草等 来月予定：本谷管理道路崩落箇所整備、川上前沢管理道路整備、川上残土処理場整備等																									
⑤ (落合川流域)	進捗率	⑥ (落合川流域)	進捗率	⑦ (中津川流域)	進捗率	⑧	進捗率																								
工事名：令和2年度 木曾川水系 薬師沢第1砂防堰堤工事 契約工期：令和3年4月12日 ~ 令和4年1月31日 請負業者名：(株)吉川工務店	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>予定</td><td></td></tr> <tr><td>実施</td><td>36.3%</td></tr> <tr><td>差</td><td></td></tr> </table>	予定		実施	36.3%	差		工事名：令和2年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事 契約工期：令和3年4月20日 ~ 令和4年1月31日 請負業者名：(株)鳴海組	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>予定</td><td></td></tr> <tr><td>実施</td><td>3.8%</td></tr> <tr><td>差</td><td></td></tr> </table>	予定		実施	3.8%	差		工事名：令和3年度 木曾川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事 契約工期：令和3年4月20日 ~ 令和4年3月25日 請負業者名：(株)加藤工務店	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>予定</td><td></td></tr> <tr><td>実施</td><td>8.7%</td></tr> <tr><td>差</td><td></td></tr> </table>	予定		実施	8.7%	差		工事名： 契約工期： ~ 請負業者名：	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>予定</td><td></td></tr> <tr><td>実施</td><td></td></tr> <tr><td>差</td><td></td></tr> </table>	予定		実施		差	
予定																															
実施	36.3%																														
差																															
予定																															
実施	3.8%																														
差																															
予定																															
実施	8.7%																														
差																															
予定																															
実施																															
差																															
																															
今月作業：コンクリート堰堤本体工 来月予定：コンクリート堰堤本体工、コンクリート副堰堤工等		今月作業：準備工、仮設工 来月予定：仮設工		今月作業：コンクリート堰堤本体工 来月予定：作業土工(右岸側掘削)等		今月作業： 来月予定：																									

令和3年6月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和3年3月3日 ～ 令和3年9月30日</p> <p>施工業者：(株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 48.1%</p>	<p>②</p> <p>工事名： 令和3年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期： 令和3年4月1日 ～ 令和3年11月30日</p> <p>施工業者：(株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 16.2%</p>
<p>砦山地区</p> 	<p>市之倉里山林道</p>  <p>水道川法面</p> 
<p>《今月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工</p> <p>《8月作業》【砦山地区】コンクリート堰堤工、鋼製堰堤工</p>	<p>《今月作業》指示2 市之倉里山林道 生田遊砂草刈り7</p> <p>《8月作業》おりべ堰堤 伐採</p>
<p>③</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事</p> <p>工期： 令和3年4月5日 ～ 令和4年1月31日</p> <p>施工業者：(株)吉川組</p> <p>進捗率： 実施 6.5%</p>	<p>④</p> <p>工事名： 令和3年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和3年5月28日 ～ 令和4年3月25日</p> <p>施工業者：小池土木(株)</p> <p>進捗率： 実施 3.2%</p>
	<p>鍛冶ヶ入地区</p>  <p>市之倉地区</p> 
<p>《今月作業》砂防土工 コンクリート堰堤工</p> <p>《8月作業》砂防土工 コンクリート堰堤工</p>	<p>《今月作業》鍛冶ヶ入地区：準備工 市之倉工区：伐採 工事用道路作成</p> <p>《8月作業》鍛冶ヶ入地区：準備工 市之倉工区：仮締切及び転流工</p>

令和3年 6月末 上松出張所 工事進捗状況

		①	②	③	④
		令和2年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	令和2年度 木曾川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曾土建工業(株)	令和2年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	令和2年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)
		進捗率(予定工程) % 64.2 R2.11.30~R3. 7.30 週休2日	進捗率(予定工程) % 41.5 R3. 2. 8~R3. 7.30 週休2日	進捗率(予定工程) % 0.6 R3. 3.29~R3. 7.30 週休2日	進捗率(予定工程) % 23.8 R3. 4. 1~R3. 7.30 週休2日
					
今月作業		3号側壁工 3号水叩工 2号から3号流路護岸工 4号垂直壁工	砂防土工、法面工、床固め工、流路護岸工	準備工・仮設工	伐採工
来月予定		4号垂直壁工 4号床固工	砂防土工、法面工、床固め工、流路護岸工	仮設工・構造物撤去工	伐採工
		⑤	⑥	⑦	⑧
		令和2年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	令和3年度 上松出張所整備工事 施工業者 大宗土建(株)	令和2年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)	令和3年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 大宗土建(株)
		進捗率(予定工程) % 4.4 R3. 4. 1~R4. 1.31 週休2日	進捗率(予定工程) % 106.3 R3. 4. 1~R3.11.30 週休2日	進捗率(予定工程) % 10.3 R3. 4.28~R4. 1.31 週休2日	進捗率(予定工程) % 1.7 R3. 6. 10~R4. 3.25 週休2日
					
今月作業		仮設工	応急処理工、舗装工、伐採工	伐採工	準備工
来月予定		構造物撤去工、仮設工	応急処理工、舗装工、伐採工	仮設工・道路土工	準備工 伐採工

令和3年 6月末 上松出張所 工事進捗状況


		令和3年度 木曾川水系 宮の沢砂防堰堤管理用道路工事			施工業者			施工業者			施工業者		
		進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%	
⑨		奥田工業(株)			0.6								
		R3. 6.22~R4. 3.25	週休2日										
													
今月 作業	準備工(施工計画の立案)												
来月 予定	準備工(起工測量、立木伐採)												
⑩													
今月 作業													
来月 予定													
⑪													
今月 作業													
来月 予定													
⑫													
今月 作業													
来月 予定													
⑬													
今月 作業													
来月 予定													
⑭													
今月 作業													
来月 予定													
⑮													
今月 作業													
来月 予定													
⑯													
今月 作業													
来月 予定													

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(中) 51.80kp~52.0kp 道路除草工
工 期：令和02年10月30日~令和05年10月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

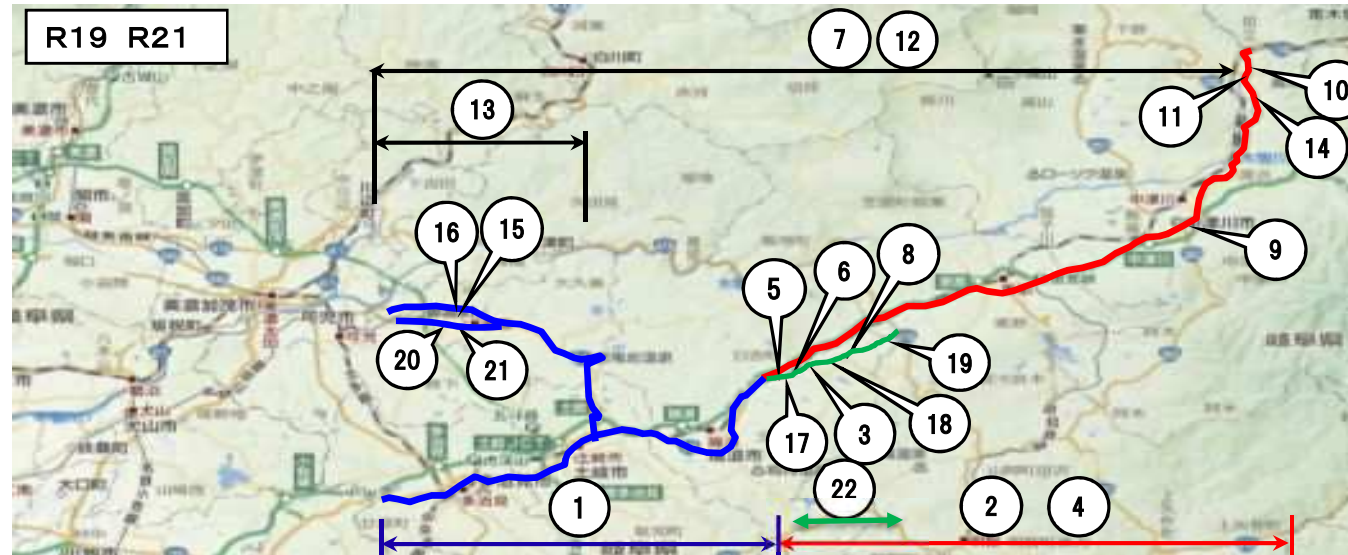

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号84.150kp(上)区画線工(実線・破線)
工 期：令和02年04月01日~令和04年10月31日
施工業者：(有)木曾ハイウエーサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

③



打ち切り
工 期：令和02年05月11日~令和03年07月2日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

完

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

④



中津川1工区 舗装工
工 期：令和02年07月01日~令和03年07月30日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市~中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

⑤



A2橋台 土留・仮締切 工事用道路 路体盛土
工 期：令和02年09月03日~令和03年11月30日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑥



道路改良工、排水構造物工、固結工、掘削(土砂運搬)
工 期：令和02年09月04日~令和03年11月30日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事

⑦



道路情報表示設備工
工 期：令和02年08月24日~令和03年08月31日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑧



1工区
(1工区)大型ブロック積工(2工区)道路土工
工 期：令和02年10月23日~令和04年02月25日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

⑨



準備工
工 期：令和02年10月14日~令和03年07月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

令和2年度多治見国道整備工事

⑩



構造物撤去工
工 期：令和02年10月17日~令和03年12月15日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事

⑪



センサ据付工、舗装工
工 期：令和02年12月22日~令和03年09月10日
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道橋梁補修工事

⑫



準備工・仮設工・橋梁支承工・橋梁補修工
工 期：令和03年03月22日~令和03年12月28日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道西部整備工事

⑬



擁壁工、落石防止工

工 期：令和3年03月25日～令和3年12月28日
施工業者：(株)藤本組
施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

⑭



準備工・補強地山土工

工 期：令和2年03月29日～令和3年12月28日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道21号御嵩地区垂炭坑充填工事

⑮



準備工(水道管試掘、削孔計画)

工 期：令和2年03月29日～令和4年02月17日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度多治見国道21号中地区垂炭坑充填工事

⑯



準備工(埋設探査、試掘、仮設備工)

工 期：令和2年03月25日～令和4年02月25日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事

⑰



準備工、仮設工、推進工、道路土工

工 期：令和3年05月10日～令和4年02月25日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事

⑱



準備工

工 期：令和3年05月10日～令和4年02月25日
施工業者：(株)鳴海組
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑲



準備工

工 期：令和3年05月11日～令和4年03月18日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：恵那市武並町地先

令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事

⑳



準備工(事前測量)

工 期：令和3年05月19日～令和4年02月10日
施工業者：(株)市川工務店
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事

㉑



準備工(測量、試掘)

工 期：令和3年04月15日～令和4年02月10日
施工業者：大有建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和3年度瑞浪恵那道路整備工事

㉒



準備工(書類作成)

工 期：令和3年05月28日～令和4年03月18日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～釜戸町地内

