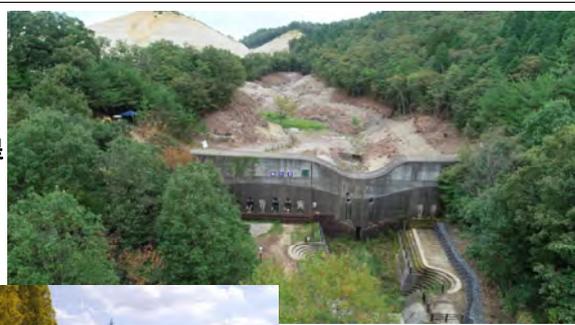


# 令和3年9月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (落合川流域)	進捗率	② (中津川出張所管内)	進捗率	③ (落合川流域)	進捗率	④ (落合川流域)	進捗率
工事名: 令和2年度 木曾川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事	予定	工事名: 令和3年度 中津川出張所整備工事	予定	工事名: 令和2年度 木曾川水系 薬師沢第1砂防堰堤工事	予定	工事名: 令和2年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事	予定
契約工期: 令和2年12月7日 ~ 令和3年12月28日	実施 83.6%	契約工期: 令和3年4月1日 ~ 令和3年11月30日	実施 40.1%	契約工期: 令和3年4月12日 ~ 令和4年1月31日	実施 65.1%	契約工期: 令和3年4月20日 ~ 令和4年3月30日	実施 7.5%
請負業者名: (株)鳴海組	差	請負業者名: (株)鳴海組	差	請負業者名: (株)吉川工務店	差	請負業者名: (株)鳴海組	差
							
今月作業: 構造物撤去工(既設堰堤取壊し)		今月作業: 本谷災害復旧作業、本谷谷止め工(ポーリング調査)等		今月作業: コンクリート副堰堤工		今月作業: 流出土砂撤去、仮設水路撤去、工事用道路補修等	
来月予定: 構造物撤去工(既設堰堤取壊し)		来月予定: 四ツ目川遊砂工整備その2、湯舟沢魚道整備等		来月予定: コンクリート副堰堤工		来月予定: 市道拡幅等	
⑤ (中津川流域)	進捗率	⑥ (中津川流域)	進捗率	⑦ (中津川流域)	進捗率	⑧ (本川筋)	進捗率
工事名: 令和3年度 木曾川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事	予定	工事名: 令和3年度 木曾川水系 中津川第2護岸整備工事	予定	工事名: 令和3年度 木曾川水系 川上流路工事	予定	工事名: 令和3年度 木曾川水系 アラクラ沢管理用道路工事	予定
契約工期: 令和3年4月20日 ~ 令和4年3月25日	実施 31.9%	契約工期: 令和3年8月18日 ~ 令和4年2月28日	実施 8.5%	契約工期: 令和2年9月1日 ~ 令和4年2月28日	実施 5.5%	契約工期: 令和2年9月14日 ~ 令和4年2月28日	実施 0.6%
請負業者名: (株)加藤工務店	差	請負業者名: (株)加藤工務店	差	請負業者名: (株)中島工務店	差	請負業者名: (株)中島工務店	差
							
今月作業: コンクリート堰堤本体工、仮設工(崩落斜面法面対策)		今月作業: 準備工、仮設工		今月作業: 災害復旧、準備工、仮設工等		今月作業: 書類作成、準備工等	
来月予定: コンクリート堰堤本体工、仮設工(崩落斜面法面対策)		来月予定: 流木処理、仮設工、流路護岸工(張りコンクリート、巨石採取)		来月予定: 仮設工、構造物撤去工(防護柵、旧宮前橋)等		来月予定: 地山補強土工等	

# 令和3年9月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和3年3月3日 ~ 令和4年1月6日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 74.3%</p>	<p>②</p> <p>工事名： 令和3年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期： 令和3年4月1日 ~ 令和3年11月30日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 61.5%</p>
<p>砦山地区</p> 	<p>オリベ堰堤</p>  <p>市之倉川整備</p> 
<p>《今月作業》 砂防土工(盛土工)、コンクリート堰堤工(垂直壁工)</p> <p>《11月作業》 砂防土工(盛土工)、コンクリート堰堤工(側壁工・水叩工)</p>	<p>《今月作業》 オリベ堰堤 擬木擁壁・擬木水路 浦山堰堤 伐採</p> <p>《11月作業》 浦山堰堤 伐採</p>
<p>③</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事</p> <p>工期： 令和3年4月5日 ~ 令和4年1月31日</p> <p>施工業者： (株)吉川組</p> <p>進捗率： 実施 39.4%</p>	<p>④</p> <p>工事名： 令和3年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和3年5月28日 ~ 令和4年3月25日</p> <p>施工業者： 小池土木(株)</p> <p>進捗率： 実施 8.1%</p>
	<p>市之倉地区</p> 
<p>《今月作業》 砂防土工 コンクリート堰堤工</p> <p>《11月作業》 砂防土工 コンクリート堰堤工</p>	<p>《今月作業》 砂防土工 構造物撤去工 コンクリート堰堤工</p> <p>《11月作業》 砂防土工 コンクリート堰堤工</p>

## 令和3年 9月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 令和2年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)		② 令和2年度 木曾川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曾土建工業(株)		③ 令和2年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)		④ 令和2年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	R2.11.30~R3.11.30	89.2	R3. 2. 8~R4. 3.22	63.5	R3. 3.29~R4. 3.22	47.5	R3. 4. 1~R4. 3.22	83.2
	週休2日		週休2日		週休2日		週休2日	
今月作業								
	4号床固工 4号水叩き工 4号側壁工		砂防土工、法面工、床固め工、流路護岸工		コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠・コンクリート打設)		掘削工・残土処理工	
来月予定	4号側壁工 5号垂直壁工 流路護岸工		砂防土工、法面工、流路護岸工、石・ブロック積(張)工		コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠・コンクリート打設) コンクリート副堰堤工(作業土工・差し筋・型枠・コンクリート打設)		掘削工・残土処理工	
	⑤ 令和2年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)		⑥ 令和3年度 上松出張所整備工事 施工業者 大宗土建(株)		⑦ 令和2年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)		⑧ 令和3年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 大宗土建(株)	
	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%	進捗率(予定工程)	%
	R3. 4. 1~R4. 3.22	32.9	R3. 4. 1~R3.11.30	129.1	R3. 4.28~R4. 1.31	31.9	R3. 6. 10~R4. 3.25	16.1
	週休2日		週休2日		週休2日		週休2日	
今月作業								
	構造物撤去工(コンクリート削孔・切断・取壊し) 仮設工(仮締切)		滑川(法面復旧)整備、和合蛇抜沢応急復旧		法面工・鉄筋挿入工・工用道路工		伐採工 土工 アンカー付山留式擁壁工	
来月予定	構造物撤去工(コンクリート削孔・切断・取壊し) 仮設工(仮締切)		和合蛇抜沢応急復旧		法面工・鉄筋挿入工・工用道路工		伐採工 土工 法面工 アンカー付山留式擁壁工	


## 令和3年 9月末 上松出張所 工事進捗状況

	令和3年度 木曾川水系 宮の沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			令和3年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土工建工業(株)			令和3年度 多治見電機通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)			⑫ 施工業者		
	⑨	進捗率(予定工程)	%	⑩	進捗率(予定工程)	%	⑪	進捗率(予定工程)	%	⑫	進捗率(予定工程)	%
		R3. 6.22~R4. 3.25	28.8		R3. 8. 2~R4. 2.28	26.6		R3. 9.27~R4. 2.28	0.3			
							<p style="font-size: 24px; font-weight: bold;">写真無し</p>					
今月 作業	準備工(立木伐採・運搬処分) 道路土工(掘削工)			掘削工及び土砂等運搬工			施工計画書読合わせ、現場調査					
来月 予定	道路土工(掘削工) 法面工(鉄筋挿入工)			掘削工及び土砂等運搬工			7局雨量観測所、3出張所及び保古山無線中継所現場調査及び設計照査、機器製作仕様書提出					
	⑬ 施工業者			⑭ 施工業者			⑮ 施工業者			⑯ 施工業者		
	進捗率(予定工程)	%	⑭	進捗率(予定工程)	%	⑮	進捗率(予定工程)	%	⑯	進捗率(予定工程)	%	
今月 作業												
来月 予定												


令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事



21号(下) 3.30kp~3.60kp 道路除草工  
工 期: 令和02年10月30日~令和05年10月31日  
施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)  
施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp  
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

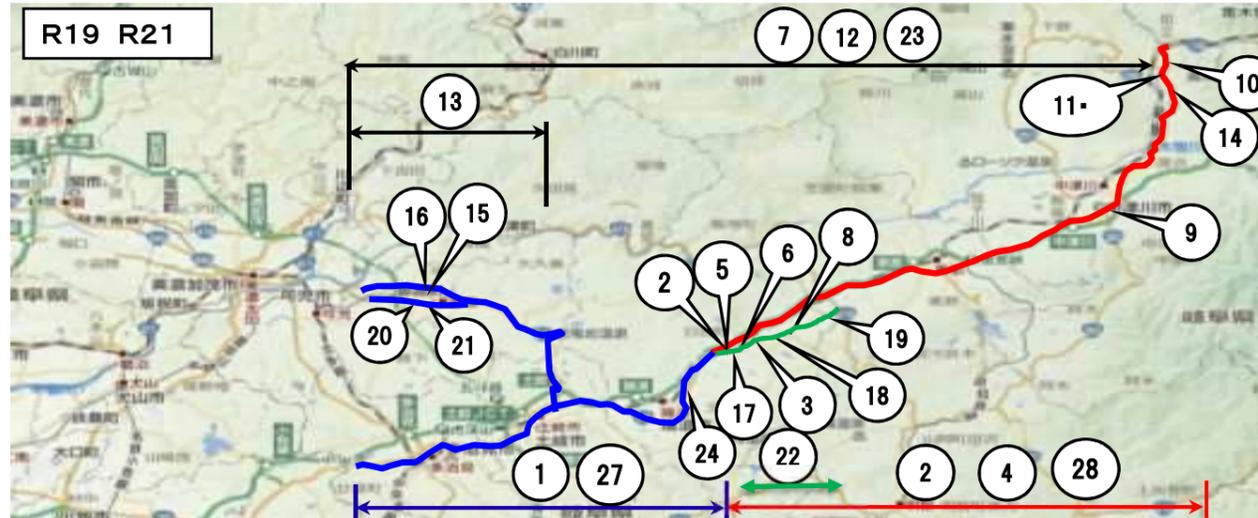

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

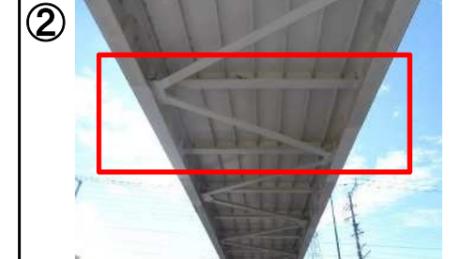

号74.400kp(下) 損傷復旧工(横断歩道橋損傷補修)  
工 期: 令和02年04月01日~令和04年10月31日  
施工業者: (有)木曾ハイウェイサービス  
施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事



工 期: 令和02年05月11日~令和03年07月2日  
施工業者: (株)吉川工務店  
施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先 **完**

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事



恵那工区 排水構造物工、緑石工  
工 期: 令和02年07月01日~令和03年12月28日  
施工業者: セントラル建設(株)  
施工箇所: 瑞浪市~中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事



A2橋台 躯体施工 工事用道路 路体盛土・セ  
工 期: 令和02年09月03日~令和03年11月30日  
施工業者: (株)中島工務店  
施工箇所: 瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事



路体盛土、4号横断函渠工、仮設進入路  
工 期: 令和02年09月04日~令和03年11月30日  
施工業者: 板垣建設(株)  
施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事



道路情報表示設備工  
工 期: 令和02年08月24日~令和03年08月31日  
施工業者: 松栄電子工業(株)  
施工箇所: 多治見砂防国道事務所管内 **完**

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事



(1工区)大型ブロック積工 (2工区)道路土工、カーポート工  
工 期: 令和02年10月23日~令和04年03月11日  
施工業者: (株)加藤工務店  
施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事



準備工  
工 期: 令和2年10月14日~令和03年07月30日  
施工業者: (株)吉川工務店  
施工箇所: 岐阜県中津川市中津川地先 **完**

令和2年度多治見国道整備工事



組立歩道工 防護柵工  
工 期: 令和02年10月17日~令和03年12月15日  
施工業者: 板垣建設(株)  
施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事



センサ据付工・半たわみ舗装工・試運転調整工  
工 期: 令和02年12月22日~令和03年09月10日  
施工業者: オムロンフィールドエンジニアリング株式会社  
施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先 **完**

令和2年度多治見国道橋梁補修工事



伏見跨線橋完了 大原橋・羽白橋 伸縮装置工  
工 期: 令和03年03月22日~令和04年3月2日  
施工業者: (株)梅田組  
施工箇所: 多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道西部整備工事

13



伐採工

工期：令和3年03月25日～令和4年3月29日  
施工業者：(株)藤本組  
施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

14



補強地山土工・土工

工期：令和2年03月29日～令和4年3月28日  
施工業者：(株)加藤工務店  
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事

15



地下空洞充填工(削孔工)

工期：令和2年03月29日～令和4年02月17日  
施工業者：徳倉建設(株)  
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事

16



充填孔設置工、充填到達観測孔設置工、車上プラント組立

工期：令和2年03月25日～令和4年02月25日  
施工業者：飛鳥建設(株)  
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事

17



道路土工、構造物撤去工、排水構造物工、擁壁工

工期：令和3年05月10日～令和4年02月25日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事

18



準備工(測量)・仮設工(作業ヤード)

工期：令和3年05月10日～令和4年02月25日  
施工業者：(株)鳴海組  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

19



準備工(伐採) カルバート工(2-18号) 擁壁工(重力式擁壁)

工期：令和3年05月11日～令和4年03月18日  
施工業者：恵中建設(株)  
施工箇所：恵那市武並町地先

令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事

20



表土すきとり・構造物撤去

工期：令和3年05月19日～令和4年03月18日  
施工業者：(株)市川工務店  
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事

21



道路土工、地盤改良工、排水構造物工

工期：令和3年04月15日～令和4年03月18日  
施工業者：大有建設(株)  
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和3年度瑞浪恵那道路整備工事

22



排水構造物工(芝原②工区)

工期：令和3年05月28日～令和4年03月18日  
施工業者：(株)中島工務店  
施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～釜戸町地内

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

23



準備工

工期：令和3年08月17日～令和4年03月31日  
施工業者：松栄電子工業(株)  
施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

24



準備工

工期：令和3年09月13日～令和4年06月30日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

25



準備工

工期：令和3年09月13日～令和4年02月28日  
施工業者：鳴海組  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和3年度 多治見国道車両計測設備修繕工事

26



準備工

工期：令和3年09月03日～令和4年02月28日  
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)  
施工箇所：中津川市山口地先

令和3年度 多治見国道西部除雪作業

27

準備工

工期：令和3年11月15日～令和4年03月31日  
施工業者：(株)吉川組  
施工箇所：春日井市～瑞浪市(R19.R21)
