

令和3年10月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (落合川流域)	進捗率	② (中津川出張所管内)	進捗率	③ (落合川流域)	進捗率	④ (落合川流域)	進捗率
工事名：令和2年度 木曾川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事	予定	工事名：令和3年度 中津川出張所整備工事	予定	工事名：令和2年度 木曾川水系 薬師沢第1砂防堰堤工事	予定	工事名：令和2年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事	予定
契約工期：令和2年12月7日 ~ 令和3年12月28日	実施 91.5%	契約工期：令和3年4月1日 ~ 令和3年11月30日	実施 92.1%	契約工期：令和3年4月12日 ~ 令和4年1月31日	実施 77.8%	契約工期：令和3年4月20日 ~ 令和4年3月30日	実施 9.4%
請負業者名：(株)鳴海組 12月中に完成検査予定	差	請負業者名：(株)鳴海組 12月中に完成検査予定	差	請負業者名：(株)吉川工務店 12月中に完成検査予定	差	請負業者名：(株)鳴海組	差
							
今月作業：構造物撤去工(既設堰堤取壊し)		今月作業：本谷災害復旧作業、四ツ目川遊砂工整備、湯舟沢魚道整備等		今月作業：コンクリート副堰堤工		今月作業：市道拡幅等	
来月予定：構造物撤去工(既設堰堤取壊し)		来月予定：本谷災害復旧作業、川上残土処理場整備等		来月予定：コンクリート副堰堤工		来月予定：河床掘削等	
⑤ (中津川流域)	進捗率	⑥ (中津川流域)	進捗率	⑦ (中津川流域)	進捗率	⑧ (本川筋)	進捗率
工事名：令和3年度 木曾川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事	予定	工事名：令和3年度 木曾川水系 中津川第2護岸整備工事	予定	工事名：令和3年度 木曾川水系 川上流路工事	予定	工事名：令和3年度 木曾川水系 アクラ沢管理用道路工事	予定
契約工期：令和3年4月20日 ~ 令和4年3月25日	実施 40.2%	契約工期：令和3年8月18日 ~ 令和4年2月28日	実施 22.2%	契約工期：令和2年9月1日 ~ 令和4年2月28日	実施 22.7%	契約工期：令和2年9月14日 ~ 令和4年2月28日	実施 9.6%
請負業者名：(株)加藤工務店	差	請負業者名：(株)加藤工務店	差	請負業者名：(株)中島工務店	差	請負業者名：(株)中島工務店	差
							
今月作業：コンクリート堰堤本体工、仮設工(崩落斜面面対策)		今月作業：流木処理、仮設工、流路護岸工(張りコンクリート、巨石採取)		今月作業：仮設工、構造物撤去工(防護柵、旧宮前橋)等		今月作業：地山補強土工(ルートパイル)等	
来月予定：コンクリート堰堤本体工		来月予定：流路護岸工(巨石積)		来月予定：仮設工、構造物撤去工(旧宮前橋)、床固め工等		来月予定：地山補強土工(ルートパイル)等	

令和3年10月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和3年3月3日 ～ 令和4年1月6日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 82.7%</p>	<p>②</p> <p>工事名： 令和3年度 妻木出張所整備工事</p> <p>工期： 令和3年4月1日 ～ 令和3年11月30日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 実施 90.0%</p>
<p style="text-align: center;">砦山地区</p> 	<p style="text-align: center;">浦山堰堤</p> 
<p>《今月作業》 砂防土工(盛土工)、コンクリート堰堤工(側壁工・水叩工) 根固め・水制工(かごマット)、道路土工(盛土工)</p> <p>《12月作業》 法面工(植生基材吹付・植生マット)、舗装工(アスファルト舗装工)</p>	<p>《今月作業》 上細峰草刈 生田川防草シート</p> <p>《12月作業》 完成</p>
<p>③</p> <p>工事名： 令和2年度 庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事</p> <p>工期： 令和3年4月5日 ～ 令和4年1月31日</p> <p>施工業者： (株)吉川組</p> <p>進捗率： 実施 62.9%</p>	<p>④</p> <p>工事名： 令和3年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事</p> <p>工期： 令和3年5月28日 ～ 令和4年3月25日</p> <p>施工業者： 小池土木(株)</p> <p>進捗率： 実施 20.2%</p>
	<p style="text-align: center;">市之倉地区</p> 
<p>《今月作業》 砂防土工 コンクリート堰堤工</p> <p>《12月作業》 砂防土工 コンクリート堰堤工</p>	<p>《今月作業》 砂防土工 構造物撤去工 コンクリート堰堤工</p> <p>《12月作業》 砂防土工 コンクリート堰堤工</p>

令和3年 10月末 上松出張所 工事進捗状況

	令和2年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	令和2年度 木曾川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曾土建工業(株)	令和2年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	令和2年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)																											
①	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>進捗率(予定工程)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">95.5</td> </tr> <tr> <td>R2.11.30~R3.11.30</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">週休2日</td> </tr> </table>	進捗率(予定工程)	%	95.5	R2.11.30~R3.11.30	週休2日		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>進捗率(予定工程)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">83.9</td> </tr> <tr> <td>R3. 2. 8~R4. 3.22</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">週休2日</td> </tr> </table>	進捗率(予定工程)	%	83.9	R3. 2. 8~R4. 3.22	週休2日		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>進捗率(予定工程)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">56.1</td> </tr> <tr> <td>R3. 3.29~R4. 3.22</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">週休2日</td> </tr> </table>	進捗率(予定工程)	%	56.1	R3. 3.29~R4. 3.22	週休2日		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>進捗率(予定工程)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">51.6</td> </tr> <tr> <td>R3. 4. 1~R4. 3.22</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">週休2日</td> </tr> </table>	進捗率(予定工程)	%	51.6	R3. 4. 1~R4. 3.22	週休2日				
進捗率(予定工程)	%	95.5																													
R2.11.30~R3.11.30	週休2日																														
進捗率(予定工程)	%	83.9																													
R3. 2. 8~R4. 3.22	週休2日																														
進捗率(予定工程)	%	56.1																													
R3. 3.29~R4. 3.22	週休2日																														
進捗率(予定工程)	%	51.6																													
R3. 4. 1~R4. 3.22	週休2日																														
																															
今月作業	4号側壁工 5号垂直壁工	砂防土工、法面工、流路護岸工、石・ブロック積(張)工	コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠・コンクリート打設) コンクリート副堰堤工(作業土工・差し筋・型枠・コンクリート打設)	掘削工・残土処理工																											
来月予定	5号垂直壁工 流路工(4号~5号) 仮設工	法面工、流路護岸工、床固め工、排水構造物工	コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠・コンクリート打設) コンクリート副堰堤工(差し筋・型枠・コンクリート打設)	掘削工・残土処理工																											
⑤	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>進捗率(予定工程)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">50.1</td> </tr> <tr> <td>R3. 4. 1~R4. 3.22</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">週休2日</td> </tr> </table>	進捗率(予定工程)	%	50.1	R3. 4. 1~R4. 3.22	週休2日		⑥	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>進捗率(予定工程)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">132.4</td> </tr> <tr> <td>R3. 4. 1~R3.11.30</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">週休2日</td> </tr> </table>	進捗率(予定工程)	%	132.4	R3. 4. 1~R3.11.30	週休2日		⑦	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>進捗率(予定工程)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">45.3</td> </tr> <tr> <td>R3. 4.28~R4. 1.31</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">週休2日</td> </tr> </table>	進捗率(予定工程)	%	45.3	R3. 4.28~R4. 1.31	週休2日		⑧	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>進捗率(予定工程)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">34.1</td> </tr> <tr> <td>R3. 6. 10~R4. 3.25</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">週休2日</td> </tr> </table>	進捗率(予定工程)	%	34.1	R3. 6. 10~R4. 3.25	週休2日	
進捗率(予定工程)	%	50.1																													
R3. 4. 1~R4. 3.22	週休2日																														
進捗率(予定工程)	%	132.4																													
R3. 4. 1~R3.11.30	週休2日																														
進捗率(予定工程)	%	45.3																													
R3. 4.28~R4. 1.31	週休2日																														
進捗率(予定工程)	%	34.1																													
R3. 6. 10~R4. 3.25	週休2日																														
																															
今月作業	構造物撤去工(コンクリート削孔、切断、取壊し)	和合蛇抜沢復旧整備(指示15)	法面工・鉄筋挿入工・工用道路工	伐採工 土工 法面工																											
来月予定	仮設工(仮締切)、構造物撤去工(コンクリート削孔、切断)	準備工	法面工・鉄筋挿入工	伐採工 土工 法面工 アンカー付き山留式擁壁工																											


令和3年 10月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨ 令和3年度 木曾川水系 宮の沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			⑩ 令和3年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土工建工業(株)			⑪ 令和3年度 多治見電機通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)			⑫ 施工業者		
	進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%	
	R3. 6.22~R4. 3.25		36.3 週休2日	R3. 8. 2~R4. 2.28		69.6 週休2日、ICT	R3. 9.27~R4. 2.28		0.7(0.7) 週休2日			
							写真無し					
今月作業	道路土工(掘削工) 法面工(鉄筋挿入工)			掘削工及び土砂等運搬工			大桑村役場打合せ、設計照査					
来月予定	道路土工(掘削工) 法面工(鉄筋挿入工・法面保護工)			掘削工及び土砂等運搬工			無線局申請、機器製作仕様書及び中電パワーグリッド技術検討書提出					
	⑬ 施工業者			⑭ 施工業者			⑮ 施工業者			⑯ 施工業者		
	進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%		進捗率(予定工程)	%	
今月作業												
来月予定												

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事



① 19号(中) 48.20kp~48.60kp 道路除草工
 工期: 令和02年10月30日~令和05年10月31日
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)
 施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp
 R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

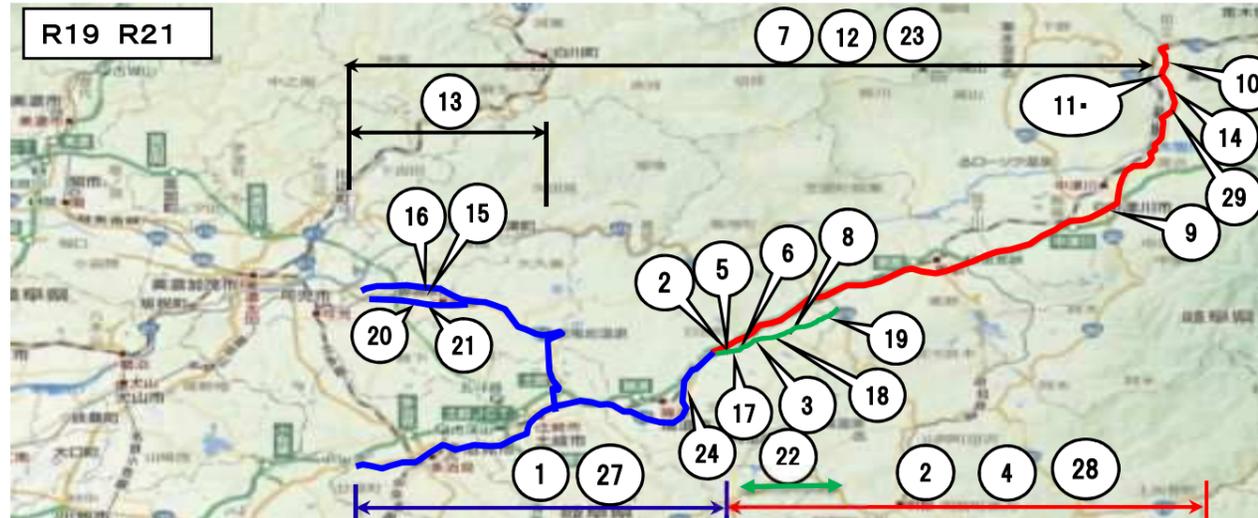

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事



② 19号84.050kp(下) 緑地管理工(道路除草)
 工期: 令和02年04月01日~令和04年10月31日
 施工業者: (有)木曾ハイウエーサービス
 施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事



③ 工期: 令和02年05月11日~令和03年07月2日
 施工業者: (株)吉川工務店
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先 **完**

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事



④ 恵那工区 排水構造物工、緑石工
 工期: 令和02年07月01日~令和03年12月28日
 施工業者: セントラル建設(株)
 施工箇所: 瑞浪市~中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事



⑤ A2橋台 躯体完了 工事用道路 路体盛土・セ
 工期: 令和2年09月03日~令和4年3月11日
 施工業者: (株)中島工務店
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事



⑥ 4号横断函渠工、仮設進入路
 工期: 令和02年09月04日~令和04年02月28日
 施工業者: 板垣建設(株)
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事



⑦ 道路情報表示設備工
 工期: 令和02年08月24日~令和03年08月31日
 施工業者: 松栄電子工業(株)
 施工箇所: 多治見砂防国道事務所管内 **完**

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事



⑧ 2工区
 (1工区)大型ブロック積擁壁工 (2工区)カルト工
 工期: 令和02年10月23日~令和04年03月11日
 施工業者: (株)加藤工務店
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事



⑨ 準備工
 工期: 令和2年10月14日~令和3年07月30日
 施工業者: (株)吉川工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市中津川地先 **完**

令和2年度多治見国道整備工事



⑩ 防護柵工、舗装工
 工期: 令和2年10月17日~令和3年12月15日
 施工業者: 板垣建設(株)
 施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事



⑪ センサ据付工・半たわみ舗装工・試運転調整工
 工期: 令和2年12月22日~令和03年09月10日
 施工業者: オムロンフィールドエンジニアリング株式会社
 施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先 **完**

令和2年度多治見国道橋梁補修工事



⑫ 大原橋伸縮装置工・美佐野橋舗装工 他
 工期: 令和3年03月22日~令和4年3月2日
 施工業者: (株)梅田組
 施工箇所: 多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道西部整備工事

⑬



落石防止網工、高圧水噴射機による吸収型落石防止柵工
工 期：令和3年03月25日～令和4年3月29日
施工業者：(株)藤本組
施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

⑭



補強地山土工・土工
工 期：令和2年03月29日～令和4年3月28日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事

⑮



地下空洞充填工(充填工)
工 期：令和2年03月29日～令和4年02月17日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事

⑯



充填孔設置工、充填到達観測孔設置工、充填工
工 期：令和2年03月25日～令和4年02月25日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事

⑰



排水構造物工、立坑工、擁壁工
工 期：令和3年05月10日～令和4年02月25日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事

⑱



橋梁下部工(作業ヤード整備工)・仮設工(仮排水路)
工 期：令和3年05月10日～令和4年02月25日
施工業者：(株)鳴海組
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑲



カルバート工(2-18号) 仮設工(足場組立)
工 期：令和3年05月11日～令和4年03月18日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：恵那市武並町地先

令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事

⑳



路床すきとり・路床安定処理、排水構造物
工 期：令和3年05月19日～令和4年03月18日
施工業者：(株)市川工務店
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事

㉑



地盤改良工、排水構造物工、縁石工、下層路盤工
工 期：令和3年04月15日～令和4年03月18日
施工業者：大有建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和3年度瑞浪恵那道路整備工事

㉒



排水構造物工(芝原②工区)
工 期：令和3年05月28日～令和4年03月18日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～釜戸町地内

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

㉓



準備工
工 期：令和3年08月17日～令和4年03月31日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

㉔



準備工
工 期：令和3年09月13日～令和4年06月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

㉕



準備工
工 期：令和3年09月13日～令和4年02月28日
施工業者：鳴海組
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和3年度 多治見国道車両計測設備修繕工事

㉖



準備工
工 期：令和3年09月03日～令和4年02月28日
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
施工箇所：中津川市山口地先

令和3年度 多治見国道西部除雪作業

㉗

準備工
工 期：令和3年11月15日～令和4年03月31日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：春日井市～瑞浪市(R19.R21)

令和3年度 多治見国道東部除雪作業

②⑧

準備工

工期：令和03年11月15日～令和04年03月31日

施工業者：（株）加藤工務店

施工箇所：瑞浪市土岐町～長野県木曾郡木曾町田立

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

②⑨

準備工

工期：令和03年11月9日～令和04年03月31日

施工業者：（株）吉川工務店

施工箇所：岐阜県中津川市落合
