

令和3年11月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率	②（中津川出張所管内）		進 捗 率	③（落合川流域）		進 捗 率	④（落合川流域）		進 捗 率
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定	工 事 名：令和3年度 中津川出張所整備工事		予定	工 事 名：令和2年度 木曽川水系 薬師沢第1砂防堰堤工事		予定	工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定
契 約 工 期： 令和2年12月7日 ～ 令和3年12月28日		実施 99.5%	契 約 工 期： 令和3年4月1日 ～ 令和3年11月30日		実施 100.0%	契 約 工 期： 令和3年4月12日 ～ 令和4年1月31日		実施 94.1%	契 約 工 期： 令和3年4月20日 ～ 令和4年3月30日		実施 10.1%
請負業者名：（株）鳴海組		差	請負業者名：（株）鳴海組		差	請負業者名：（株）吉川工務店		差	請負業者名：（株）鳴海組		差
			本谷災害復旧作業 工事名 令和3年度中津川出張所整備工事 工 種 本谷災害復旧作業 測 点 本谷管理道路 整備状況 								
今月作業：構造物撤去工（既設堰堤取壊し）、コンクリート堰堤工（作業土工）			今月作業：本谷災害復旧作業、湯舟沢魚道整備、地獄谷砂防堰堤整備 等			今月作業：コンクリート副堰堤工			今月作業：河床掘削（準備）等		
来月予定：アスファルト舗装工、後片付け等			来月予定：－			来月予定：後片付け等			来月予定：河床掘削（土砂搬出）等		
⑤（中津川流域）		進 捗 率	⑥（中津川流域）		進 捗 率	⑦（中津川流域）		進 捗 率	⑧（本川筋）		進 捗 率
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事		予定	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事		予定	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 川上流路工事		予定	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 アラクラ沢管理用道路工事		予定
契 約 工 期： 令和3年4月20日 ～ 令和4年3月25日		実施 62.5%	契 約 工 期： 令和3年8月18日 ～ 令和4年2月28日 変更予定工期 令和4年3月31日		実施 37.7%	契 約 工 期： 令和2年9月1日 ～ 令和4年2月28日		実施 32.4%	契 約 工 期： 令和2年9月14日 ～ 令和4年2月28日		実施 31.1%
請負業者名：（株）加藤工務店		差	請負業者名：（株）加藤工務店		差	請負業者名：（株）中島工務店		差	請負業者名：（株）中島工務店		差
											
今月作業：コンクリート堰堤本体工			今月作業：流路護岸工（巨石積）			今月作業：構造物撤去工（旧宮前橋）、床固め工 等			今月作業：地山補強土工（ルートパイル） 等		
来月予定：コンクリート堰堤本体工			来月予定：流路護岸工（巨石積）、残土処理工			来月予定：床固め工、流路護岸工、根固め・水制工 等			来月予定：地山補強土工（ルートパイル） 等		

令和3年11月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工 事 名： 令和2年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事 工 期： 令和3年3月3日 ～ 令和4年1月6日 施工業者：(株)藤本組 進 捗 率： 実施 94.5%	② 工 事 名： 令和3年度 妻木出張所整備工事 工 期： 令和3年4月1日 ～ 令和3年11月30日 施工業者：(株)藤本組 進 捗 率： 実施 100.0%
砦山地区 	市之倉川整備 
《今月作業》砂防土工、法面工、道路土工、舗装工 《1月作業》完成	《今月作業》工事完成 《1月作業》
③ 工 事 名： 令和2年度 庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事 工 期： 令和3年4月5日 ～ 令和4年1月31日 施工業者：(株)吉川組 進 捗 率： 実施 75.7%	④ 工 事 名： 令和3年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事 工 期： 令和3年5月28日 ～ 令和4年3月25日 施工業者：小池土木(株) 進 捗 率： 実施 38.0%
	市之倉地区 
《今月作業》砂防土工・コンクリート堰堤工 《1月作業》コンクリート側壁工・水叩工・流路工	《今月作業》コンクリート堰堤工、鋼製堰堤工 《1月作業》コンクリート堰堤工、砂防土工、コンクリート側壁工

令和3年 11月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)			②	令和2年度 木曽川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曽土建工業(株)			③	令和2年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			④	令和2年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)						
		進捗率(予定工程)		%		100.0	進捗率(予定工程)			%	83.9	進捗率(予定工程)		%	69.7	進捗率(予定工程)		%	67.9	
		R2.11.30～R3.11.30		週休2日		R3. 2. 8～R4. 3.22		週休2日		R3. 3.29～R4. 3.22		週休2日		R3. 4. 1～R4. 3.22		週休2日				
																				
今月作業	床固め工、後片付け。				法面工、流路護岸工、床固め工、排水構造物工				コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠・コンクリート打設) コンクリート副堰堤工(差し筋・型枠・コンクリート打設)				掘削工・残土処理工							
来月予定	12月13日完成検査。				法面工、流路護岸工、床固め工、排水構造物工				コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠・コンクリート打設) コンクリート副堰堤工(差し筋・型枠・コンクリート打設)				掘削工・残土処理工							
	⑤	令和2年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑥	令和3年度 上松出張所整備工事 施工業者 大宗土建(株)			⑦	令和2年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)			⑧	令和3年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 大宗土建(株)						
		進捗率(予定工程)		%		63.5	進捗率(予定工程)			%	100.0	進捗率(予定工程)		%	59.5	進捗率(予定工程)		%	45.0	
		R3. 4. 1～R4. 3.22		週休2日		R3. 4. 1～R3.11.30		週休2日		R3. 4.28～R4. 1.31		週休2日		R3. 6. 10～R4. 3.25		週休2日				
																				
今月作業	コンクリート削孔・切断、残土運搬、仮設工				11月25日完成検査。				法面工・鉄筋挿入工				伐採工 土工 法面工 アンカー付き山留式擁壁工							
来月予定	コンクリート削孔・切断、残土運搬、仮設工				—				法面工・鉄筋挿入工・伐採工				伐採工 土工 法面工 アンカー付き山留式擁壁工							

令和3年 11月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨	令和3年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			⑩	令和3年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑪	令和3年度 多治見電機通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)			⑫	令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)									
		進捗率(予定工程)		%		47.2	進捗率(予定工程)			%	88.3	進捗率(予定工程)		%	0.8	進捗率(予定工程)		%	0.0				
		R3. 6.22～R4. 3.25		週休2日		R3. 8. 2～R4. 2.28		週休2日、ICT		R3. 9.27～R4. 2.28		週休2日		R3.12. 1～R5. 1.31									
														写真無し									
今月 作業	道路土工(掘削工) 法面工(鉄筋挿入工・法面保護工)					掘削工及び土砂等運搬工					大桑村役場・木曽町役場打合せ、設計照査、中電パワーグリッド・NTT共架申請					-							
来月 予定	道路土工(掘削工) 法面工(鉄筋挿入工・法面保護工)					掘削工及び土砂等運搬工、仮設工撤去、後片付け					無線局申請、大桑村役場空中線柱建柱					施工計画書。							

	⑬	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)			⑭	令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			⑮	施工業者			⑯	施工業者						
		進捗率(予定工程)		%		0.0	進捗率(予定工程)			%	0.0	進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%		
		R3.12. 1～R4.11.30				R3.12. 6～R4. 7.29														
		写真無し																		
今月 作業	-					-														
来月 予定	施工計画書。 滑川整備。					施工計画書。														

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①




21号(上下) 9.45kp~9.95kp 区画線工

工 期: 令和02年10月30日~令和05年10月31日

施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)

施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp

R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

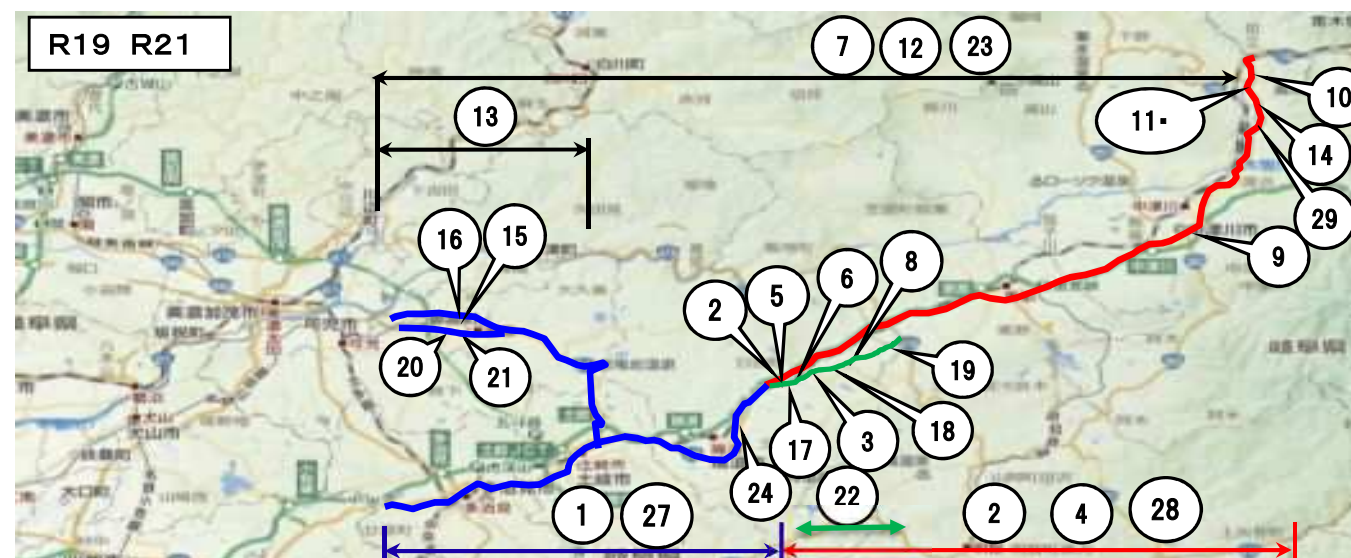

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号92.450kp(上) 舗装修繕工(切削オーバーレイ工)

工 期: 令和02年04月01日~令和04年10月31日

施工業者: (有)木曾ハイウェイサービス

施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

③



工 期: 令和02年05月11日~令和03年07月2日

施工業者: (株)吉川工務店

施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

完

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

④



恵那工区 排水構造物工、緑石工、舗装工、信号機工

工 期: 令和02年07月01日~令和03年12月28日

施工業者: セントラル建設(株)

施工箇所: 瑞浪市~中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

⑤



A2橋台 躯体完了 工事用道路 路体盛土・セ

工 期: 令和2年09月03日~令和4年3月11日

施工業者: (株)中島工務店

施工箇所: 瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑥



4号横断函渠工、仮設進入路

工 期: 令和02年09月04日~令和04年02月28日

施工業者: 板垣建設(株)

施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事

⑦



道路情報表示設備工

工 期: 令和02年08月24日~令和03年08月31日

施工業者: 松栄電子工業(株)

施工箇所: 多治見砂防国道事務所管内

完

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑧



(1工区)大型ブロック擁壁工 (2工区)準備工

工 期: 令和02年10月23日~令和04年03月11日

施工業者: (株)加藤工務店

施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

⑨



準備工

工 期: 令和2年10月14日~令和3年07月30日

施工業者: (株)吉川工務店

施工箇所: 岐阜県中津川市中津川地先

完

令和2年度多治見国道整備工事

⑩



準備工

工 期: 令和2年10月17日~令和3年12月15日

施工業者: 板垣建設(株)

施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先

完

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事

⑪



センサ据付工・半たわみ舗装工・試運転調整工

工 期: 令和2年12月22日~令和03年09月10日

施工業者: オムロンフィールドエンジニアリング(株)

施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先

完

令和2年度多治見国道橋梁補修工事

⑫



美佐野橋伸縮装置他

工 期: 令和3年03月22日~令和4年3月2日

施工業者: (株)梅田組

施工箇所: 多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道西部整備工事

⑬



落石防止網工、高圧水・吸収型落石防止柵工
工 期：令和3年03月25日～令和4年3月29日
施工業者：(株)藤本組
施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

⑭



補強地山土工・土工
工 期：令和02年03月29日～令和04年3月28日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事

⑮



技術管理費(確認ボーリング)
工 期：令和02年03月29日～令和04年02月17日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事

⑯



充填工、確認ボーリング工、舗装復旧工
工 期：令和02年03月25日～令和04年02月25日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事

⑰



道路土工、排水構造物工、立坑工、擁壁工、盛土工、舗装工
工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事

⑱



A1橋台工・地盤改良工(中層混合処理)
工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日
施工業者：(株)鳴海組
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑲



カルバート工(2-18号)
工 期：令和03年05月11日～令和04年03月18日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：恵那市武並町地先

令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事

⑳



地盤改良工、排水構造物工、縁石工、舗装工
工 期：令和03年05月19日～令和04年03月18日
施工業者：(株)市川工務店
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事

㉑



地盤改良工、撤去工、排水構造物工、縁石工、舗装工、道路付属施設工
工 期：令和03年04月15日～令和04年03月18日
施工業者：大有建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和3年度瑞浪恵那道路整備工事

㉒



排水構造物工(芝原②工区)
工 期：令和03年05月28日～令和04年03月18日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～釜戸町地内

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

㉓



準備工
工 期：令和03年08月17日～令和04年03月31日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

㉔



仮設工
工 期：令和03年09月13日～令和04年06月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

㉕



道路土工(路体盛土・法面整形)
工 期：令和03年09月13日～令和04年02月28日
施工業者：鳴海組
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和3年度 多治見国道車両計測設備修繕工事

㉖



準備工
工 期：令和03年09月03日～令和04年02月28日
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
施工箇所：中津川市山口地先

令和3年度 多治見国道西部除雪作業

㉗



環境整備工
工 期：令和03年11月15日～令和04年03月31日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：春日井市～瑞浪市(R19.R21)

令和3年度 多治見国道東部除雪作業 ②8 準備工 工 期：令和03年11月15日～令和04年03月31日 施工業者：（株）加藤工務店 施工箇所： 瑞浪市土岐町～長野県木曽郡木曽町田立	令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事 ②9 準備工 工 期：令和03年11月9日～令和04年03月31日 施工業者：（株）吉川工務店 施工箇所： 岐阜県中津川市落合			
--	--	--	--	--
