

令和3年12月末 中津川出張所 工事進捗状況

|                                                                                    |  |            |        |                                                                                      |  |       |        |                                                                                       |  |                                     |       |                                                                                       |  |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|
| ①（落合川流域）                                                                           |  | 進 捗 率      |        | ②（落合川流域）                                                                             |  | 進 捗 率 |        | ③（落合川流域）                                                                              |  | 進 捗 率                               |       | ④（中津川流域）                                                                              |  | 進 捗 率 |       |
| 工 事 名：令和2年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事                                                      |  | 予定         |        | 工 事 名：令和2年度 木曽川水系 薬師沢第1砂防堰堤工事                                                        |  | 予定    |        | 工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事<br>※令和4年3月29日まで工事の(一部)一時中止                               |  | 予定                                  | －     | 工 事 名：令和3年度 木曽川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事                                                       |  | 予定    |       |
| 契 約 工 期：令和2年12月7日 ～ 令和3年12月28日                                                     |  | 実施         | 100.0% | 契 約 工 期：令和3年4月12日 ～ 令和4年1月31日                                                        |  | 実施    | 100.0% | 契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年3月30日                                                         |  | 実施                                  | 16.7% | 契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年3月25日                                                         |  | 実施    | 80.2% |
| 請負業者名：(株)鳴海組                                                                       |  | 差          |        | 請負業者名：(株)吉川工務店                                                                       |  | 差     |        | 請負業者名：(株)鳴海組                                                                          |  | 差                                   | －     | 請負業者名：(株)加藤工務店                                                                        |  | 差     |       |
|    |  | 完了         |        |    |  | 完了    |        |    |  | ※R3.8.20から一部一時中止(222日間) R4.3.30再開予定 |       |    |  |       |       |
| 今月作業：後片付け等、完成検査(令和3年12月27日)                                                        |  |            |        | 今月作業：後片付け等、完成検査(令和3年12月21日)                                                          |  |       |        | 今月作業：河床掘削(土砂搬出)等                                                                      |  |                                     |       | 今月作業：コンクリート堰堤本体工                                                                      |  |       |       |
| 来月予定：－                                                                             |  |            |        | 来月予定：－                                                                               |  |       |        | 来月予定：河床掘削(土砂搬出)、仮設工(水替工)等                                                             |  |                                     |       | 来月予定：コンクリート堰堤本体工                                                                      |  |       |       |
| ⑤（中津川流域）                                                                           |  | 進 捗 率      |        | ⑥（中津川流域）                                                                             |  | 進 捗 率 |        | ⑦（本川筋）                                                                                |  | 進 捗 率                               |       | ⑧（中津川出張所管内）                                                                           |  | 進 捗 率 |       |
| 工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事                                                      |  | 予定         |        | 工 事 名：令和3年度 木曽川水系 川上流路工事                                                             |  | 予定    |        | 工 事 名：令和3年度 木曽川水系 アラクラ沢管理用道路工事                                                        |  | 予定                                  |       | 工 事 名：令和3年度 中津川出張所管内整備工事                                                              |  | 予定    |       |
| 契 約 工 期：令和3年8月18日 ～ 令和4年2月28日<br>変更予定工期 令和4年3月31日                                  |  | 実施         | 51.5%  | 契 約 工 期：令和2年9月1日 ～ 令和4年2月28日<br>変更予定工期 令和4年8月31日                                     |  | 実施    | 42.4%  | 契 約 工 期：令和2年9月14日 ～ 令和4年2月28日<br>変更予定工期 令和4年8月31日                                     |  | 実施                                  | 53.9% | 契 約 工 期：令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日                                                        |  | 実施    | 0.0%  |
| 請負業者名：(株)加藤工務店                                                                     |  | 差          |        | 請負業者名：(株)中島工務店                                                                       |  | 差     |        | 請負業者名：(株)中島工務店                                                                        |  | 差                                   |       | 請負業者名：(株)吉川工務店                                                                        |  | 差     |       |
|  |  | ※現在 工程見直し中 |        |  |  |       |        |  |  |                                     |       |  |  | 準備工   |       |
| 今月作業：流路護岸工(巨石積)                                                                    |  |            |        | 今月作業：床固め工、流路護岸工、根固め・水制工等                                                             |  |       |        | 今月作業：地山補強土工(ルートパイル)                                                                   |  |                                     |       | 今月作業：書類作成、準備工等                                                                        |  |       |       |
| 来月予定：流路護岸工(巨石積)、残土処理工                                                              |  |            |        | 来月予定：床固め工、根固め・水制工、道路付属施設工(水道管布設)等                                                    |  |       |        | 来月予定：地山補強土工(ルートパイル)等                                                                  |  |                                     |       | 来月予定：中津川第2崩落箇所整備等                                                                     |  |       |       |



# 令和3年12月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

①

工事名： 令和2年度  
庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事

工期： 令和3年3月3日 ～ 令和4年1月6日

施工業者：(株)藤本組

進捗率： 実施 100.0%

砦山地区



《今月作業》 完成

《2月作業》

⑤

工事名： 令和3年度  
妻木出張所管内整備工事

工期： 令和3年4月1日 ～ 令和3年11月30日

施工業者：(株)藤本組

進捗率： 実施 2.0%



生田流路工：防草対策（張りコンクリート）

《今月作業》 指示1マンホール嵩上げ

《2月作業》 指示2:生田護岸 仮設工、指示3:生田川伐採、土砂撤去

③

工事名： 令和2年度  
庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事

工期： 令和3年4月5日 ～ 令和4年1月31日

施工業者：(株)吉川組

進捗率： 実施 83.1%



《今月作業》 コンクリート側壁工・水叩工・流路工

《2月作業》 流路護岸工、法面工

④

工事名： 令和3年度  
庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事

工期： 令和3年5月28日 ～ 令和4年3月25日

施工業者：小池土木(株)

進捗率： 実施 57.0%

市之倉地区



《今月作業》 コンクリート堰堤工、砂防土工、コンクリート側壁工

《2月作業》 コンクリート堰堤工、コンクリート側壁工、仮設工




令和3年 12月末 上松出張所 工事進捗状況

|      |                                                                                     |                                           |  |      |                                                                                      |                                       |           |      |                                                                                       |                                          |       |           |                                                                                       |                                             |      |           |  |   |      |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-----------|--|---|------|--|
|      | ①                                                                                   | 令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事<br>施工業者 奥田工業(株)     |  |      | ②                                                                                    | 令和2年度 木曽川水系 下洞沢流路工事<br>施工業者 木曽土建工業(株) |           |      | ③                                                                                     | 令和2年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事<br>施工業者 奥田工業(株) |       |           | ④                                                                                     | 令和2年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事<br>施工業者 大宗土建(株)      |      |           |  |   |      |  |
|      |                                                                                     | 進捗率(予定工程)                                 |  | %    |                                                                                      | 100.0                                 | 進捗率(予定工程) |      |                                                                                       | %                                        | 90.5  | 進捗率(予定工程) |                                                                                       | %                                           | 82.9 | 進捗率(予定工程) |  | % | 67.9 |  |
|      |                                                                                     | R2.11.30～R3.11.30                         |  | 週休2日 |                                                                                      | R3. 2. 8～R4. 3.22                     |           | 週休2日 |                                                                                       | R3. 3.29～R4. 3.22                        |       | 週休2日      |                                                                                       | R3. 4. 1～R4. 3.22                           |      | 週休2日      |  |   |      |  |
|      |    |                                           |  |      |    |                                       |           |      |    |                                          |       |           |    |                                             |      |           |  |   |      |  |
| 今月作業 | 12月13日完成検査。                                                                         |                                           |  |      | 法面工、流路護岸工、床固め工、排水構造物工                                                                |                                       |           |      | コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠・コンクリート打設)<br>コンクリート副堰堤工(差し筋・型枠・コンクリート打設)                           |                                          |       |           | 掘削工・残土処理工                                                                             |                                             |      |           |  |   |      |  |
| 来月予定 | -                                                                                   |                                           |  |      | 流路護岸工、仮設工、排水構造物工、構造物撤去工                                                              |                                       |           |      | コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠・コンクリート打設)<br>コンクリート副堰堤工(差し筋・型枠・コンクリート打設)                           |                                          |       |           | 掘削工・残土処理工                                                                             |                                             |      |           |  |   |      |  |
|      | ⑤                                                                                   | 令和2年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事<br>施工業者 大宗土建(株) |  |      | ⑥                                                                                    | 令和3年度 上松出張所整備工事<br>施工業者 大宗土建(株)       |           |      | ⑦                                                                                     | 令和2年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事<br>施工業者 神稲建設(株)  |       |           | ⑧                                                                                     | 令和3年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤管理用道路工事<br>施工業者 大宗土建(株) |      |           |  |   |      |  |
|      |                                                                                     | 進捗率(予定工程)                                 |  | %    |                                                                                      | 78.6                                  | 進捗率(予定工程) |      |                                                                                       | %                                        | 100.0 | 進捗率(予定工程) |                                                                                       | %                                           | 81.6 | 進捗率(予定工程) |  | % | 65.7 |  |
|      |                                                                                     | R3. 4. 1～R4. 3.22                         |  | 週休2日 |                                                                                      | R3. 4. 1～R3.11.30                     |           | 週休2日 |                                                                                       | R3. 4.28～R4. 1.31                        |       | 週休2日      |                                                                                       | R3. 6. 10～R4. 3.25                          |      | 週休2日      |  |   |      |  |
|      |  |                                           |  |      |  |                                       |           |      |  |                                          |       |           |  |                                             |      |           |  |   |      |  |
| 今月作業 | コンクリート削孔・切断・取壊し                                                                     |                                           |  |      | -                                                                                    |                                       |           |      | 法面工・鉄筋挿入工・伐採工                                                                         |                                          |       |           | 伐採工<br>土工<br>法面工<br>アンカー付き山留式擁壁工                                                      |                                             |      |           |  |   |      |  |
| 来月予定 | コンクリート取壊し                                                                           |                                           |  |      | -                                                                                    |                                       |           |      | 法面工・鉄筋挿入工                                                                             |                                          |       |           | 法面工<br>アンカー付き山留式擁壁工                                                                   |                                             |      |           |  |   |      |  |



令和3年 12月末 上松出張所 工事進捗状況

|          |                               |                                                                                   |  |                                                                                    |             |                                                                                     |           |                                                                                     |                                       |                                     |       |           |              |                                       |     |           |  |   |     |  |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------------------------------------|-----|-----------|--|---|-----|--|
|          | ⑨                             | 令和3年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤管理用道路工事<br>施工業者 奥田工業(株)                                        |  |                                                                                    | ⑩           | 令和3年度 木曽川水系 上松管内除石工事<br>施工業者 木曽土建工業(株)                                              |           |                                                                                     | ⑪                                     | 令和3年度 多治見電機通信設備工事<br>施工業者 朝日電機工業(株) |       |           | ⑫            | 令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事<br>施工業者 奥田工業(株) |     |           |  |   |     |  |
|          |                               | 進捗率(予定工程)                                                                         |  | %                                                                                  |             | 59.9                                                                                | 進捗率(予定工程) |                                                                                     |                                       | %                                   | 100.0 | 進捗率(予定工程) |              | %                                     | 0.9 | 進捗率(予定工程) |  | % | 1.2 |  |
|          |                               | R3. 6.22～R4. 3.25                                                                 |  | 週休2日                                                                               |             | R3. 8. 2～R4. 2.28                                                                   |           | 週休2日、ICT                                                                            |                                       | R3. 9.27～R4. 2.28                   |       | 週休2日      |              | R3.12. 1～R5. 1.31                     |     | 週休2日、ICT  |  |   |     |  |
|          |                               |  |  |  |             |  |           |  |                                       |                                     |       |           |              |                                       |     |           |  |   |     |  |
| 今月<br>作業 | 道路土工(掘削工)<br>法面工(鉄筋挿入工・法面保護工) |                                                                                   |  |                                                                                    | 12月24日完成検査。 |                                                                                     |           |                                                                                     | 大桑村役場サーバ室架台取付                         |                                     |       |           | 準備工<br>施工計画書 |                                       |     |           |  |   |     |  |
| 来月<br>予定 | 道路土工(掘削工)<br>法面工(鉄筋挿入工・法面保護工) |                                                                                   |  |                                                                                    | -           |                                                                                     |           |                                                                                     | 無線局申請、中電パワーグリッド共架申請・NTT西日本共架申請書<br>提出 |                                     |       |           | 準備工<br>仮設工   |                                       |     |           |  |   |     |  |

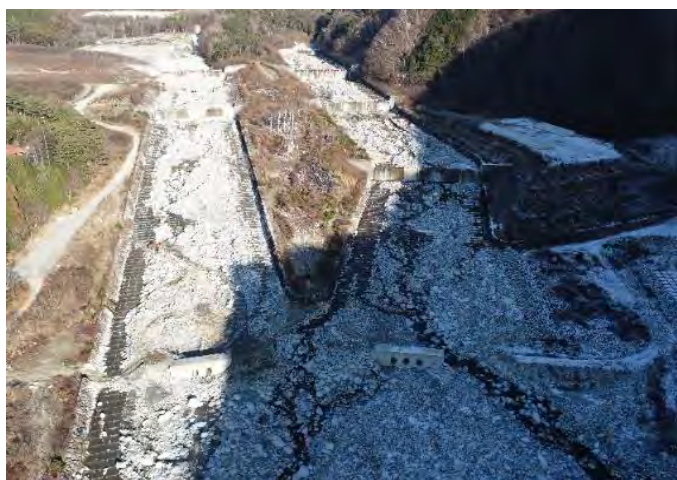
|          |                                                 |                                                                                     |  |                                                                                      |             |                                           |           |              |   |      |     |           |   |      |  |           |  |   |  |  |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|---|------|-----|-----------|---|------|--|-----------|--|---|--|--|
|          | ⑬                                               | 令和3年度 上松出張所管内整備工事<br>施工業者 大宗土建(株)                                                   |  |                                                                                      | ⑭           | 令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事<br>施工業者 奥田工業(株) |           |              | ⑮ | 施工業者 |     |           | ⑯ | 施工業者 |  |           |  |   |  |  |
|          |                                                 | 進捗率(予定工程)                                                                           |  | %                                                                                    |             | 2.9                                       | 進捗率(予定工程) |              |   | %    | 0.1 | 進捗率(予定工程) |   | %    |  | 進捗率(予定工程) |  | % |  |  |
|          |                                                 | R3.12. 1～R4.11.30                                                                   |  | 週休2日                                                                                 |             | R3.12. 6～R4. 7.29                         |           | 週休2日、CIM、ICT |   |      |     |           |   |      |  |           |  |   |  |  |
|          |                                                 |  |  |  |             |                                           |           |              |   |      |     |           |   |      |  |           |  |   |  |  |
| 今月<br>作業 | 滑川林道整備(指示2)下洞沢整備(指示3)滑川資材運搬路整備(指示4)和合蛇抜沢整備(指示5) |                                                                                     |  |                                                                                      | 施工計画書       |                                           |           |              |   |      |     |           |   |      |  |           |  |   |  |  |
| 来月<br>予定 | 滑川伐採木処理(指示1)滑川資材運搬路整備(指示4)                      |                                                                                     |  |                                                                                      | 仮設工、伐採、起工測量 |                                           |           |              |   |      |     |           |   |      |  |           |  |   |  |  |



令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事



①  
19号(中) 32.60kp~32.63kp 道路付属物復旧工  
工 期：令和02年10月30日~令和05年10月31日  
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)  
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp  
R21 3.0kp~22.0kp 可児御高BP

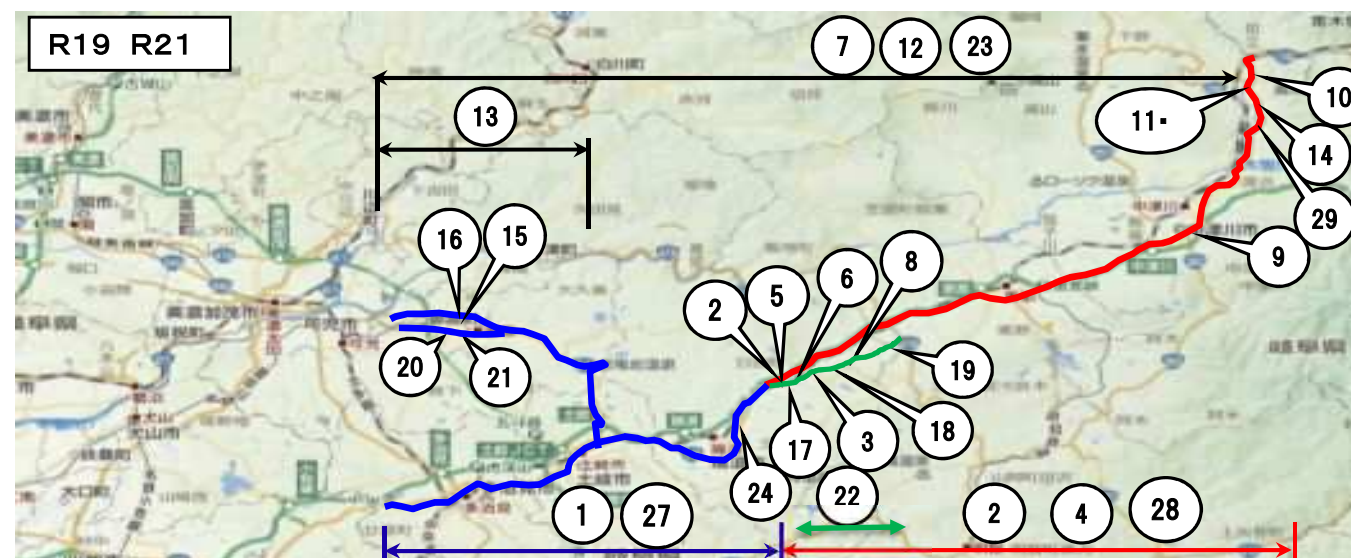

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事



②  
19号78.100kp(上) 緑地管理工(道路除草)  
工 期：令和02年04月01日~令和04年10月31日  
施工業者：(有)木曾ハイウエーサービ  
ス施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事



③  
工 期：令和02年05月11日~令和03年07月2日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事



④  
恵那工区 排水構造物工、緑石工、舗装工、区画線工、信号機工  
工 期：令和02年07月01日~令和04年03月28日  
施工業者：セントラル建設(株)  
施工箇所：瑞浪市~中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事



⑤  
道路土工 掘削・残土処理  
工 期：令和2年09月03日~令和4年3月11日  
施工業者：(株)中島工務店  
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事



⑥  
4号横断函渠工、崩壊地法面対策  
工 期：令和02年09月04日~令和04年02月28日  
施工業者：板垣建設(株)  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事



⑦  
道路情報表示設備工  
工 期：令和02年08月24日~令和03年08月31日  
施工業者：松栄電子工業(株)  
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事



⑧  
2工区  
(1工区)擁壁工、排水構造物工(2工区)舗装工、路床安定処理工  
工 期：令和02年10月23日~令和04年03月11日  
施工業者：(株)加藤工務店  
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事



⑨  
工 期：令和2年10月14日~令和3年07月30日  
施工業者：(株)吉川工務店  
施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

令和2年度多治見国道整備工事



⑩  
工 期：令和2年10月17日~令和3年12月15日  
施工業者：板垣建設(株)  
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事



⑪  
工 期：令和2年12月22日~令和03年09月10日  
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)  
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道橋梁補修工事



⑫  
瑞浪工区 防護柵工・変位制限装置工  
工 期：令和3年03月22日~令和4年3月2日  
施工業者：(株)梅田組  
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内



令和2年度多治見国道西部整備工事

⑬



法面工、排水構造物工

工 期：令和3年03月25日～令和4年3月29日  
 施工業者：(株)藤本組  
 施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

⑭



地山補強土工(3号、4号)

工 期：令和02年03月29日～令和04年3月28日  
 施工業者：(株)加藤工務店  
 施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事

⑮



共通仮設費(家屋事後調査)

工 期：令和02年03月29日～令和04年02月17日  
 施工業者：徳倉建設(株)  
 施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事

⑯



充填プラント解体工、片付工、家屋調査工

工 期：令和02年03月25日～令和04年02月25日  
 施工業者：飛鳥建設(株)  
 施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事

⑰



道路土工、法面工、舗装工、地盤改良工

工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日  
 施工業者：(株)吉川工務店  
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事

⑱



A1橋台工・地盤改良工・排水構造物工

工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日  
 施工業者：(株)鳴海組  
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑲



カルバート工(2-18号横断函渠)

工 期：令和03年05月11日～令和04年03月18日  
 施工業者：恵中建設(株)  
 施工箇所：恵那市武並町地先

令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事

⑳



排水構造物工、縁石工、信号・照明設置、舗装工

工 期：令和03年05月19日～令和04年03月18日  
 施工業者：(株)市川工務店  
 施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事

㉑



舗装工、撤去工、排水構造物工、縁石工、道路付属施設工、防護柵工

工 期：令和03年04月15日～令和04年03月18日  
 施工業者：大有建設(株)  
 施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和3年度瑞浪恵那道路整備工事

㉒



表層工(芝原②工区)

工 期：令和03年05月28日～令和04年03月18日  
 施工業者：(株)中島工務店  
 施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～釜戸町地内

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

㉓



機器製作、通信設備工

工 期：令和03年08月17日～令和04年03月31日  
 施工業者：松栄電子工業(株)  
 施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

㉔



仮設工 橋脚巻立て工

工 期：令和03年09月13日～令和04年06月30日  
 施工業者：(株)吉川工務店  
 施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

㉕



道路土工・掘削

工 期：令和03年09月13日～令和04年02月28日  
 施工業者：鳴海組  
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和3年度 多治見国道車両計測設備修繕工事

㉖



準備工、製作工

工 期：令和03年09月03日～令和04年02月28日  
 施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)  
 施工箇所：中津川市山口地先

令和3年度 多治見国道西部除雪作業

㉗



凍結防止工

工 期：令和03年11月15日～令和04年03月31日  
 施工業者：(株)吉川組  
 施工箇所：春日井市～瑞浪市(R19.R21)

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <div>令和3年度 多治見国道東部除雪作業</div> <div>28</div> <div>凍結防止剤散布 (C)・(D)</div> <div>工 期：令和03年11月15日～令和04年03月31日</div> <div>施工業者：(株)加藤工務店</div> <div>施工箇所：瑞浪市土岐町～長野県木曽郡木曽町田立</div> | <div>令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事</div> <div>29</div> <div>準備工</div> <div>工 期：令和03年11月9日～令和04年03月31日</div> <div>施工業者：(株)吉川工務店</div> <div>施工箇所：岐阜県中津川市落合</div> |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
