

令和4年1月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率		②（中津川流域）		進 捗 率		③（中津川流域）		進 捗 率		④（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事 ※令和4年3月29日まで工事の(一部)一時中止		予定		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事		予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 川上流路工事		予定	
契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年3月30日		実施	23.7%	契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年3月25日		実施	95.1%	契 約 工 期：令和3年8月18日 ～ 令和4年3月31日		実施	69.0%	契 約 工 期：令和2年9月1日 ～ 令和4年2月28日 最終変更工期：令和4年8月31日		実施	48.1%
請負業者名：(株)鳴海組 ※一部一時中止 222日 令和4年3月29日まで		差		請負業者名：(株)加藤工務店		差		請負業者名：(株)加藤工務店		差		請負業者名：(株)中島工務店 一部一時中止あり 30日 (受託関係調整)		差	
															
今月作業：河床掘削(土砂搬出)、仮設工(水替工)等				今月作業：コンクリート堰堤本体工 等				今月作業：流路護岸工(巨石積)、残土処理工				今月作業：床固め工、根固め・水制工、道路付属施設工(水道管布設)等			
来月予定：河床掘削(土砂搬出)、コンクリート堰堤工 等				来月予定：土工(盛土、河床整形) 等				来月予定：流路護岸工(巨石積)、残土処理工				来月予定：床固め工、流路護岸工、擁壁工 等			
⑤（本川筋）		進 捗 率		⑥（中津川出張所管内）		進 捗 率		⑦（落合川流域）		進 捗 率				進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 アラクラ沢管理用道路工事		予定		工 事 名：令和3年度 中津川出張所管内整備工事		予定		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：		予定	
契 約 工 期：令和2年9月14日 ～ 令和4年2月28日 変更工期：令和4年8月31日		実施	53.9%	契 約 工 期：令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	3.0%	契 約 工 期：令和4年1月11日 ～ 令和4年8月31日		実施	3.4%	契 約 工 期：～		実施	
請負業者名：(株)中島工務店		差		請負業者名：(株)吉川工務店		差		請負業者名：(株)鳴海組		差		請負業者名：		差	
															
今月作業：地山補強土工(ルートパイル) 等				今月作業：中津川第2崩落箇所整備 等				今月作業：準備工、コンクリート堰堤工				今月作業：			
来月予定：キャッピングビーム工 等				来月予定：中津川第2崩落箇所整備 等				来月予定：コンクリート堰堤工				来月予定：			

令和4年1月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

③ 工事名： 令和2年度 庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事 工期： 令和3年4月5日 ～ 令和4年3月18日 施工業者：(株)吉川組 進捗率： 実施 88.5%	④ 工事名： 令和3年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事 工期： 令和3年5月28日 ～ 令和4年3月25日 施工業者：小池土木(株) 進捗率： 予定 75.4 %
市之倉地区 	
《今月作業》法面工、作業土工、砂防堰堤付属物設置工、流路護岸工 《3月作業》砂防堰堤付属物設置工、流路護岸工	《今月作業》コンクリート堰堤工、コンクリート側壁工、砂防土工、仮設工 《3月作業》仮設工、法面工、植栽工、砂防堰堤付属物設置工
⑤ 工事名： 令和3年度 妻木出張所管内整備工事 工期： 令和3年12月14日 ～ 令和4年11月30日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 実施 4.1%	工事名： 工期： 施工業者： 進捗率： 差
生田川遊砂工 	
《今月作業》指示2:【生田護岸】仮設工、指示4:【大平堰堤】取水作業、指示3:【小谷流路】伐採、土砂出し、指示5:【おりべ堰堤】照明設備 《3月作業》指示2:【生田護岸】 仮設工・撤去工・ブロック積、指示6:【おりべ堰堤】ワイヤーセンサー	《今月作業》 《3月作業》

令和4年 1月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)			②	令和2年度 木曽川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曽土建工業(株)			③	令和2年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			④	令和2年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)						
		進捗率(予定工程)		%		100.0	進捗率(予定工程)			%	96.8	進捗率(予定工程)		%	83.8	進捗率(予定工程)		%	95.4	
		R2.11.30～R3.11.30		週休2日		R3. 2. 8～R4. 3.22		週休2日		R3. 3.29～R4. 3.22		週休2日		R3. 4. 1～R4. 3.22		週休2日				
																				
今月作業	-				流路護岸工、仮設工、排水構造物工、構造物撤去工				コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠) コンクリート副堰堤工(差し筋・型枠) 除雪				掘削工・残土処理工							
来月予定	-				仮設工、構造物撤去工、舗装工				コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠・コンクリート打設) コンクリート副堰堤工(差し筋・型枠・コンクリート打設)				バブルサイレンサー試験施工・片付け							

	⑤	令和2年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑥	令和3年度 上松出張所整備工事 施工業者 大宗土建(株)			⑦	令和2年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)			⑧	令和3年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 大宗土建(株)						
		進捗率(予定工程)		%		93.6	進捗率(予定工程)			%	100.0	進捗率(予定工程)		%	91.3	進捗率(予定工程)		%	82.8	
		R3. 4. 1～R4. 3.22		週休2日		R3. 4. 1～R3.11.30		週休2日		R3. 4.28～R4. 1.31		週休2日		R3. 6. 10～R4. 3.25		週休2日				
																				
今月作業	構造物取壊し工、運搬処理工、仮設工				-				法面工・鉄筋挿入工				法面工 アンカー付き山留式擁壁工							
来月予定	運搬処理工、仮設工				-				法面工・仮設工				アンカー付き山留式擁壁工							

令和4年 1月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨	令和3年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			⑩	令和3年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑪	令和3年度 多治見電機通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)			⑫	令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)									
		進捗率(予定工程)		%		76.2	進捗率(予定工程)			%	100.0	進捗率(予定工程)		%	1.0	進捗率(予定工程)		%	2.0				
		R3. 6.22～R4. 3.25		週休2日		R3. 8. 2～R4. 2.28		週休2日、ICT		R3. 9.27～R4. 2.28		週休2日		R3.12. 1～R5. 1.31		週休2日、ICT							
														写真無し									
今月作業	道路土工(掘削工) 法面工(鉄筋挿入工・法面保護工)				-				準備工				準備工										
来月予定	道路土工(掘削工) 法面工(鉄筋挿入工・法面保護工) 砂防土工(盛土・土砂運搬)				-				無線局申請、中電パワーグリッド共架申請・県道規制申請書作成				仮設工 砂防土工										


	⑬	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)			⑭	令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			⑮	施工業者			⑯	施工業者						
		進捗率(予定工程)		%		13.5	進捗率(予定工程)			%	1.2	進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%		
		R3.12. 1～R4.11.30		週休2日		R3.12. 6～R4. 7.29		週休2日、CIM、ICT												
																				
今月作業	滑川伐採木処理(指示1) 滑川資材運搬路整備(指示4) 十王沢町道整備(指示7)				仮設工、起工測量															
来月予定	滑川伐採木処理(指示1) 滑川資材運搬路整備(指示4) 十王沢町道整備(指示7)				仮設工、伐採、産廃運搬処分															

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(上) 32.63kp～32.62kp 道路付属物復旧工
工 期：令和02年10月30日～令和05年10月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp
R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

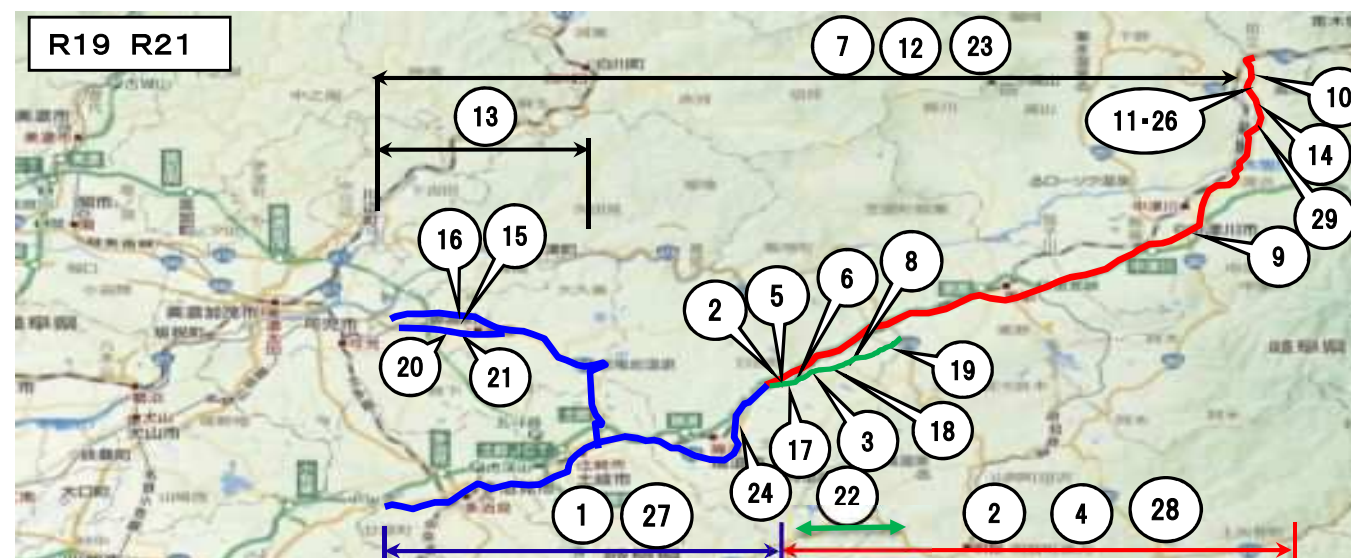

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号74.000kp(上) 応急処理工(中央草処理)
工 期：令和02年04月01日～令和04年10月31日
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

③



工 期：令和02年05月11日～令和03年07月2日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

完

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

④



恵那工区 緑石工、舗装工、信号機工、構造物撤去工
工 期：令和02年07月01日～令和04年03月28日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市～中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

⑤



道路土工 排水構造物工 道路付属物工
工 期：令和02年09月03日～令和04年3月11日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑥



4号横断函渠工
工 期：令和02年09月04日～令和04年02月28日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事

⑦



道路情報表示設備工
工 期：令和02年08月24日～令和03年08月31日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

完

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑧



(1工区)擁壁工、排水構造物工(2工区)準備工
工 期：令和02年10月23日～令和04年03月11日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

⑨



工 期：令和2年10月14日～令和3年07月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

完

令和2年度多治見国道整備工事

⑩



工 期：令和2年10月17日～令和3年12月15日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

完

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事

⑪



工 期：令和2年12月22日～令和03年09月10日
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

完

令和2年度多治見国道橋梁補修工事

⑫



瑞浪工区 構造物撤去工 仮設工
工 期：令和3年03月22日～令和4年3月2日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

令和2年度多治見国道西部整備工事

⑬



法面工

工 期：令和3年03月25日～令和4年3月29日
 施工業者：(株)藤本組
 施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

⑭



地山補強土工(2号、3号)

工 期：令和02年03月29日～令和04年3月28日
 施工業者：(株)加藤工務店
 施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事

⑮



現場完了

工 期：令和02年03月29日～令和04年02月17日
 施工業者：徳倉建設(株)
 施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事

⑯



検査書類作成

工 期：令和02年03月25日～令和04年02月25日
 施工業者：飛鳥建設(株)
 施工箇所：可児郡御嵩町地先

令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事

⑰



舗装工、地盤改良工、圃場整備、法面工

工 期：令和03年05月10日～令和04年03月23日
 施工業者：(株)吉川工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事

⑱



A1橋台工・排水構造物工

工 期：令和03年05月10日～令和04年02月25日
 施工業者：(株)鳴海組
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑲



カルバート工(2-18号横断函渠)

工 期：令和03年05月11日～令和04年03月31日
 施工業者：恵中建設(株)
 施工箇所：恵那市武並町地先

令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事

⑳



排水構造物工、縁石工、防護柵工、道路付属施設工、舗装工

工 期：令和03年05月19日～令和04年03月18日
 施工業者：(株)市川工務店
 施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事

㉑



舗装工、排水構造物工、縁石工、道路付属施設工

工 期：令和03年04月15日～令和04年03月18日
 施工業者：大有建設(株)
 施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和3年度瑞浪恵那道路整備工事

㉒



2号テラセル工(機能補償道路)

工 期：令和03年05月28日～令和04年03月18日
 施工業者：(株)中島工務店
 施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～釜戸町地内

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

㉓



機器製作

工 期：令和03年08月17日～令和04年03月31日
 施工業者：松栄電子工業(株)
 施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

㉔



仮設工 橋脚巻立て工

工 期：令和03年09月13日～令和04年06月30日
 施工業者：(株)吉川工務店
 施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

㉕



道路土工・掘削

工 期：令和03年09月13日～令和04年02月28日
 施工業者：鳴海組
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和3年度 多治見国道車両計測設備修繕工事

㉖



準備工、製作工

工 期：令和03年09月03日～令和04年02月28日
 施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
 施工箇所：中津川市山口地先

令和3年度 多治見国道西部除雪作業

㉗



凍結防止工

工 期：令和03年11月15日～令和04年03月31日
 施工業者：(株)吉川組
 施工箇所：春日井市～瑞浪市(R19.R21)

28

令和3年度 多治見国道東部除雪作業



凍結防止剤散布 (C)・(D)

工 期：令和03年11月15日～令和04年03月31日

施工業者：(株)加藤工務店

施工箇所：瑞浪市土岐町～長野県木曽郡木曽町田立

29

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事



準備工

工 期：令和03年11月9日～令和04年03月31日

施工業者：(株)吉川工務店

施工箇所：岐阜県中津川市落合

