

令和4年2月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率		②（中津川流域）		進 捗 率		③（中津川流域）		進 捗 率		④（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事 ※令和4年3月29日まで工事の(一部)一時中止		予定		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事		予定		工 事 名：令和2年度 木曽川水系 川上流路工事		予定	
契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年3月30日		実施	32.3%	契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年3月25日		実施	98.8%	契 約 工 期：令和3年8月18日 ～ 令和4年3月31日		実施	93.0%	契 約 工 期：令和2年9月1日 ～ 令和4年3月31日 変更予定工期：令和4年8月31日		実施	56.6%
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差	
															
今月作業：河床掘削(土砂搬出)、仮設工(水替工)等				今月作業：土工(盛土、河床整形)等				今月作業：流路護岸工(巨石積)、残土処理工				今月作業：床固め工、流路護岸工、擁壁工等			
来月予定：河床掘削(土砂搬出)等				来月予定：法面工(種子付きわら伏せ)、後片付け				来月予定：流路護岸工(張りコンクリート)、後片付け				来月予定：床固め工、流路護岸工、排水構造物工等			
⑤（本川筋）		進 捗 率		⑥（中津川出張所管内）		進 捗 率		⑦（落合川流域）		進 捗 率				進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 アクラ沢管理用道路工事		予定		工 事 名：令和3年度 中津川出張所管内整備工事		予定		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定		工 事 名：		予定	
契 約 工 期：令和2年9月14日 ～ 令和4年8月31日		実施	55.9%	契 約 工 期：令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	10.9%	契 約 工 期：令和4年1月11日 ～ 令和4年8月31日		実施	22.0%	契 約 工 期：～		実施	
請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）吉川工務店		差		請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：		差	
												令和3年度木曽川水系薬師沢・冷川砂防堰堤工事(吉川工務店)			
				中津川第2崩落箇所整備								令和3年度木曽川水系下平次砂防堰堤改築工事(加藤工務店)			
												令和3年度木曽川水系中津川護岸整備工事(加藤工務店)			
今月作業：キャッピングピーム工				今月作業：中津川第2崩落箇所整備等				今月作業：コンクリート堰堤工				今月作業：			
来月予定：キャッピングピーム工				来月予定：中津川第2崩落箇所整備等				来月予定：コンクリート堰堤工				来月予定：			

令和4年2月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

③
工 事 名： 令和2年度
庄内川水系 一の洞第2砂防堰堤工事
工 期： 令和3年4月5日 ～ 令和4年3月18日
施工業者：(株)吉川組
進 捗 率： 実施 98.6%



《今月作業》 砂防堰堤付属物設置工 流路付属物設置工
《4月作業》 完成

④
工 事 名： 令和3年度
庄内川水系 妻木管内砂防施設改築工事
工 期： 令和3年5月28日 ～ 令和4年3月25日
施工業者：小池土木(株)
進 捗 率： 実施 95.8 %

市之倉地区



《今月作業》 仮設工、植栽工、砂防堰堤付属物設置工
《4月作業》 完成

⑤
工 事 名： 令和3年度
妻木出張所管内整備工事
工 期： 令和3年12月14日 ～ 令和4年11月30日
施工業者：(株)藤本組
進 捗 率： 実施 17.2%

大平堰堤



【指示2:生田護岸】仮設工、構造物撤去【指示3:小谷流路】土砂撤去【指示5:おりべ堰堤】
《今月作業》 照明設備【指示6:おりべ堰堤】ワイヤーセンサー【指示7:一の洞整備他】溝掘伐採、一の洞階段
《4月作業》 【指示2:生田護岸】構造物撤去、ブロック積、土砂撤出【指示9:市之倉里山整備他】展望台整備、階段

工 事 名：
工 期：
施工業者：
進 捗 率： 差

《今月作業》
《4月作業》

令和4年 2月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)			②	令和2年度 木曽川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曽土建工業(株)			③	令和2年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			④	令和2年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)						
		進捗率(予定工程)		%		100.0	進捗率(予定工程)			%	100.0	進捗率(予定工程)		%	93.4	進捗率(予定工程)		%	99.5	
		R2.11.30～R3.11.30		週休2日		R3. 2. 8～R4. 3.22		週休2日		R3. 3.29～R4. 3.22		週休2日		R3. 4. 1～R4. 3.22		週休2日				
																				
今月 作業	-				2月25日完成検査				コンクリート堰堤本体工(差し筋・型枠・コンクリート打設) コンクリート副堰堤工(差し筋・型枠・コンクリート打設)				試験施工(バブルサイエンサー)							
来月 予定	-				-				コンクリート堰堤本体工(コンクリート打設・脱枠) コンクリート副堰堤工(コンクリート打設・脱枠) 作業土工(埋戻し)・仮設				3月9日完成検査							
	⑤	令和2年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)			⑥	令和3年度 上松出張所整備工事 施工業者 大宗土建(株)			⑦	令和2年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)			⑧	令和3年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 大宗土建(株)						
		進捗率(予定工程)		%		99.5	進捗率(予定工程)			%	100.0	進捗率(予定工程)		%	93.8	進捗率(予定工程)		%	87.5	
		R3. 4. 1～R4. 3.22		週休2日		R3. 4. 1～R3.11.30		週休2日		R3. 4.28～R4. 3.22		週休2日		R3. 6. 10～R4. 3.25		週休2日				
																				
今月 作業	構造物撤去工、仮設工				-				法面工・仮設工				アンカー付山留式擁壁工 路側防護柵工 防護柵基礎工							
来月 予定	準備工				-				法面工・仮設工・片付け				路側防護柵工 植生基材吹付工							

令和4年 2月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨	令和3年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			⑩	令和3年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑪	令和3年度 多治見電機通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)			⑫	令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)									
		進捗率(予定工程)		%		93.7	進捗率(予定工程)			%	100.0	進捗率(予定工程)		%	1.1	進捗率(予定工程)		%	3.5				
		R3. 6.22～R4. 3.25		週休2日		R3. 8. 2～R4. 2.28		週休2日、ICT		R3. 9.27～R4. 2.28		週休2日		R3.12. 1～R5. 1.31		週休2日、ICT							
																							
今月作業	道路土工(掘削工) 法面工(鉄筋挿入工・法面保護工) 砂防土工(盛土・土砂運搬)				-				大桑村 空中線柱建柱作業				仮設工 砂防土工 床固め工										
来月予定	道路土工(掘削工) 法面工(植生基材吹付) 砂防土工(盛土・土砂運搬)				-				無線申請、工場立会検査				床固め工										


	⑬	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)			⑭	令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			⑮	施工業者			⑯	施工業者						
		進捗率(予定工程)		%		23.0	進捗率(予定工程)			%	15.1	進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%		
		R3.12. 1～R4.11.30		週休2日		R3.12. 6～R4. 7.29		週休2日、CIM、ICT												
																				
今月作業	滑川伐採木処理(指示1) 滑川資材運搬路整備(指示4) 十王沢町道整備(指示7) 滑川河床整理(指示8)				仮設工、伐採、産廃運搬処分															
来月予定	滑川河床整理(指示8) 敬神の滝整備(指示9)				仮設工、伐採、産廃運搬処分、道路土工															

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21号(上下) 11.90kp~12.30kp 舗装修繕工
工 期：令和02年10月30日~令和05年10月31日
施工業者：日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所：R19 31.5kp~55.2kp
R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP

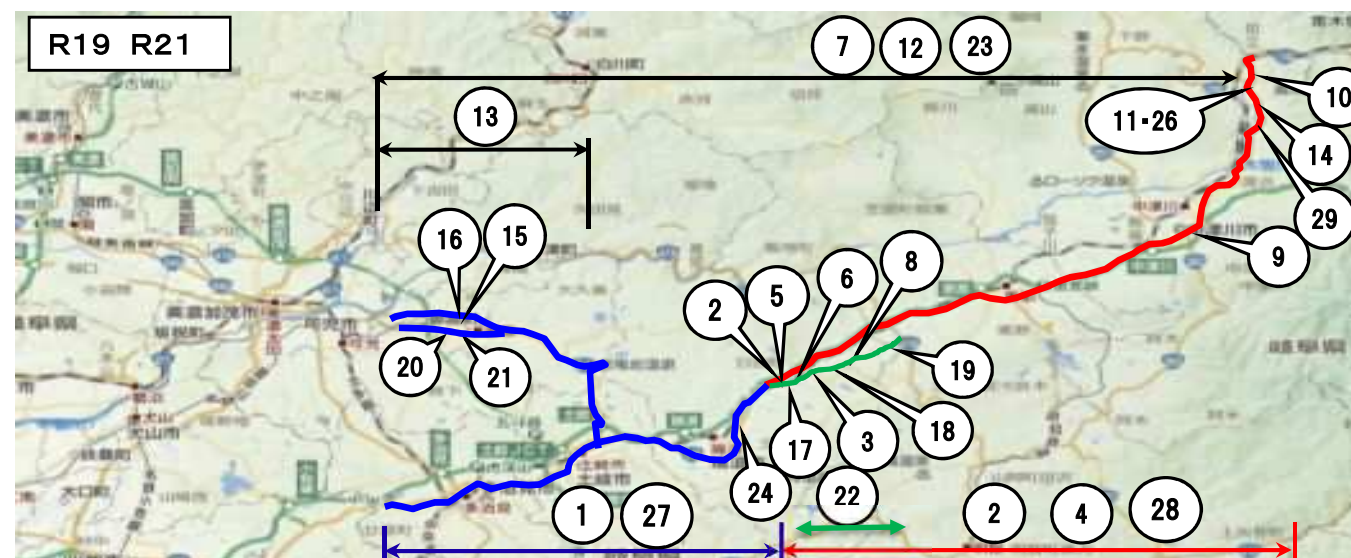

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号84.050kp(上) 防草対策工(つるガード処理)
工 期：令和02年04月01日~令和04年10月31日
施工業者：(有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所：R19 55.2kp~97.0kp

令和元年度瑞浪恵那道路公文垣地区道路建設工事

③



工 期：令和02年05月11日~令和03年07月2日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

完

令和2年度 多治見国道交通事故対策工事

④



恵那工区 舗装工、防護柵工、区画線工、橋梁付属物工
工 期：令和02年07月01日~令和04年03月28日
施工業者：セントラル建設(株)
施工箇所：瑞浪市~中津川市地先

令和2年度 瑞浪恵那道路下沢地区下部工事

⑤



道路土工 法面工 道路付属物工
工 期：令和02年09月03日~令和04年03月11日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑥



4号横断函渠工
工 期：令和02年09月04日~令和04年05月31日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道通信設備工事

⑦



道路情報表示設備工
工 期：令和02年08月24日~令和03年08月31日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

完

令和2年度瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑧



(1工区)道路土工、準備工(2工区)準備工
工 期：令和02年10月23日~令和04年03月18日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度多治見国道四ツ目川右岸耐震補強工事

⑨



工 期：令和02年10月14日~令和03年07月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：岐阜県中津川市中津川地先

完

令和2年度多治見国道整備工事

⑩



工 期：令和02年10月17日~令和03年12月15日
施工業者：板垣建設(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

完

令和2年度多治見国道車両計測設備修繕工事

⑪



工 期：令和02年12月22日~令和03年09月10日
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

完

令和2年度多治見国道橋梁補修工事

⑫



工 期：令和03年03月22日~令和04年03月2日
施工業者：(株)梅田組
施工箇所：多治見砂防国道事務所管内

完

令和2年度多治見国道西部整備工事

⑬



法面工

工 期：令和3年03月25日～令和4年3月29日
施工業者：(株)藤本組
施工箇所：土岐市泉～可児市中恵土地内

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

⑭



地山補強土工(2号)

工 期：令和02年03月29日～令和04年3月28日
施工業者：(株)加藤工務店
施工箇所：岐阜県中津川市山口地先

令和2年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事

⑮



工 期：令和02年03月29日～令和04年02月17日
施工業者：徳倉建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

完

令和2年度多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事

⑯



工 期：令和02年03月25日～令和04年02月25日
施工業者：飛鳥建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地先

完

令和2年度瑞浪恵那道路公文垣内地区道路建設工事

⑰



地盤改良工、圃場整備、法面工、排水構造物工
工 期：令和03年05月10日～令和04年03月23日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路中切地区道路建設工事

⑱



A1橋台工・排水構造物工

工 期：令和03年05月10日～令和04年03月28日
施工業者：(株)鳴海組
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑲



カルバート工(2-18号横断函渠)

工 期：令和03年05月11日～令和04年03月31日
施工業者：恵中建設(株)
施工箇所：恵那市武並町地先

令和2年度可児御嵩バイパス古屋敷地区舗装工事

⑳



排水構造物工、縁石工、防護柵工、道路付属施設工、舗装工
工 期：令和03年05月19日～令和04年03月18日
施工業者：(株)市川工務店
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和2年度可児御嵩バイパス御嵩地区舗装工事

㉑



舗装工、排水構造物工、縁石工、道路付属施設工
工 期：令和03年04月15日～令和04年03月18日
施工業者：大有建設(株)
施工箇所：可児郡御嵩町地内

令和3年度瑞浪恵那道路整備工事

㉒



下層路盤工(機能補償道路)

工 期：令和03年05月28日～令和04年03月18日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～釜戸町地内

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

㉓



機器製作

工 期：令和03年08月17日～令和04年03月31日
施工業者：松栄電子工業(株)
施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

㉔



橋脚巻立て工

工 期：令和03年09月13日～令和04年06月30日
施工業者：(株)吉川工務店
施工箇所：瑞浪市土岐町地先

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

㉕



道路土工・掘削

工 期：令和03年09月13日～令和04年06月28日
施工業者：鳴海組
施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

令和3年度 多治見国道車両計測設備修繕工事

㉖



工 期：令和03年09月03日～令和04年02月28日
施工業者：オムロンフィールドエンジニアリング(株)
施工箇所：中津川市山口地先

完

令和3年度 多治見国道西部除雪作業

㉗



凍結防止工

工 期：令和03年11月15日～令和04年03月31日
施工業者：(株)吉川組
施工箇所：春日井市～瑞浪市(R19.R21)

②8

令和3年度 多治見国道東部除雪作業



凍結防止剤散布 (C)・(D)

工 期：令和03年11月15日～令和04年03月31日

施工業者：(株)加藤工務店

施工箇所：瑞浪市土岐町～長野県木曽郡木曽町田立

②9

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事



準備工

工 期：令和03年11月9日～令和04年03月31日

施工業者：(株)吉川工務店

施工箇所：岐阜県中津川市落合

