

令和4年3月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率	②（中津川流域）		進 捗 率	③（中津川流域）		進 捗 率	④（中津川流域）		進 捗 率
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定 51.7%	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 下平次第8砂防堰堤改築工事		予定 100.0%	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川第2護岸整備工事		予定 100.0%	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 川上流路工事		予定 66.5%
契 約 工 期： 令和3年4月20日 ～ 令和4年11月7日		実施	契 約 工 期： 令和3年4月20日 ～ 令和4年3月25日		実施	契 約 工 期： 令和3年8月18日 ～ 令和4年3月31日		実施	契 約 工 期： 令和3年9月1日 ～ 令和4年8月31日		実施
請負業者名：（株）鳴海組		差	請負業者名：（株）加藤工務店		差	請負業者名：（株）加藤工務店		差	請負業者名：（株）中島工務店		差
											
			完了			完了					
今月作業：河床掘削（土砂搬出）等			今月作業：法面工（種子付きわら伏せ）、後片付け			今月作業：流路護岸工（張りコンクリート）、後片付け			今月作業：床固め工、流路護岸工、排水構造物工 等		
来月予定：河床掘削（土砂搬出）等			来月予定：完了			来月予定：完了			来月予定：床固め工、流路護岸工、排水構造物工 構造物撤去工等		
⑤（本川筋）		進 捗 率	⑥（中津川出張所管内）		進 捗 率	⑦（落合川流域）		進 捗 率	⑧（落合川流域）		進 捗 率
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 アラクラ沢管理用道路工事		予定 62.1%	工 事 名：令和3年度 中津川出張所管内整備工事		予定 ー	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定 64.4%	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事		予定 0.0%
契 約 工 期： 令和2年9月14日 ～ 令和4年8月31日		実施	契 約 工 期： 令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	契 約 工 期： 令和4年1月11日 ～ 令和4年8月31日		実施	契 約 工 期： 令和4年3月14日 ～ 令和5年2月28日		実施
請負業者名：（株）中島工務店		差	請負業者名：（株）吉川工務店		差	請負業者名：（株）鳴海組		差	請負業者名：（株）吉川工務店		差
									準備工		
今月作業：キャッピングビーム工			今月作業：島田川公園整備 等			今月作業：コンクリート堰堤工					今月作業：準備工
来月予定：キャッピングビーム工、補強土壁工 等			来月予定：柳樽川土砂撤去 等			来月予定：コンクリート堰堤工			来月予定：準備工、コンクリート堰堤工（馬籠地区 薬師沢）		

令和4年3月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工 事 名 : 令和3年度 妻木出張所管内整備工事 工 期 : 令和3年12月14日 ~ 令和4年11月30日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率 : 予定 30.0% 実施 差 指示:2生田護岸  指示:3生田小谷流路  指示:5おりべ堰堤照明  《今月作業》【指示:2生田護岸】ブロック積工・仮設工 【指示:6一の洞歩道他】階段工・防止柵工 《5月作業》【指示:6一の洞歩道他】階段工、【指示:7里山林道整備】土留め工 【指示:8富士下堰堤下流整備】除草	② 工 事 名 : 令和3年度 庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事 工 期 : 令和4年3月28日 ~ 令和5年2月28日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率 : 予定 0% 実施 差 準備中 《今月作業》準備工、施工計画 《5月作業》
③ 工 事 名 : 工 期 : 施工業者: 進 捗 率 : 予定 実施 差 《今月作業》 《5月作業》	④ 工 事 名 : 工 期 : 施工業者: 進 捗 率 : 予定 実施 差 《今月作業》 《5月作業》

令和4年 3月末 上松出張所 工事進捗状況

94	①	令和2年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	令和2年度 木曽川水系 下洞沢流路工事 施工業者 木曽土建工業(株)	令和2年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	令和2年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)
		進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %
		R2.11.30～R3.11.30 週休2日	R3. 2. 8～R4. 3.22 週休2日	R3. 3.29～R4. 3.22 週休2日	R3. 4. 1～R4. 3.22 週休2日
					
今月作業		-	-	3月24日完成検査	3月9日完成検査
来月予定		-	-	-	-
94	⑤	令和2年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 大宗土建(株)	令和3年度 上松出張所整備工事 施工業者 大宗土建(株)	令和2年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 施工業者 神稲建設(株)	令和3年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 大宗土建(株)
		進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %
		R3. 4. 1～R4. 3.22 週休2日	R3. 4. 1～R3.11.30 週休2日	R3. 4.28～R4. 3.22 週休2日	R3. 6. 10～R4. 3.25 週休2日
					
今月作業		3月22日完成検査	-	3月30日完成検査	3月29日完成検査
来月予定		-	-	-	-

令和4年 3月末 上松出張所 工事進捗状況

55	⑨	令和3年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)	⑩	令和3年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)	⑪	令和3年度 多治見電機通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)	⑫	令和3年度 木曽川水系 下在蛇沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %
		R3. 6.22～R4. 3.25 週休2日		R3. 8. 2～R4. 2.28 週休2日、ICT		R3. 9.27～R4. 6.30 週休2日		R3.12. 1～R5. 1.31 週休2日、ICT
								
今月作業		3月24日完成検査		-		宮戸沢web camera 取付(仮設)		5号床固め工
来月予定		-		-		中津川出、Vo-ip GW移設他、工場立会検査		5号床固め工 5号側壁工 流路護岸工
56	⑬	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)	⑭	令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)	⑮	令和3年度 木曽川水系 和合蛇沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)	⑯	令和3年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %
		R3.12. 1～R4.11.30 週休2日		R3.12. 6～R4. 7.29 週休2日、CIM、ICT		R4. 4. 1～R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT		R4. 5. 2～R5. 2.28
							写真無し	
今月作業		滑川(北股沢)河床整備(指示8) 矢垂沢整備(指示9) 敬神の滝周辺整備(指示10)		仮設工、伐採、産廃運搬処分、道路土工		3月 1日契約		3月 8日契約
来月予定		十王沢町道整備(指示7) 敬神の滝周辺整備(指示9) 滑川伐採(指示11)		仮設工、伐採、産廃運搬処分、道路土工		施工計画 準備工		-

令和4年 3月末 上松出張所 工事進捗状況


⑪	令和3年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事								
	施工業者 木曾土建工業(株)								
	進捗率(予定工程) %								
	R4. 5.10～R5. 2.28								
	写真無し								
今月 作業	3月18日契約								
来月 予定	-								
今月 作業									
来月 予定									

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21号(上下) 13.40kp 中切横断歩道橋補修工
工 期: 令和02年10月30日～令和05年10月31日
施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)
施工箇所: R19 31.5kp～55.2kp
R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP
進捗率: 予定 65.9% 実績

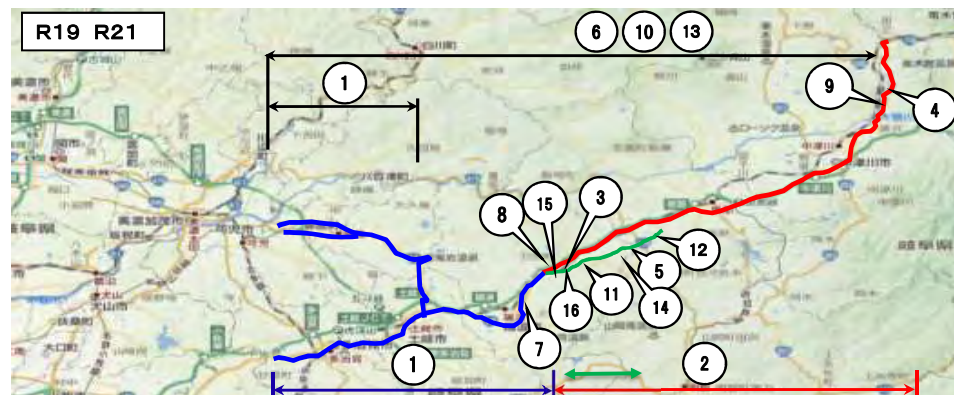

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号84.050kp(上) 防草対策工(つるが'ト'処理)
工 期: 令和02年04月01日～令和04年10月31日
施工業者: (有)木曾ハイウェイサービス
施工箇所: R19 55.2kp～97.0kp
進捗率: 予定95.0% 実績

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事


③



4号横断渠工
工 期: 令和02年09月04日～令和04年05月31日
施工業者: 板垣建設(株)
施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
進捗率: 予定 91.1% 実績

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2号)
工 期: 令和02年03月29日～令和04年7月28日
施工業者: (株)加藤工務店
施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先
進捗率: 予定 75.4% 実績

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



カルバート工 道路土工 排水構造物工
工 期: 令和03年05月11日～令和04年06月3日
施工業者: 恵中建設(株)
施工箇所: 恵那市武並町地先
進捗率: 予定 63.7% 実績

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



CCTV設備工(落合Webカメラ)
工 期: 令和03年08月17日～令和04年07月8日
施工業者: 松栄電子工業(株)
施工箇所: 多治見市～中津川市一本松地先
進捗率: 予定 20.5% 実績

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

⑦



橋脚巻立て工
工 期: 令和03年09月13日～令和04年06月30日
施工業者: (株)吉川工務店
施工箇所: 瑞浪市土岐町地先
進捗率: 予定 80.96% 実績

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



道路土工・法面工・排水構造物工・緑石工・防護柵工・構造物撤去工
工 期: 令和03年09月13日～令和04年06月28日
施工業者: 鳴海組
施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
進捗率: 予定 38.8% 実績

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



仮排水管・進入路工
工 期: 令和03年11月9日～令和04年08月31日
施工業者: (株)吉川工務店
施工箇所: 岐阜県中津川市落合
進捗率: 予定 25.9% 実績

令和3年度 多治見国道橋梁補修工事


⑩



準備工
工 期: 令和04年3月30日～令和04年12月23日
施工業者: (株)梅田組
施工箇所: 中津川地区(東栗橋・前川橋) 恵那地区(長島第2道専用橋)
進捗率: 予定 0.0% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事


⑪



準備工
工 期: 令和04年03月31日～令和05年03月24日
施工業者: (株)中島工務店
施工箇所: 恵那市武並町
進捗率: 予定 0% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



準備工
工 期: 令和04年04月01日～令和05年02月28日
施工業者: (株)中島工務店
施工箇所: 瑞浪市釜戸町
進捗率: 予定 0% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事 ⑬ 写真 準備工 工 期：令和04年04月01日～令和05年2月28日 施工業者：（株）青協建設（株） 施工箇所：瑞浪市釜戸町 進 捗 率：予定 0% 実績	令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事 ⑭ 写真 準備工 工 期：令和04年04月04日～令和05年02月28日 施工業者：（株）市川工務店 施工箇所：瑞浪市土岐町 進 捗 率：予定 0% 実績	令和3年度 多治見国道道路照明設備工事 ⑮ 写真 準備工 工 期：令和04年04月17日～令和05年02月28日 施工業者：（株）清水電気商会 施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内 進 捗 率：予定 0% 実績	令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事 ⑯ 写真 準備工 工 期：令和04年04月30日～令和04年12月28日 施工業者：（株）加藤工務店 施工箇所：中津川市山口 進 捗 率：予定 0% 実績	⑰ 工 期： 施工業者： 施工箇所： 進 捗 率：予定 0% 実績
⑱	⑲	⑳	㉑	㉒
㉓	㉔	㉕	㉖	㉗
