

令和4年5月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率		②（中津川流域）		進 捗 率		③（本川筋）		進 捗 率		④（中津川出張所管内）		進 捗 率	
工 事 名：令和2年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定 64.7%		工 事 名：令和3年度 木曾川水系 川上流路工事		予定 77.6%		工 事 名：令和3年度 木曾川水系 アクラ沢管理用道路工事		予定 90.0%		工 事 名：令和3年度 中津川出張所管内整備工事		予定 48.2%	
契約工期： 令和3年4月20日 ～ 令和4年11月7日		実施		契約工期： 令和3年9月1日 ～ 令和4年8月31日		実施		契約工期： 令和2年9月14日 ～ 令和4年8月31日		実施		契約工期： 令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）吉川工務店		差	
															
今月作業：工事用道路工、仮水路工 等				今月作業：床固め工、流路護岸工、横造物撤去工、舗装工、根固め・水制工 等				今月作業：帯鋼補強土壁工 等				今月作業：砂防教室補助、中津川第2残土受入れ地、松尾谷管理用道路 等			
来月予定：仮水路工、砂防仮締切工 等				来月予定：流路護岸工、根固め・水制工、道路付属施設工等				来月予定：帯鋼補強土壁工、プレキャスト擁壁工 等				来月予定：中津川第2残土受入れ地、松尾谷管理用道路、本谷崩落土砂防止柵工 等			
⑤（落合川流域）		進 捗 率		⑥（落合川流域）		進 捗 率		⑦（中津川流域）		進 捗 率					
工 事 名：令和3年度 木曾川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定 100.0%		工 事 名：令和3年度 木曾川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事		予定 17.0%		工 事 名：令和3年度 木曾川水系 中津川護岸整備工事		予定 7.0%					
契約工期： 令和4年1月11日 ～ 令和4年8月31日		実施		契約工期： 令和4年3月14日 ～ 令和5年2月28日		実施		契約工期： 令和4年4月25日 ～ 令和5年2月28日		実施					
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）吉川工務店		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差					
															
				馬籠地区 薬師沢				神坂地区 冷川							
今月作業：コンクリート堰堤工、仮排水撤去、後片付け等				今月作業：砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工 等（馬籠地区 薬師沢）				今月作業：多自然型護岸工（張りコンクリート） 等				今月作業：多自然型護岸工（張りコンクリート） 等			
来月予定：完了				来月予定：砂防土工、コンクリート堰堤工、擁壁工、仮設工 等（馬籠地区 薬師沢）				来月予定：多自然型護岸工（張りコンクリート） 等				来月予定：多自然型護岸工（張りコンクリート） 等			

令和4年5月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑧ (四ツ目川流域)		進捗率				進捗率				進捗率			
工事名：令和3年度 木曾川水系 下平次砂防堰堤改築工事		予定	0,1%	工事名：		予定		工事名：		予定		工事名：	
契約工期：令和4年5月10日 ~ 令和5年2月28日		実施		契約工期：		実施		契約工期：		実施		契約工期：	
請負業者名：(株)加藤工務店		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：	
													
今月作業：準備工				今月作業：				今月作業：				今月作業：	
来月予定：コンクリート堰堤本体工、構造物取壊し工 等				来月予定：				来月予定：				来月予定：	
		進捗率				進捗率				進捗率			
工事名：		予定		工事名：		予定		工事名：		予定		工事名：	
契約工期：		実施		契約工期：		実施		契約工期：		実施		契約工期：	
請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：	
今月作業：				今月作業：				今月作業：				今月作業：	
来月予定：				来月予定：				来月予定：				来月予定：	

令和4年5月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工事名： 令和3年度 妻木出張所管内整備工事 工期： 令和3年12月14日 ～ 令和4年11月30日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 予定 50.0 % 実施 差	② 工事名： 令和3年度 庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事 工期： 令和4年3月28日 ～ 令和5年2月28日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 予定 6.9 % 実施 差
《今月作業》 指示:7【一の洞歩道整備】階段工 【砂防教室準備・片付け】 《7月作業》 指示:7【一の洞歩道整備】防止柵工 【砂防教室準備・片付け】	《今月作業》 【町地区】準備工(家屋調査、工事用道路構築) 【一の洞地区】道路土工、排水構築物工 《7月作業》 【町地区】工事用道路構築、本体伐採 【一の洞地区】準備工
③ 工事名： 令和4年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事 工期： 令和4年6月1日 ～ 令和5年3月24日 施工業者：(株)吉川組 進捗率： 予定 00.0 % 実施 差 0.0%	④ 工事名： 工期： 施工業者： 進捗率： 差
準備工	
《今月作業》 施工計画、設計照査 《7月作業》 測量・丁張 工事用道路作成	《今月作業》 《7月作業》

令和4年 5月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 令和3年度 多治見電機通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株) 進捗率(予定工程) % R3. 9.27～R4. 6.30 週休2日	② 令和3年度 木曽川水系 下在蛇沢沢流路工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % R3.12. 1～R5. 1.31 週休2日、ICT	③ 令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % R3.12. 1～R4.11.30 週休2日	④ 令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % R3.12. 6～R4. 7.29 週休2日、CIM、ICT
				
	今月作業 仮想サーバ更新、テレマ工場立会検査	今月作業 流路護岸工 仮設工	今月作業 伐採工、作業道作成、産業廃棄物運搬・処分(指示11)	今月作業 仮設工、伐採、産業運搬処分、道路土工
	来月予定 多治見砂防国道事務所気象観測システム仮想サーバ取込 保古山4.9G無線取付	来月予定 法面工 わら伏せ工・植生基材吹付工 砂防土工 掘削・残土運搬・転石破碎	来月予定 ・産業廃棄物運搬・処分(指示11) ・排水構造物工、舗装工(指示13)	来月予定 仮設工、産業運搬処分、道路土工、排水構造物工
	⑤ 令和3年度 木曽川水系 和合蛇沢沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % R4. 4. 1～R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT	⑥ 令和3年度 木曽川水系 蒲川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % R4. 5. 2～R5. 2.28 週休2日	⑦ 令和3年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曾土建工業(株) 進捗率(予定工程) % R4. 5.10～R5. 2.28 週休2日	⑧ 令和4年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % R4. 6. 2～R5. 3.24 週休2日
				
	今月作業 準備工・舗装工	今月作業 準備工(書類作成等)	今月作業 準備工	今月作業 -
	来月予定 掘削工	来月予定 準備工、仮設工、土工、構造物撤去工	来月予定 構造物撤去工、仮設工	来月予定 施工計画書

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①




19号(下) 35.45kp 防草シート設置

工 期: 令和02年10月30日～令和05年10月31日

施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)

施工箇所: R19 31.5kp～55.2kp

R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

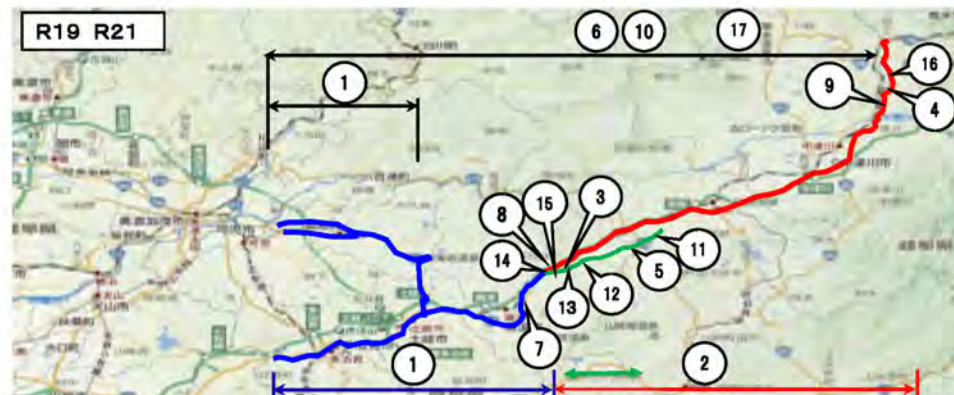

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号77.520kp(下) 事故復旧工(ガードレール復旧)

工 期: 令和02年04月01日～令和04年10月31日

施工業者: (有)木曾ハイウェイサービス

施工箇所: R19 55.2kp～97.0kp

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

③



4号横断函渠工

工 期: 令和02年09月04日～令和04年05月31日

施工業者: 板垣建設(株)

施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

完

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2号)

工 期: 令和02年03月29日～令和04年7月28日

施工業者: (株)加藤工務店

施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



道路土工 準備工 排水構造物工

工 期: 令和03年05月11日～令和04年12月15日

施工業者: 恵中建設(株)

施工箇所: 恵那市武並町地先

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



CCTV設備工

工 期: 令和03年08月17日～令和04年07月8日

施工業者: 松栄電子工業(株)

施工箇所: 多治見市～中津川市一本松地先

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

⑦



橋脚巻立て工

工 期: 令和03年09月13日～令和04年06月30日

施工業者: (株)吉川工務店

施工箇所: 瑞浪市土岐町地先

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



法面工・舗装工・防護欄工・標識工・道路付属施設工

工 期: 令和03年09月13日～令和04年06月28日

施工業者: 鳴海組

施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



地盤改良工、重力式擁壁工

工 期: 令和03年11月9日～令和04年08月31日

施工業者: (株)吉川工務店

施工箇所: 岐阜県中津川市落合

令和3年度 多治見国道橋梁補修工事

⑩



仮設工 足場工

工 期: 令和04年3月30日～令和04年12月23日

施工業者: (株)梅田組

施工箇所: 恵那市、中津川市、御嵩町

令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事

⑪



準備工

工 期: 令和04年03月31日～令和05年03月24日

施工業者: (株)中島工務店

施工箇所: 恵那市武並町

令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



仮設工 仮設道路工

工 期: 令和04年04月01日～令和05年02月28日

施工業者: (株)中島工務店

施工箇所: 瑞浪市釜戸町

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑬



準備工

工 期：令和04年04月01日～令和05年2月28日

施工業者：（株）青協建設（株）

施工箇所：瑞浪市釜戸町

令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑭



仮設工（法面保護工）

工 期：令和04年04月04日～令和05年02月28日

施工業者：（株）市川工務店

施工箇所：瑞浪市土岐町

令和3年度 多治見国道道路照明設備工事

⑮

準備工

工 期：令和04年03月09日～令和05年02月28日

施工業者：（株）清水電気商会

施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事

⑯



準備工

工 期：令和04年04月30日～令和04年12月28日

施工業者：（株）加藤工務店

施工箇所：中津川市山口

令和4年度 多治見国道標識工事

⑰

写真

工 期：令和04年06月16日～令和05年02月28日

施工業者：（株）キクテック

施工箇所：瑞浪出張所管内

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗
