

令和4年6月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率		②（中津川流域）		進 捗 率		③（本川筋）		進 捗 率		④（中津川出張所管内）		進 捗 率	
工 事 名：令和2年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定 70.1%		工 事 名：令和3年度 木曾川水系 川上流路工事		予定 92.2%		工 事 名：令和3年度 木曾川水系 アラクラ沢管理用道路工事		予定 94.7%		工 事 名：令和3年度 中津川出張所管内整備工事		予定 61.4%	
契約工期：令和3年4月20日 ～ 令和4年11月7日		実施		契約工期：令和3年9月1日 ～ 令和4年8月31日		実施		契約工期：令和2年9月14日 ～ 令和4年8月31日		実施		契約工期：令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	
請負業者名：(株)鳴海組		差		請負業者名：(株)中島工務店		差		請負業者名：(株)中島工務店		差		請負業者名：(株)吉川工務店		差	
今月作業：仮水路工、砂防仮締切工 等				今月作業：土工、流路護岸工、床固め工、仮設工、道路付施設設工 等				今月作業：帯鋼補強土壁工、プレキャスト擁壁工 道路土工、仮設工 等				今月作業：中津川第2残土受入れ地、松尾谷管理用道路、本谷崩落土砂防止柵工 等			
来月予定：工事用道路工、法面工 等				来月予定：土工、排水構造物工、仮設工 等				来月予定：道路土工、防護柵工 等				来月予定：中津川第2残土受入れ地、松尾谷管理用道路 等			
⑤（落合川流域）		進 捗 率		⑥（落合川流域）		進 捗 率		⑦（中津川流域）		進 捗 率					
工 事 名：令和3年度 木曾川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定 100.0%		工 事 名：令和3年度 木曾川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事		予定 22.7%		工 事 名：令和3年度 木曾川水系 中津川護岸整備工事		予定 13.0%					
契約工期：令和4年1月11日 ～ 令和4年8月31日		実施		契約工期：令和4年3月14日 ～ 令和5年2月28日		実施		契約工期：令和4年4月25日 ～ 令和5年2月28日		実施					
請負業者名：(株)鳴海組		差		請負業者名：(株)吉川工務店		差		請負業者名：(株)加藤工務店		差					
完了				馬籠地区 薬師沢				神坂地区 冷川							
今月作業：後片付け、完成検査(令和4年6月13日)				今月作業：砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工 等(馬籠地区 薬師沢)				仮設工、構造物撤去工、排水構造物工 等(神坂地区 冷川)				今月作業：多自然型護岸工(張りコンクリート)、根固め・水制工 等			
来月予定：－				来月予定：砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工 等(馬籠地区 薬師沢)								来月予定：砂防土工、多自然型護岸工(張りコンクリート)、根固め・水制工 等			

令和4年6月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑧ (四ツ目川流域)		進捗率	⑨ (本川筋)		進捗率			進捗率			進捗率
工事名：令和3年度 木曾川水系 下平次砂防堰堤改築工事		予定 12.3%	工事名：令和4年度 木曾川水系 和田沢管理用道路工事		予定 0.1%	工事名：		予定	工事名：		予定
契約工期：令和4年5月10日 ~ 令和5年2月28日		実施	契約工期：令和4年6月17日 ~ 令和5年3月24日		実施	契約工期：		実施	契約工期：		実施
請負業者名：(株)加藤工務店		差	請負業者名：(株)加藤工務店		差	請負業者名：		差	請負業者名：		差
			準備工								
今月作業：コンクリート堰堤本体工、構造物取壊し工等			今月作業：準備工			今月作業：			今月作業：		
来月予定：コンクリート堰堤本体工等			来月予定：準備工、伐採工等			来月予定：			来月予定：		
		進捗率			進捗率			進捗率			進捗率
工事名：		予定	工事名：		予定	工事名：		予定	工事名：		予定
契約工期：~		実施	契約工期：~		実施	契約工期：~		実施	契約工期：~		実施
請負業者名：		差	請負業者名：		差	請負業者名：		差	請負業者名：		差
今月作業：			今月作業：			今月作業：			今月作業：		
来月予定：			来月予定：			来月予定：			来月予定：		

令和4年6月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工事名: 令和3年度 妻木出張所管内整備工事 工期: 令和3年12月14日 ~ 令和4年11月30日 施工業者: (株)藤本組 進捗率: 予定 50.0 % 実施 差	② 工事名: 令和3年度 庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事 工期: 令和4年3月28日 ~ 令和5年2月28日 施工業者: (株)藤本組 進捗率: 予定 17.0 % 実施 差
指示8: 里山林道展望台整備  指示9: 一の洞歩道整備 	町地区  一の洞地区 
《今月作業》【指示:7】防災教育補助、【指示:11】堀切土砂撤去 《8月作業》【指示:10】浦山第2堰堤周辺整備【指示:11】肥田右岸竹伐採 【指示:12】富士下堰堤下流整備	《今月作業》【町地区】道路土工、伐木除根工 【一の洞地区】法面工、防護柵工、道路付属施設工 《8月作業》【町地区】砂防土工、コンクリート堰堤工 【一の洞地区】舗装工
③ 工事名: 令和4年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事 工期: 令和4年6月1日 ~ 令和5年3月24日 施工業者: (株)吉川組 進捗率: 予定 00.0 % 実施 差	④ 工事名: 工期: 施工業者: 進捗率: 差
コンクリート堰堤工  工事中道路工 	
《今月作業》準備工 工事測量 工事中道路工 盛土工 《8月作業》工事中道路工 盛土工	《今月作業》 《8月作業》

令和4年 6月末 上松出張所 工事進捗状況


①	令和3年度 多治見電機通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)	令和3年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)	令和3年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)
	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %
	R3. 9.27~R4. 8.31 週休2日	R3.12. 1~R5. 1.31 週休2日、ICT	R3.12. 1~R4.11.30 週休2日	R3.12. 6~R4. 7.29 週休2日、CIM、ICT
				
今月作業	仮想サーバ気象設備取込、テレメータ観測局更新	砂防土工(掘削・転石破砕・残土運搬) 法面工(植生基材吹付工)	産業廃棄物運搬・処分(指示11) 排水構造物工、舗装工(指示13)	仮設工、産業運搬処分、道路土工、排水構造物工
来月予定	保古山4.9G無線切替、本線系L3SW更新、大桑村役場設備移設	砂防土工(掘削・転石破砕・残土運搬)	排水構造物工(指示13) 仮設工・暗渠排水(指示15)	仮設工、道路土工、排水構造物工
⑤	令和3年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)	令和3年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	令和3年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曾土建工業(株)	令和4年度 木曾川水系 宮の沢砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)
	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %
	R4. 4. 1~R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT	R4. 5. 2~R5. 2.28 週休2日	R4. 5.10~R5. 2.28 週休2日	R4. 6. 2~R5. 3.24 週休2日、ICT
				
今月作業	掘削工・残土処理工	準備工、仮設工、土工	準備工、仮設工、構造物撤去工(コンクリート削孔)	施工計画書
来月予定	掘削工・残土処理工	土工、構造物撤去工(コンクリート削孔・コンクリート切断)	構造物撤去工(コンクリート削孔、切断、取壊し、搬運)	仮設工(仮締切工・仮水路工) 砂防土工(残土処理工) コンクリート堰堤工(作業土工)

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(上) 42.6kp 道路除草
 工 期: 令和02年10月30日～令和05年10月31日
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)
 施工箇所: R19 31.5kp～55.2kp
 R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP
 進捗率: 予定 71.7% 実績

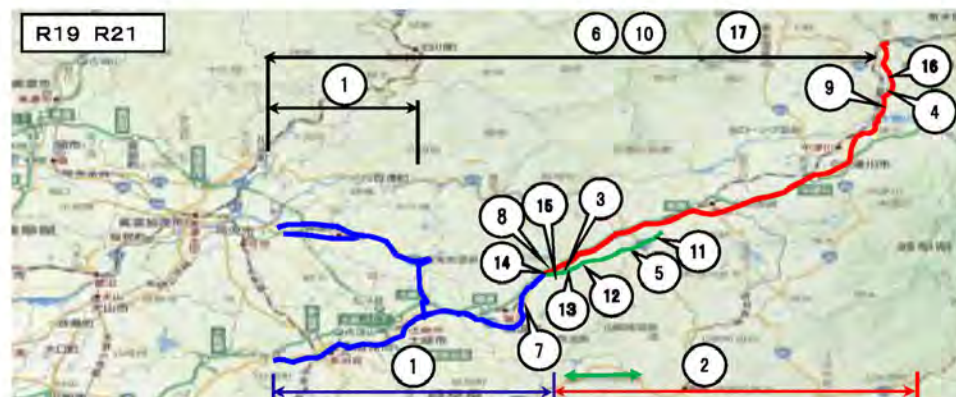

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号81.030kp(下) 機械清掃工(管渠清掃)
 工 期: 令和02年04月01日～令和04年10月31日
 施工業者: (有) 本曾ハイウェイサービス
 施工箇所: R19 55.2kp～97.0kp
 進捗率: 予定92.0% 実績

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

③



4号横断渠工
 工 期: 令和02年09月04日～令和04年05月31日
 施工業者: 坂垣建設(株)
 施工箇所: 瑞浪市釜戸地先
 進捗率: 予定 100% 実績

完

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2.3号)
 工 期: 令和02年03月29日～令和04年7月28日
 施工業者: (株) 加藤工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先
 進捗率: 予定 91.3% 実績

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



道路土工 準備工 排水構造物工
 工 期: 令和03年05月11日～令和04年12月15日
 施工業者: 恵中建設(株)
 施工箇所: 恵那市武並町地先
 進捗率: 予定 62.3% 実績

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



CCTV設備工
 工 期: 令和03年08月17日～令和04年07月8日
 施工業者: 松栄電子工業(株)
 施工箇所: 多治見市～中津川市一本松地先
 進捗率: 予定 100% 実績

完

令和3年度 多治見国道小星川橋耐震補強工事

⑦



橋脚巻立て工
 工 期: 令和03年09月13日～令和04年06月30日
 施工業者: (株) 吉川工務店
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先
 進捗率: 予定 100% 実績

完

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



法面工・舗装工・防護柵工・擁護工・道路付属施設工
 工 期: 令和03年09月13日～令和04年09月28日
 施工業者: 鳴海組
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
 進捗率: 予定 51.9% 実績

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



地盤改良工、重力式擁壁工
 工 期: 令和03年11月9日～令和04年08月31日
 施工業者: (株) 吉川工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市落合
 進捗率: 予定 66.1% 実績

令和3年度 多治見国道橋梁補修工事

⑩



現場壁装工、橋梁補修工
 工 期: 令和04年3月30日～令和04年12月23日
 施工業者: (株) 梅田組
 施工箇所: 恵那市、中津川市、御嵩町
 進捗率: 予定 7.0% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事

⑪



3-2号横断渠工
 準備工、道路土工
 工 期: 令和04年03月31日～令和05年06月23日
 施工業者: (株) 中島工務店
 施工箇所: 恵那市武並町
 進捗率: 予定 3.3% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



仮設工 仮設道路工
 工 期: 令和04年04月01日～令和05年02月28日
 施工業者: (株) 中島工務店
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町
 進捗率: 予定 3.0% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑬



道路土工(掘削工)

工 期：令和04年04月01日～令和05年2月28日

施工業者：(株)青協建設(株)

施工箇所：瑞浪市釜戸町

進捗率：予定 0.3% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑭



伐採工

工 期：令和04年04月04日～令和05年02月28日

施工業者：(株)市川工務店

施工箇所：瑞浪市土岐町

進捗率：予定 6.1% 実績

令和3年度 多治見国道道路照明設備工事

⑮

準備工

工 期：令和04年03月09日～令和05年02月28日

施工業者：(株)清水電気商会

施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

進捗率：予定 0% 実績

令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事

⑯



準備工, 伐採工

工 期：令和04年04月30日～令和04年12月28日

施工業者：(株)加藤工務店

施工箇所：中津川市山口

進捗率：予定 8.6% 実績

令和4年度 多治見国道標識工事

⑰

写真

工 期：令和04年06月16日～令和05年02月28日

施工業者：(株)キクテック

施工箇所：瑞浪出張所管内

進捗率：予定 0% 実績

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗
