

令和4年7月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定	74.3%
契 約 工 期： 令和3年4月20日 ～ 令和4年11月7日		実施	
請負業者名：（株）鳴海組		差	
			
今月作業：砂防土工、工事用道路工、伐採 等			
来月予定：法面工 等			

②（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 川上流路工事		予定	97.0%
契 約 工 期： 令和3年9月1日 ～ 令和4年8月31日		実施	
請負業者名：（株）中島工務店		差	
			
今月作業：排水構造物工、構造物撤去工、舗装工、後片付け 等			
来月予定：後片付け、完成検査(令和4年8月31日)			

③（本川筋）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 アラクワ沢管理用道路工事		予定	97.5%
契 約 工 期： 令和2年9月14日 ～ 令和4年8月31日		実施	
請負業者名：（株）中島工務店		差	
			
今月作業：道路土工、擁壁工、防護柵工 等			
来月予定：法面工、後片付け、完成検査(令和4年8月31日)			

④（中津川出張所管内）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 中津川出張所管内整備工事		予定	65.5%
契 約 工 期： 令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	
請負業者名：（株）吉川工務店		差	
			
今月作業：中津川第2残土受入れ地、松尾谷管理用道路、山神堰堤除草工 等			
来月予定：中津川第2残土受入れ地、松尾谷管理用道路 等			

⑤（落合川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定	100.0%
契 約 工 期： 令和4年1月11日 ～ 令和4年8月31日		実施	
請負業者名：（株）鳴海組		差	
			
完了			
今月作業：－			
来月予定：－			

⑥（落合川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事		予定	36.7%
契 約 工 期： 令和4年3月14日 ～ 令和5年2月28日		実施	
請負業者名：（株）吉川工務店		差	
			
馬籠地区 薬師沢			
今月作業：砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工 等(馬籠地区 薬師沢)			
来月予定：砂防堰堤付属物設置工、舗装工 等(馬籠地区 薬師沢)			

⑦（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川護岸整備工事		予定	19.0%
契 約 工 期： 令和4年4月25日 ～ 令和5年2月28日		実施	
請負業者名：（株）加藤工務店		差	
			
神坂地区 冷川			
今月作業：仮設工 等(神坂地区 冷川)			
来月予定：床固め工、構造物撤去工 等(神坂地区 冷川)			

⑧（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川出張所管内整備工事		予定	65.5%
契 約 工 期： 令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	
請負業者名：（株）吉川工務店		差	
			
今月作業：中津川第2残土受入れ地、松尾谷管理用道路、山神堰堤除草工 等			
来月予定：中津川第2残土受入れ地、松尾谷管理用道路 等			

⑨（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川護岸整備工事		予定	19.0%
契 約 工 期： 令和4年4月25日 ～ 令和5年2月28日		実施	
請負業者名：（株）加藤工務店		差	
			
馬籠地区 薬師沢			
今月作業：砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工 等(馬籠地区 薬師沢)			
来月予定：砂防堰堤付属物設置工、舗装工 等(馬籠地区 薬師沢)			

⑩（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川出張所管内整備工事		予定	65.5%
契 約 工 期： 令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	
請負業者名：（株）加藤工務店		差	
			
神坂地区 冷川			
今月作業：仮設工 等(神坂地区 冷川)			
来月予定：床固め工、構造物撤去工 等(神坂地区 冷川)			

⑪（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川出張所管内整備工事		予定	65.5%
契 約 工 期： 令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	
請負業者名：（株）加藤工務店		差	
			
馬籠地区 薬師沢			
今月作業：砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工 等(馬籠地区 薬師沢)			
来月予定：砂防堰堤付属物設置工、舗装工 等(馬籠地区 薬師沢)			

⑫（中津川流域）		進 捗 率	
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川出張所管内整備工事		予定	65.5%
契 約 工 期： 令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	
請負業者名：（株）加藤工務店		差	
			
神坂地区 冷川			
今月作業：仮設工 等(神坂地区 冷川)			
来月予定：床固め工、構造物撤去工 等(神坂地区 冷川)			

令和4年7月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑧ (四ツ目川流域)		進捗率		⑨ (本川筋)		進捗率				進捗率				進捗率	
工事名：令和3年度 木曽川水系 下平次砂防堰堤改築工事		予定	25.6%	工事名：令和4年度 木曽川水系 和田沢管理用道路工事		予定	1.5%	工事名：		予定		工事名：		予定	
契約工期： 令和4年5月10日 ～ 令和5年2月28日		実施		契約工期： 令和4年6月17日 ～ 令和5年3月24日		実施		契約工期： ～		実施		契約工期： ～		実施	
請負業者名： (株)加藤工務店		差		請負業者名： (株)加藤工務店		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差	
															
今月作業：コンクリート堰堤本体工 等				今月作業：準備工 等				今月作業：				今月作業：			
来月予定：コンクリート堰堤本体工 等				来月予定：道路土工、準備工 等				来月予定：				来月予定：			
		進捗率				進捗率				進捗率				進捗率	
工事名：		予定		工事名：		予定		工事名：		予定		工事名：		予定	
契約工期： ～		実施		契約工期： ～		実施		契約工期： ～		実施		契約工期： ～		実施	
請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差	
今月作業：				今月作業：				今月作業：				今月作業：			
来月予定：				来月予定：				来月予定：				来月予定：			

令和4年7月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

①

工 事 名 : 令和3年度
妻木出張所管内整備工事
工 期 : 令和3年12月14日 ~ 令和4年11月30日
施工業者: (株)藤本組
進 捗 率: 予定 70.0 % 実施 差



《今月作業》【指示:13堀切川流路整備】土砂撤去
【指示:11富士下川除草他】除草
《9月作業》【指示:10浦山第2堰堤周辺整備】土工、階段工
【指示:13堀切川流路整備】土砂撤去

②

工 事 名 : 令和3年度
庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事
工 期 : 令和4年3月28日 ~ 令和5年2月28日
施工業者: (株)藤本組
進 捗 率: 予定 14.1 % 実施 差




《今月作業》【町地区】伐木除根工、石・ブロック積(張)工
【一の洞地区】舗装工
《9月作業》【町地区】砂防土工、コンクリート堰堤工、道路土工
【一の洞地区】準備工

③

工 事 名 : 令和4年度
庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事
工 期 : 令和4年6月1日 ~ 令和5年3月24日
施工業者: (株)吉川組
進 捗 率: 予定 0.4 % 実施 差



工事用道路部

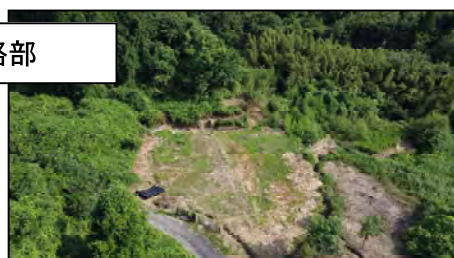

《今月作業》仮設工 工事用道路 盛土
《9月作業》準備工 立木伐採 仮設工 仮水路工

④

工 事 名 :
工 期 :
施工業者:
進 捗 率: 差

《今月作業》
《9月作業》

令和4年 7月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和3年度 多治見電機通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)	②	令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	③	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)	④	令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %
		R3. 9.27～R4. 8.31 週休2日		R3.12. 1～R5. 1.31 週休2日、ICT		R3.12. 1～R4.11.30 週休2日		R3.12. 6～R4.12.20 週休2日、CIM、ICT
今月 作業								
		本線L3SW切替、大桑村役機移設及び須原西、野尻東局更新		砂防土工 掘削工 残土処理工		仮設工・暗渠排水(指示15 大原残土処理場)		仮設工、道路土工、排水構造物工
		来月 予定		砂防土工 掘削工 残土処理工		排水構造物工(指示13 下洞沢)		仮設工、道路土工、排水構造物工
	⑤	令和3年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)	⑥	令和3年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	⑦	令和3年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曾土建工業(株)	⑧	令和4年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %
		R4. 4. 1～R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT		R4. 5. 2～R5. 2.28 週休2日		R4. 5.10～R5. 2.28 週休2日		R4. 6. 2～R5. 3.24 週休2日、ICT
今月 作業								
		掘削工・残土処理工		土工、構造物撤去工(コンクリート削孔・コンクリート切断)		構造物撤去工(コンクリート削孔、切断、取壊し、搬運搬)		仮設工(仮締切工・仮水路工) 砂防土工(残土処理工) コンクリート堰堤工(作業土工)
		来月 予定		構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し)		構造物撤去工(コンクリート削孔、切断、取壊し、搬運搬)、 仮設工		砂防土工(残土処理工) コンクリート堰堤工(作業土工)


令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21号(下) 3.6kp 道路除草

工 期：令和02年10月30日～令和05年10月31日
 施工業者：日本ハイウェイ・サービス（株）
 施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp
 R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP
 進 捗 率：予定 73.8% 実績

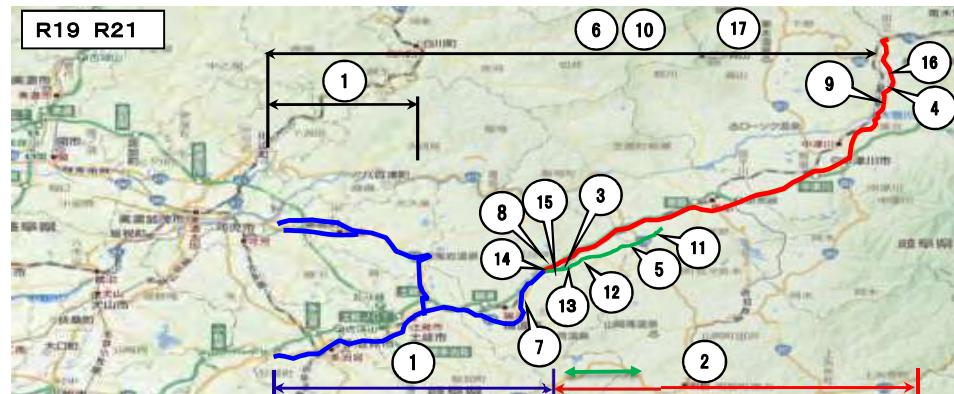

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号70.270kp(下) 損傷復旧工 (6p復旧)

工 期：令和02年04月01日～令和04年10月31日
 施工業者：(有) 木曾ハイウェイ・サービス
 施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp
 進 捗 率：予定92.0% 実績

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

③



4号横断渠工

工 期：令和02年09月04日～令和04年05月31日
 施工業者：板垣建設(株)
 施工箇所：瑞浪市釜戸地先
 進 捗 率：予定 100% 実績 100% **完**

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2,3号)

工 期：令和02年03月29日～令和04年7月28日
 施工業者：(株) 加藤工務店
 施工箇所：岐阜県中津川市山口地先
 進 捗 率：予定 91.3% 実績 92.4% **完**

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



道路土工 排水構造物工 法面工

工 期：令和03年05月11日～令和04年12月15日
 施工業者：恵中建設(株)
 施工箇所：恵那市武並町地先
 進 捗 率：予定 69.1% 実績

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



CCTV設備工

工 期：令和03年08月17日～令和04年07月8日
 施工業者：松栄電子工業(株)
 施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先
 進 捗 率：予定 100% 実績 100% **完**

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

⑦



橋脚巻立て工

工 期：令和03年09月13日～令和04年06月30日
 施工業者：(株) 吉川工務店
 施工箇所：瑞浪市土岐町地先
 進 捗 率：予定 100% 実績 100% **完**

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



準備工

工 期：令和03年09月13日～令和04年09月28日
 施工業者：鳴海組
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先
 進 捗 率：予定 53.4% 実績

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



地盤改良工、重力式擁壁工

工 期：令和03年11月9日～令和04年08月31日
 施工業者：(株) 吉川工務店
 施工箇所：岐阜県中津川市落合
 進 捗 率：予定 81.1% 実績

令和3年度 多治見国道橋梁補修工事

⑩



現場塗装工、橋梁補修工、鋼桁工

工 期：令和04年3月30日～令和04年12月23日
 施工業者：(株) 梅田組
 施工箇所：恵那市、中津川市、御嵩町
 進 捗 率：予定 14.3% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事

⑪



舗装工、排水構造物工、仮設工

工 期：令和04年03月31日～令和05年06月23日
 施工業者：(株) 中島工務店
 施工箇所：恵那市武並町
 進 捗 率：予定 6.0% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



準備工 作業ヤード

工 期：令和04年04月01日～令和05年02月28日
 施工業者：(株) 中島工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町
 進 捗 率：予定 6.5% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑬



道路土工・法面工

工 期：令和04年04月01日～令和05年2月28日

施工業者：青協建設（株）

施工箇所：瑞浪市釜戸町

進 捗 率：予定 11.0% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑭



伐採工

工 期：令和04年04月04日～令和05年02月28日

施工業者：（株）市川工務店

施工箇所：瑞浪市土岐町

進 捗 率：予定 6.1% 実績

令和3年度 多治見国道道路照明設備工事

⑮



道路照明設備工

工 期：令和04年03月09日～令和05年02月28日

施工業者：（株）清水電気商会

施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

進 捗 率：予定 2.0% 実績

令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事

⑯



準備工、伐採工

工 期：令和04年04月30日～令和04年12月28日

施工業者：（株）加藤工務店

施工箇所：中津川市山口

進 捗 率：予定 5.0% 実績

令和4年度 多治見国道標識工事

⑰

写真

準備工

工 期：令和04年06月16日～令和05年02月28日

施工業者：（株）キクテック

施工箇所：瑞浪出張所管内

進 捗 率：予定 3.0% 実績

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗
