

令和4年8月末 中津川出張所 工事進捗状況

|                                                                                   |  |          |  |                                                                                     |  |           |  |                                                                                      |  |           |  |                                                                                      |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| ①（落合川流域）                                                                          |  | 進 捗 率    |  | ②（中津川流域）                                                                            |  | 進 捗 率     |  | ③（本川筋）                                                                               |  | 進 捗 率     |  | ④（中津川出張所管内）                                                                          |  | 進 捗 率    |  |
| 工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事                                                      |  | 予定 85.6% |  | 工 事 名：令和3年度 木曽川水系 川上流路工事                                                            |  | 予定 100.0% |  | 工 事 名：令和3年度 木曽川水系 アクラ沢管理用道路工事                                                        |  | 予定 100.0% |  | 工 事 名：令和3年度 中津川出張所管内整備工事                                                             |  | 予定 77.4% |  |
| 契 約 工 期： 令和3年4月20日     ～     令和4年11月7日                                            |  | 実施       |  | 契 約 工 期： 令和3年9月1日     ～     令和4年8月31日                                               |  | 実施        |  | 契 約 工 期： 令和2年9月14日     ～     令和4年8月31日                                               |  | 実施        |  | 契 約 工 期： 令和3年12月1日     ～     令和4年11月30日                                              |  | 実施       |  |
| 請負業者名：（株）鳴海組                                                                      |  | 差        |  | 請負業者名：（株）中島工務店                                                                      |  | 差         |  | 請負業者名：（株）中島工務店                                                                       |  | 差         |  | 請負業者名：（株）吉川工務店                                                                       |  | 差        |  |
|   |  |          |  |   |  |           |  |   |  |           |  |   |  |          |  |
|                                                                                   |  |          |  | 完了                                                                                  |  |           |  | 完了                                                                                   |  |           |  |                                                                                      |  |          |  |
| 今月作業   ：砂防土工、法面工 等                                                                |  |          |  | 今月作業   ：後片付け、完成検査(令和4年8月31日)                                                        |  |           |  | 今月作業   ：法面工、後片付け、完成検査(令和4年8月31日)                                                     |  |           |  | 今月作業   ：中津川第2残土受入れ地、松尾谷管理用道路、本谷管理道路土砂撤去 等                                            |  |          |  |
| 来月予定   ：法面工 等                                                                     |  |          |  | 来月予定   ： 一                                                                          |  |           |  | 来月予定   ： 一                                                                           |  |           |  | 来月予定   ：荒道堰堤土砂撤去、松尾谷管理用道路 等                                                          |  |          |  |
| ⑤（落合川流域）                                                                          |  | 進 捗 率    |  | ⑥（中津川流域）                                                                            |  | 進 捗 率     |  | ⑦（四ツ目川流域）                                                                            |  | 進 捗 率     |  |                                                                                      |  |          |  |
| 工 事 名：令和3年度 木曽川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事                                                    |  | 予定 56.3% |  | 工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川護岸整備工事                                                         |  | 予定 31.0%  |  | 工 事 名：令和3年度 木曽川水系 下平次砂防堰堤改築工事                                                        |  | 予定 41.9%  |  |                                                                                      |  |          |  |
| 契 約 工 期： 令和4年3月14日     ～     令和5年2月28日                                            |  | 実施       |  | 契 約 工 期： 令和4年4月25日     ～     令和5年2月28日                                              |  | 実施        |  | 契 約 工 期： 令和4年5月10日     ～     令和5年2月28日                                               |  | 実施        |  |                                                                                      |  |          |  |
| 請負業者名：（株）吉川工務店                                                                    |  | 差        |  | 請負業者名：（株）加藤工務店                                                                      |  | 差         |  | 請負業者名：（株）加藤工務店                                                                       |  | 差         |  |                                                                                      |  |          |  |
|  |  |          |  |  |  |           |  |  |  |           |  |  |  |          |  |
| 馬籠地区 薬師沢                                                                          |  |          |  | 神坂地区 冷川                                                                             |  |           |  |                                                                                      |  |           |  |                                                                                      |  |          |  |
| 今月作業   ：砂防土工 等(馬籠地区 薬師沢)                                                          |  |          |  | 床固め工 等(神坂地区 冷川)                                                                     |  |           |  | 今月作業   ：砂防土工、根固め・水制工 等                                                               |  |           |  | 今月作業   ：コンクリート堰堤本体工 等                                                                |  |          |  |
| 来月予定   ：砂防堰堤付属物設置工、法面工 等(馬籠地区 薬師沢)                                                |  |          |  | 床固め工 等(神坂地区 冷川)                                                                     |  |           |  | 来月予定   ：根固め・水制工 等                                                                    |  |           |  | 来月予定   ：コンクリート堰堤本体工、鋼製堰堤工 等                                                          |  |          |  |

令和4年8月末 中津川出張所 工事進捗状況

|                                                                                  |  |       |      |           |  |       |  |           |  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|-----------|--|-------|--|-----------|--|-------|--|
| ⑧ (本川筋)                                                                          |  | 進 捗 率 |      |           |  | 進 捗 率 |  |           |  | 進 捗 率 |  |
| 工 事 名 : 令和4年度 木曽川水系 和田沢管理用道路工事                                                   |  | 予定    | 2.0% | 工 事 名 :   |  | 予定    |  | 工 事 名 :   |  | 予定    |  |
| 契 約 工 期 : 令和4年6月17日 ~ 令和5年3月24日                                                  |  | 実施    |      | 契 約 工 期 : |  | 実施    |  | 契 約 工 期 : |  | 実施    |  |
| 請負業者名 : (株)加藤工務店                                                                 |  | 差     |      | 請負業者名 :   |  | 差     |  | 請負業者名 :   |  | 差     |  |
|  |  |       |      |           |  |       |  |           |  |       |  |
| 今月作業 : 伐採工 等                                                                     |  |       |      | 今月作業 :    |  |       |  | 今月作業 :    |  |       |  |
| 来月予定 : 道路土工、仮設工 等                                                                |  |       |      | 来月予定 :    |  |       |  | 来月予定 :    |  |       |  |
|                                                                                  |  | 進 捗 率 |      |           |  | 進 捗 率 |  |           |  | 進 捗 率 |  |
| 工 事 名 :                                                                          |  | 予定    |      | 工 事 名 :   |  | 予定    |  | 工 事 名 :   |  | 予定    |  |
| 契 約 工 期 :                                                                        |  | 実施    |      | 契 約 工 期 : |  | 実施    |  | 契 約 工 期 : |  | 実施    |  |
| 請負業者名 :                                                                          |  | 差     |      | 請負業者名 :   |  | 差     |  | 請負業者名 :   |  | 差     |  |
|                                                                                  |  |       |      |           |  |       |  |           |  |       |  |
| 今月作業 :                                                                           |  |       |      | 今月作業 :    |  |       |  | 今月作業 :    |  |       |  |
| 来月予定 :                                                                           |  |       |      | 来月予定 :    |  |       |  | 来月予定 :    |  |       |  |

# 令和4年8月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

①

工事名： 令和3年度  
妻木出張所管内整備工事  
工 期： 令和3年12月14日 ～ 令和4年11月30日  
施工業者：(株)藤本組  
進捗率： 予定 80.0 %      実施      差

堀切川流路整備



《今月作業》【指示：13堀切川流路整備】土砂撤去  
【指示：11富士下川除草他】除草【指示：10浦山第2堰堤周辺整備】土工、階段工  
《10月作業》【指示：14富士下堰堤下流整備】除草、張コンクリート  
【指示：15肥田川伐採】伐採工

②

工事名： 令和3年度  
庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事  
工 期： 令和4年3月28日 ～ 令和5年2月28日  
施工業者：(株)藤本組  
進捗率： 予定 24.9 %      実施      差



町地区



一の洞地区

《今月作業》【町地区】石・ブロック積(張)工、道路土工、砂防土工、コンクリート堰堤工  
【一の洞地区】準備工  
《10月作業》【町地区】コンクリート堰堤工  
【一の洞地区】準備工

③

工事名： 令和4年度  
庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事  
工 期： 令和4年6月1日 ～ 令和5年3月24日  
施工業者：(株)吉川組  
進捗率： 予定 4.7 %      実施      差



コンクリート堰堤部



工事用道路部

《今月作業》仮設工 工事用道路 盛土 仮水路工  
準備工 立木伐採  
《10月作業》準備工 立木伐採 仮設工 仮水路工

④

工事名：  
工 期：  
施工業者：  
進捗率：  
差

《今月作業》

《10月作業》

## 令和4年 8月末 上松出張所 工事進捗状況

|          |                                                                                   |   |                                                                                    |   |                                                                                     |   |                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ①        | 令和3年度 多治見電気通信設備工事<br>施工業者 朝日電機工業(株)                                               | ② | 令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事<br>施工業者 奥田工業(株)                                              | ③ | 令和3年度 上松出張所管内整備工事<br>施工業者 大宗土建(株)                                                   | ④ | 令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事<br>施工業者 奥田工業(株)                                           |
|          | 進捗率(予定工程) %                                                                       |   | 進捗率(予定工程) %                                                                        |   | 進捗率(予定工程) %                                                                         |   | 進捗率(予定工程) %                                                                         |
|          | R3. 9.27～R4. 8.31 週休2日                                                            |   | R3.12. 1～R5. 1.31 週休2日、ICT                                                         |   | R3.12. 1～R4.11.30 週休2日                                                              |   | R3.12. 6～R4.12.20 週休2日、CIM、ICT                                                      |
|          |  |   |  |   |  |   |  |
| 今月<br>作業 | 総合調整試験                                                                            |   | 砂防土工(掘削工・残土処理工・整地)                                                                 |   | 排水構造物工(指示13)                                                                        |   | 仮設工、道路土工、排水構造物工                                                                     |
| 来月<br>予定 | 完成検査                                                                              |   | 砂防土工(掘削工・残土処理工・整地)                                                                 |   | 植生工・応急処理工(指示13)                                                                     |   | 仮設工、道路土工、排水構造物工                                                                     |

|          |                                                                                    |   |                                                                                     |   |                                                                                      |   |                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑤        | 令和3年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事<br>施工業者 大宗土建(株)                                             | ⑥ | 令和3年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事<br>施工業者 奥田工業(株)                                            | ⑦ | 令和3年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事<br>施工業者 木曽土建工業(株)                                          | ⑧ | 令和4年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤工事<br>施工業者 奥田工業(株)                                                |
|          | 進捗率(予定工程) %                                                                        |   | 進捗率(予定工程) %                                                                         |   | 進捗率(予定工程) %                                                                          |   | 進捗率(予定工程) %                                                                          |
|          | R4. 4. 1～R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT                                                     |   | R4. 5. 2～R5. 2.28 週休2日                                                              |   | R4. 5.10～R5. 2.28 週休2日                                                               |   | R4. 6. 2～R5. 3.24 週休2日、ICT                                                           |
|          |  |   |  |   |  |   |  |
| 今月<br>作業 | 掘削工・残土処理工                                                                          |   | 構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し)                                                                |   | 構造物撤去工(コンクリート削孔、切断、取壊し、殻運搬)、<br>仮設工                                                  |   | 砂防土工(残土処理工)<br>コンクリート堰堤工(作業土工)                                                       |
| 来月<br>予定 | 掘削工・残土処理工・仮設工                                                                      |   | 構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し)<br>仮設工(取壊しヤード作成)                                               |   | 構造物撤去工(コンクリート切断、取壊し、殻運搬)、<br>コンクリート堰堤工(差し筋、型枠)                                       |   | 砂防土工(残土処理工)<br>コンクリート堰堤工(作業土工)<br>仮設工(工事用道路工)                                        |

令和4年 8月末 上松出張所 工事進捗状況

|      |   |                      |  |           |   |                     |  |           |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------|---|----------------------|--|-----------|---|---------------------|--|-----------|---|--|--|--|---|--|--|--|
|      | ⑨ | 令和4年度 木曽川水系 上松管内除石工事 |  |           | ⑩ | 令和4年度 多治見砂防電機通信設備工事 |  |           | ⑪ |  |  |  | ⑫ |  |  |  |
|      |   | 施工業者                 |  | 木曾土建工業(株) |   | 施工業者                |  | 朝日電機工業(株) |   |  |  |  |   |  |  |  |
|      |   | 進捗率(予定工程)            |  | %         |   | 進捗率(予定工程)           |  | %         |   |  |  |  |   |  |  |  |
|      |   | R4. 9. 5～R5. 3.16    |  | 週休2日、ICT  |   | R4. 9.26～R5. 2.28   |  | 週休2日      |   |  |  |  |   |  |  |  |
|      |   | 写真無し                 |  |           |   | 写真無し                |  |           |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 今月作業 |   | -                    |  |           |   | -                   |  |           |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 来月予定 |   | 施工計画書、準備工            |  |           |   | 施工計画書、準備工           |  |           |   |  |  |  |   |  |  |  |


|      |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|      | ⑬ |  |  |  | ⑭ |  |  |  | ⑮ |  |  |  | ⑯ |  |  |  |
|      |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|      |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|      |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 今月作業 |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 来月予定 |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |

## 令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(下) 54.9kp~55.1kp 道路除草  
 工 期: 令和02年10月30日~令和05年10月31日  
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)  
 施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp  
 R21 3.0kp~22.0kp 可見御嵩BP  
 進 捗 率: 予定 76.1% 実績

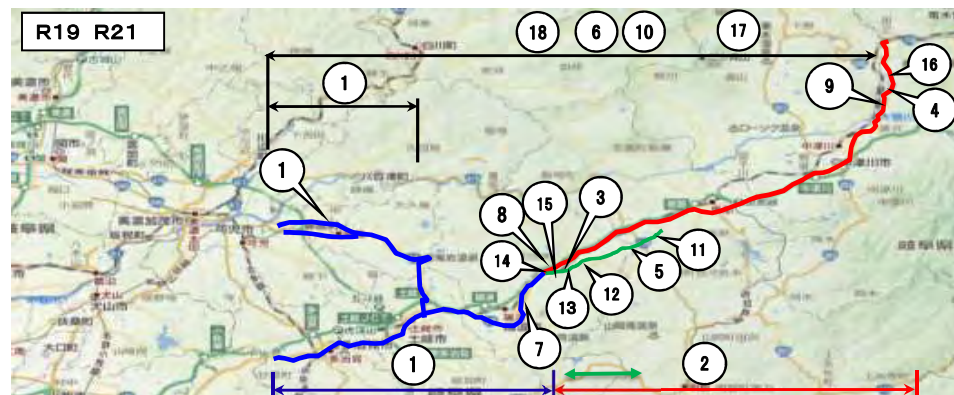

## 令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号78.100kp(上) 道路除草工  
 工 期: 令和02年04月01日~令和04年10月31日  
 施工業者: (有) 木曾ハイウェイサービス  
 施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp  
 進 捗 率: 予定95.0% 実績

## 令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

③



4号横断函渠工  
 工 期: 令和02年09月04日~令和04年05月31日  
 施工業者: 板垣建設(株)  
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先  
 進 捗 率: 予定 100% 実績

完

## 令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2.3号)  
 工 期: 令和02年03月29日~令和04年7月28日  
 施工業者: (株) 加藤工務店  
 施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先  
 進 捗 率: 予定 91.3% 実績

完

## 令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



道路土工 排水構造物工 法面工  
 工 期: 令和03年05月11日~令和04年12月15日  
 施工業者: 恵那建設(株)  
 施工箇所: 恵那市武並町地先  
 進 捗 率: 予定 72.5% 実績

## 令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



CCTV設備工  
 工 期: 令和03年08月17日~令和04年07月8日  
 施工業者: 松栄電子工業(株)  
 施工箇所: 多治見市~中津川市一本松地先  
 進 捗 率: 予定 100% 実績

完

## 令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

⑦



橋脚立て工  
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年06月30日  
 施工業者: (株) 吉川工務店  
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先  
 進 捗 率: 予定 100% 実績

完

## 令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



舗装工、区画線工  
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年09月28日  
 施工業者: 鳴海組  
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先  
 進 捗 率: 予定 62.8% 実績

## 令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



地盤改良工、重力式擁壁工  
 工 期: 令和03年11月9日~令和04年12月28日  
 施工業者: (株) 吉川工務店  
 施工箇所: 岐阜県中津川市落合  
 進 捗 率: 予定 61.5% 実績

## 令和3年度 多治見国道橋梁補修工事

⑩



現場塗装工、橋梁補修工、橋梁支承工  
 工 期: 令和04年3月30日~令和04年12月23日  
 施工業者: (株) 梅田組  
 施工箇所: 恵那市、中津川市、御嵩町  
 進 捗 率: 予定 34.4% 実績

## 令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事

⑪



舗装工、排水構造物工、防護柵工  
 工 期: 令和04年03月31日~令和05年06月23日  
 施工業者: (株) 中島工務店  
 施工箇所: 恵那市武並町  
 進 捗 率: 予定 10.4% 実績

## 令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



土留工 鋼矢板打設、逆T式擁壁工 作業土工 均しコンクリート  
 工 期: 令和04年04月01日~令和05年02月28日  
 施工業者: (株) 中島工務店  
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町  
 進 捗 率: 予定 14.3% 実績

# 瑞浪国道維持出張所 工事進捗状況 2/2

令和 4年 9月13日現在

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事</p> <p>⑬</p>  <p>道路土工・法面工・擁壁工</p> <p>工 期：令和04年04月01日～令和05年2月28日</p> <p>施工業者：青協建設（株）</p> <p>施工箇所：瑞浪市釜戸町</p> <p>進捗率：予定 18.6% 実績</p> | <p>令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事</p> <p>⑭</p>  <p>作業ヤード整備工（耕土掘削）</p> <p>工 期：令和04年04月04日～令和05年02月28日</p> <p>施工業者：（株）市川工務店</p> <p>施工箇所：瑞浪市土岐町</p> <p>進捗率：予定 14.1% 実績</p> | <p>令和3年度 多治見国道道路照明設備工事</p> <p>⑮</p>  <p>道路照明設備工</p> <p>工 期：令和04年03月09日～令和05年02月28日</p> <p>施工業者：（株）清水電気商会</p> <p>施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内</p> <p>進捗率：予定 25.3% 実績</p> | <p>令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事</p> <p>⑯</p>  <p>準備工、法面工</p> <p>工 期：令和04年04月30日～令和04年12月28日</p> <p>施工業者：（株）加藤工務店</p> <p>施工箇所：中津川市山口</p> <p>進捗率：予定 10.0% 実績</p> | <p>令和4年度 多治見国道標識工事</p> <p>⑰</p>  <p>準備工、標識工</p> <p>工 期：令和04年06月16日～令和05年02月28日</p> <p>施工業者：（株）キクテック</p> <p>施工箇所：瑞浪出張所管内</p> <p>進捗率：予定 10.0% 実績</p> |
| <p>令和4年度 多治見国道電気通信設備工事</p> <p>⑱</p> <p>工 期：令和04年08月02日～令和05年2月28日</p> <p>施工業者：エフコム㈱</p> <p>施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先</p> <p>進捗率：予定 % 実績 %</p>                                                                                                      | <p>令和4年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事</p> <p>⑲</p> <p>工 期：令和04年09月01日～令和05年2月28日</p> <p>施工業者：小池土木㈱</p> <p>施工箇所：可児郡御嵩町</p> <p>進捗率：予定 % 実績 %</p>                                                                                                             | <p>令和4年度 瑞浪恵那道路芝原地区下部工事</p> <p>⑳</p> <p>工 期： ～令和06年2月29日</p> <p>施工業者：榑吉川組</p> <p>施工箇所：瑞浪市釜戸町地先</p> <p>進捗率：予定 % 実績 %</p>                                                                                                                       | <p>令和4年度 瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事</p> <p>㉑</p> <p>工 期： ～令和06年2月29日</p> <p>施工業者：榑加藤工務店</p> <p>施工箇所：瑞浪市釜戸町地先～恵那市武並町地先</p> <p>進捗率：予定 % 実績 %</p>                                                                                                      | <p>令和4年度 瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事</p> <p>㉒</p> <p>工 期： ～令和06年2月29日</p> <p>施工業者：榑中島工務店</p> <p>施工箇所：瑞浪市釜戸町地先</p> <p>進捗率：予定 % 実績 %</p>                                                                                                           |
| <p>令和4年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事</p> <p>㉓</p> <p>工 期： ～令和06年2月29日</p> <p>施工業者：榑吉川工務店</p> <p>施工箇所：恵那市武並町地先</p> <p>進捗率：予定 % 実績 %</p>                                                                                                                   | <p>令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪4号橋鋼上部工事</p> <p>㉔</p> <p>工 期： ～令和06年2月29日</p> <p>施工業者：</p> <p>施工箇所：</p> <p>進捗率：予定 % 実績 %</p>                                                                                                                                    | <p>令和4年度 多治見国道西部除雪工事</p> <p>工 期： ～令和05年3月31日</p> <p>施工業者：榑藤本組</p> <p>施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp<br/>R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP</p> <p>進捗率：予定 % 実績 %</p>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |
