

令和4年9月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (落合川流域)		進捗率	② (中津川出張所管内)		進捗率	③ (落合川流域)		進捗率
工事名: 令和2年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定 82.3%	工事名: 令和3年度 中津川出張所管内整備工事		予定 84.5%	工事名: 令和3年度 木曾川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事		予定 60.4%
契約工期: 令和3年4月20日 ~ 令和4年11月7日		実施	契約工期: 令和3年12月1日 ~ 令和4年11月30日		実施	契約工期: 令和4年3月14日 ~ 令和5年2月28日		実施
請負業者名: (株)鳴海組		差	請負業者名: (株)吉川工務店		差	請負業者名: (株)吉川工務店		差
								
						馬籠地区 薬師沢		神坂地区 冷川
今月作業: 法面工、災害復旧 等			今月作業: 馬籠雨量観測所除草、荒道堰堤土砂撤去、松尾谷管理用道路 等			今月作業: 砂防土工、砂防堰堤付属物設置工 等(馬籠地区 薬師沢)		床固め工、仮設工 等(神坂地区 冷川)
来月予定: 砂防土工、法面工、災害復旧 等			来月予定: 松尾谷管理用道路、大又沢伐採、島田・四ツ目除草 等			来月予定: 後片付け 等(馬籠地区 薬師沢)		砂防土工、構造物撤去工、仮設工 等(神坂地区 冷川)
④ (中津川流域)		進捗率	⑤ (四ツ目川流域)		進捗率	⑥ (本川筋)		進捗率
工事名: 令和3年度 木曾川水系 中津川護岸整備工事		予定 50.0%	工事名: 令和3年度 木曾川水系 下平次砂防堰堤改築工事		予定 88.1%	工事名: 令和4年度 木曾川水系 和田沢管理用道路工事		予定 12.9%
契約工期: 令和4年4月25日 ~ 令和5年2月28日		実施	契約工期: 令和4年5月10日 ~ 令和5年2月28日		実施	契約工期: 令和4年6月17日 ~ 令和5年3月24日		実施
請負業者名: (株)加藤工務店		差	請負業者名: (株)加藤工務店		差	請負業者名: (株)加藤工務店		差
								
今月作業: 根固め・水制工 等			今月作業: コンクリート堰堤本体工 等			今月作業: 仮設工、伐採工 等		今月作業: 準備工
来月予定: 根固め・水制工 等			来月予定: 鋼製堰堤工 等			来月予定: 道路土工、仮設工 伐採工 等		来月予定: 仮設工 等

令和4年9月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑧（落合川流域）		進捗率		⑨（本川筋）		進捗率				進捗率				進捗率	
工 事 名：令和4年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定	0.0%	工 事 名：令和4年度 木曽川水系 アラクラ沢砂防堰堤工事		予定	1.0%			予定		工 事 名：		予定	
契約工期： 令和4年9月5日 ～ 令和5年3月16日		実施		契約工期： 令和4年9月1日 ～ 令和5年3月16日		実施				実施		契約工期：		実施	
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）中島工務店		差				差		請負業者名：		差	
															
今月作業：準備工、災害復旧 等				今月作業：準備工				今月作業：				今月作業：			
来月予定：災害復旧 等				来月予定：仮設工、構造物撤去工 等				来月予定：				来月予定：			
		進捗率				進捗率				進捗率				進捗率	
工 事 名：		予定		工 事 名：		予定		工 事 名：		予定		工 事 名：		予定	
契約工期：		実施		契約工期：		実施		契約工期：		実施		契約工期：		実施	
請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差	
今月作業：				今月作業：				今月作業：				今月作業：			
来月予定：				来月予定：				来月予定：				来月予定：			

令和4年9月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工事名： 令和3年度 妻木出張所管内整備工事 工期： 令和3年12月14日 ～ 令和4年11月30日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 予定 90.0 % 実施 差	② 工事名： 令和3年度 庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事 工期： 令和4年3月28日 ～ 令和5年2月28日 施工業者：(株)藤本組 進捗率： 予定 40.7 % 実施 差
 堀切川流路整備  浦山第2堰堤周辺遊歩道整備	 町地区
《今月作業》【指示：14富士下川整備】除草、【指示：7】砂防教室、グリーンベルト、防災訓練 【指示：15肥田川右岸竹林伐採】伐採 《11月作業》【指示：7】グリーンベルト、防災訓練	《今月作業》【町地区】コンクリート堰堤工 【一の洞地区】準備工 《11月作業》【町地区】コンクリート堰堤工 【一の洞地区】準備工
③ 工事名： 令和4年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事 工期： 令和4年6月1日 ～ 令和5年3月24日 施工業者：(株)吉川組 進捗率： 予定 25.9 % 実施 差	④ 工事名： 工期： 施工業者： 進捗率： 差
 コンクリート堰堤部  工事用道路部	
《今月作業》仮設工 仮水路工 モルタル吹付、大型土のう 工事用道路 盛土、 仮設工 コンクリート切断工、取壊し工 《11月作業》コンクリート堰堤工 床掘 構造物撤去工 コンクリート表面処理工	《今月作業》 《11月作業》

令和4年 9月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和3年度 多治見電気通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)	②	令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	③	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)	④	令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %
		R3. 9.27～R4. 8.31 週休2日		R3.12. 1～R5. 1.31 週休2日、ICT		R3.12. 1～R4.11.30 週休2日		R3.12. 6～R4.12.20 週休2日、CIM、ICT
今月 作業								
		完成検査		砂防土工		植生工・応急処理工(指示13)		仮設工、道路土工、排水構造物工
		-		砂防土工 仮設工		植生工・応急処理工・舗装工(指示13)		仮設工、道路土工、排水構造物工
	⑤	令和3年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)	⑥	令和3年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	⑦	令和3年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曾土建工業(株)	⑧	令和4年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %
		R4. 4. 1～R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT		R4. 5. 2～R5. 2.28 週休2日		R4. 5.10～R5. 2.28 週休2日		R4. 6. 2～R5. 3.24 週休2日、ICT
今月 作業								
		掘削工・残土処理工		構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し) 仮設工(取壊しヤード作成)		構造物撤去工(コンクリート切断、取壊し、穀運搬)、 コンクリート堰堤工(差し筋、型枠)		砂防土工(残土処理工) コンクリート堰堤工(作業土工) 仮設工(工事用道路工)
		残土処理工・仮設工・片付け		構造物撤去工(コンクリート削孔・コンクリート切断)		コンクリート堰堤工(差し筋、型枠、コンクリート打設) 鋼製堰堤工(鋼製枠)		砂防土工(残土処理工) コンクリート堰堤工(作業土工) 仮設工(工事用道路工)

令和4年 9月末 上松出張所 工事進捗状況


	⑨	令和4年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)	⑩	令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)	⑪		⑫	
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) %				
		R4. 9. 5～R5. 3.16 週休2日、ICT		R4. 9.26～R5. 2.28 週休2日				
			写真無し					
今月作業	準備工・仮設工		—					
来月予定	砂防土工:掘削・残土処理		施工計画書					
	⑬		⑭		⑮		⑯	
今月作業								
来月予定								

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(上) 52.25kp~52.10kp 道路除草
 工 期: 令和02年10月30日~令和05年10月31日
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)
 施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp
 R21 3.0kp~22.0kp 可見御嵩BP
 進 捗 率: 予定 78.3% 実績

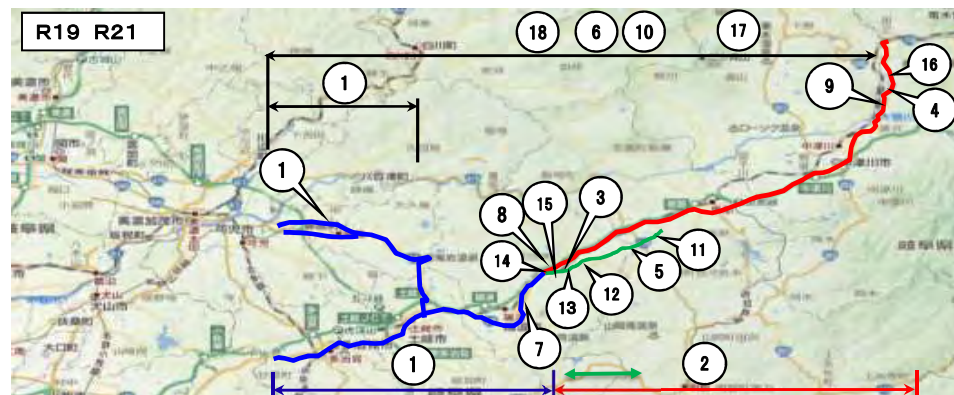

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号78.100kp(上) 防草対策工
 工 期: 令和02年04月01日~令和04年10月31日
 施工業者: (有) 木曾ハイウェイサービス
 施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp
 進 捗 率: 予定100.0% 実績

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

③



4号横断函渠工
 工 期: 令和02年09月04日~令和04年05月31日
 施工業者: 板垣建設(株)
 施工箇所: 瑞浪市釜戸地先
 進 捗 率: 予定 100% 実績

完

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2,3号)
 工 期: 令和02年03月29日~令和04年7月28日
 施工業者: (株) 加藤工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先
 進 捗 率: 予定 91.3% 実績

完

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



道路土工 排水構造物工 法面工
 工 期: 令和03年05月11日~令和04年12月15日
 施工業者: 恵中建設(株)
 施工箇所: 恵那市武並町地先
 進 捗 率: 予定 78.7% 実績

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



CCTV設備工
 工 期: 令和03年08月17日~令和04年07月8日
 施工業者: 松栄電子工業(株)
 施工箇所: 多治見市~中津川市一本松地先
 進 捗 率: 予定 100% 実績

完

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

⑦



橋脚巻立て工
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年06月30日
 施工業者: (株) 吉川工務店
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先
 進 捗 率: 予定 100% 実績

完

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



舗装工、区画線工
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年09月28日
 施工業者: 鳴海組
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
 進 捗 率: 予定 100% 実績

完

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



地盤改良工、重力式擁壁工、集水樹工、管渠工
 工 期: 令和03年11月9日~令和04年12月28日
 施工業者: (株) 吉川工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市落合
 進 捗 率: 予定 71.5% 実績

令和3年度 多治見国道橋梁補修工事

⑩



塗装工、橋梁補修工
 工 期: 令和04年3月30日~令和05年2月17日
 施工業者: (株) 梅田組
 施工箇所: 恵那市、中津川市、御嵩町
 進 捗 率: 予定 65.2% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事

⑪



防護柵工
 工 期: 令和04年03月31日~令和05年06月23日
 施工業者: (株) 中島工務店
 施工箇所: 恵那市武並町
 進 捗 率: 予定 19.9% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



土留・仮締切工 鋼矢板打設、逆T式擁壁工 置換えコンクリート
 工 期: 令和04年04月01日~令和05年06月23日
 施工業者: (株) 中島工務店
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町
 進 捗 率: 予定 15.7% 実績

瑞浪国道維持出張所 工事進捗状況 2/2

令和 4年 10月11日現在

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事 ⑬  道路土工・法面工・擁壁工 工 期：令和04年04月01日～令和05年3月24日 施工業者：青協建設（株） 施工箇所：瑞浪市釜戸町 進捗率：予定 17.0% 実績	令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事 ⑭  付替え水路工 工 期：令和04年04月04日～令和05年03月24日 施工業者：（株）市川工務店 施工箇所：瑞浪市土岐町 進捗率：予定 27.7% 実績	令和3年度 多治見国道道路照明設備工事 ⑮  道路照明設備工 工 期：令和04年03月09日～令和05年02月28日 施工業者：（株）清水電気商会 施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内 進捗率：予定 40.0% 実績	令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事 ⑯  準備工、組立歩道基礎工 工 期：令和04年04月30日～令和04年12月28日 施工業者：（株）加藤工務店 施工箇所：中津川市山口 進捗率：予定 15.0% 実績	令和4年度 多治見国道標識工事 ⑰  準備工 工 期：令和04年06月16日～令和05年02月28日 施工業者：（株）キクテック 施工箇所：瑞浪出張所管内 進捗率：予定 5.0% 実績
令和4年度 多治見国道電気通信設備工事 ⑱ 写真 準備工 工 期：令和04年08月02日～令和05年2月28日 施工業者：エフコム㈱ 施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事 ⑲ 写真 準備工 工 期：令和04年09月01日～令和05年2月28日 施工業者：小池土木㈱ 施工箇所：可児郡御嵩町 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 瑞浪恵那道路芝原地区下部工事 ⑳ 写真 工 期：令和04年10月03日～令和06年2月29日 施工業者：㈱吉川組 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事 ㉑ 写真 工 期：令和05年01月16日～令和06年2月29日 施工業者：㈱加藤工務店 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先～恵那市武並町地先 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事 ㉒  準備工 工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日 施工業者：㈱中島工務店 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先 進捗率：予定 0.2% 実績
令和4年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事 ㉓ 写真 工 期：令和04年12月06日～令和06年02月29日 施工業者：㈱吉川工務店 施工箇所：恵那市武並町地先 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪4号橋鋼上部工事 ㉔ 写真 工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日 施工業者：宇野重工㈱ 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪1号橋鋼上部工事 ㉕ 写真 工 期：～令和06年2月29日 施工業者：瀬上工業㈱ 施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～下沢 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 多治見国道交通事故対策工事 ㉖ 写真 工 期：令和04年09月15日～令和05年02月28日 施工業者：セントラル建設㈱ 施工箇所：瑞浪維持出張所管内 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 多治見国道西部除雪工事 ㉗ 写真 工 期：～令和05年3月31日 施工業者：㈱藤本組 施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP 進捗率：予定 % 実績 %

令和4年度 多治見国道西部除雪工事

②8

写真

工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp
進 捗 率：予定 % 実績 %

令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事

②

写真

工 期：令和04年10月01日～令和06年10月31日
施工業者：(有)木曾ハイウエーサービス
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp
進 捗 率：予定0.0% 実績

