

令和4年10月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率	②（中津川出張所管内）		進 捗 率	③（落合川流域）		進 捗 率
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定 91.2%	工 事 名：令和3年度 中津川出張所管内整備工事		予定 92.8%	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事		予定 78.1%
契約工期： 令和3年4月20日 ～ 令和4年11月7日 変更工期： 令和5年2月18日		実施	契約工期： 令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	契約工期： 令和4年3月14日 ～ 令和5年2月28日		実施
請負業者名：（株）鳴海組		差	請負業者名：（株）吉川工務店		差	請負業者名：（株）吉川工務店		差
								
						馬籠地区 薬師沢		神坂地区 冷川
今月作業：砂防土工、法面工、災害復旧等			今月作業：松尾谷管理用道路、島田・四ツ目除草等			今月作業：後片付け等（馬籠地区 薬師沢）		砂防土工、床固め工、排水構造物工、構造物撤去工等（神坂地区 冷川）
来月予定：法面工、仮設水路等			来月予定：松尾谷管理用道路、大又沢伐採、川上残土処理場整備等			来月予定：—		床固め工等（神坂地区 冷川）
④（中津川流域）		進 捗 率	⑤（四ツ目川流域）		進 捗 率	⑥（本川筋）		進 捗 率
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川護岸整備工事		予定 67.0%	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 下平次砂防堰堤改築工事		予定 98.4%	工 事 名：令和4年度 木曽川水系 和田沢管理用道路工事		予定 25.8%
契約工期： 令和4年4月25日 ～ 令和5年2月28日		実施	契約工期： 令和4年5月10日 ～ 令和5年2月28日		実施	契約工期： 令和4年6月17日 ～ 令和5年3月24日		実施
請負業者名：（株）加藤工務店		差	請負業者名：（株）加藤工務店		差	請負業者名：（株）加藤工務店		差
								
今月作業：流路護岸工、根固め・水制工等			今月作業：鋼製堰堤工等			今月作業：道路土工、仮設工、伐採工等		今月作業：仮設工等
来月予定：流路護岸工、根固め・水制工、仮設工等			来月予定：コンクリート堰堤工等			来月予定：道路土工、排水構造物工等		来月予定：構造物撤去工、流路護岸工等

令和4年10月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑧（落合川流域）		進捗率		⑨（本川筋）		進捗率				進捗率	
工事名：令和4年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定	4.1%	工事名：令和4年度 木曽川水系 アラクラ沢砂防堰堤工事		予定	6.4%			予定	
契約工期：令和4年9月5日 ～ 令和5年3月16日		実施		契約工期：令和4年9月1日 ～ 令和5年3月16日		実施				実施	
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）中島工務店		差				差	
											
今月作業：仮設工 等				今月作業：準備工、法面工、構造物撤去工、道路土工、排水構造物工 等				今月作業：		今月作業：	
来月予定：コンクリート堰堤工、仮設工 等				来月予定：伐採工、構造物撤去工、仮設工 等				来月予定：		来月予定：	
		進捗率				進捗率				進捗率	
工事名：		予定		工事名：		予定		工事名：		予定	
契約工期：		実施		契約工期：		実施		契約工期：		実施	
請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差	
今月作業：				今月作業：				今月作業：		今月作業：	
来月予定：				来月予定：				来月予定：		来月予定：	

令和4年10月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

①

工事名： 令和3年度
妻木出張所管内整備工事
工 期： 令和3年12月14日 ～ 令和4年11月30日
施工業者：(株)藤本組
進捗率： 予定 95.0 % 実施 差

富士下堰堤下流整備



《今月作業》【指示：7】グリーンベルト補助作業
《12月作業》-

②

工事名： 令和3年度
庄内川水系 町一の洞砂防堰堤工事
工 期： 令和4年3月28日 ～ 令和5年2月28日
施工業者：(株)藤本組
進捗率： 予定 59.2 % 実施 差



町地区

《今月作業》【町地区】コンクリート堰堤工(堰堤本体工)、法面工(かご工)
【一の洞地区】準備工
《12月作業》【町地区】コンクリート堰堤工(副堰堤工、垂直壁工、側壁工)
【一の洞地区】準備工

③

工事名： 令和4年度
庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事
工 期： 令和4年6月1日 ～ 令和5年3月24日
施工業者：(株)吉川組
進捗率： 予定 44.6 % 実施 差



コンクリート堰堤



工事用道路

《今月作業》構造物撤去工 コンクリート取壊し、表面処理
作業土工 床掘
《12月作業》コンクリート堰堤工 差し筋削孔、
本体工 型枠、コンクリート

④

工事名：
工 期：
施工業者：
進捗率： 差

《今月作業》
《12月作業》

令和4年 10月末 上松出張所 工事進捗状況

①	令和3年度 多治見電気通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)	令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)	令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)																
	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %																
	R3. 9.27～R4. 8.31 週休2日	R3.12. 1～R5. 1.31 週休2日、ICT	R3.12. 1～R4.11.30 週休2日	R3.12. 6～R4.12.20 週休2日、CIM、ICT																
																				
今月作業	-					砂防土工					植生工・応急処理工・舗装工(指示13)					仮設工、道路土工、排水構造物工				
来月予定	-					仮設工 片付け工					緑石工・舗装工(指示13)					仮設工、道路土工、排水構造物工、法面工				

⑤	令和3年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)	令和3年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	令和3年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曽土建工業(株)	令和4年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)																
	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %	進捗率(予定工程) %																
	R4. 4. 1～R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT	R4. 5. 2～R5. 2.28 週休2日	R4. 5.10～R5. 2.28 週休2日	R4. 6. 2～R5. 3.24 週休2日、ICT																
																				
今月作業	片付け					構造物撤去工(コンクリート削孔・コンクリート切断)					コンクリート堰堤工(差し筋、型枠、コンクリート打設) 鋼製堰堤工(鋼製枠)					砂防土工(残土処理工) コンクリート堰堤工(作業土工) 仮設工(工事用道路工)				
来月予定	書類作成					構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し)					コンクリート堰堤工(型枠、二次コンクリート) 鋼製堰堤工(鋼製枠)					コンクリート堰堤工 (型枠組立・コンクリート打設)				

令和4年 10月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨	令和4年度 木曽川水系 上松管内除石工事			⑩	令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事			⑪	令和4年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事			⑫				
		施工業者		木曾土建工業(株)		施工業者		朝日電気工業(株)		施工業者		大宗土建(株)					
		進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%					
		R4. 9. 5～R5. 3.16		週休2日、ICT		R4. 9.26～R5. 2.28		週休2日		R4. 11. 1～R6. 1.31		週休2日					
						写真無し				写真無し							
今月作業		砂防土工:掘削・残土処理				施工計画書作成のみ				—							
来月予定		砂防土工:掘削・残土処理				現場調査、設計照査				施工計画書							


	⑬				⑭				⑮				⑯				
今月作業																	
来月予定																	

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



21号BP(上) 18.00kp~17.40kp 道路除草
 工 期: 令和02年10月30日~令和05年10月31日
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)
 施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp
 R21 3.0kp~22.0kp 可見御嵩BP
 進 捗 率: 予定 80.4% 実績

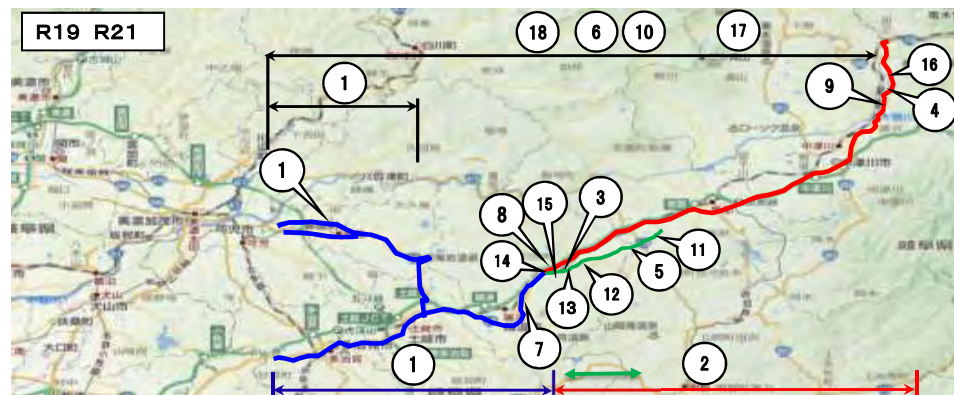

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号78.100kp(上) 防草対策工
 工 期: 令和02年04月01日~令和04年10月31日
 施工業者: (有) 木曾ハイウェイサービス
 施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp
 進 捗 率: 予定100.0% 実績 **完**

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

③



4号横断函渠工
 工 期: 令和02年09月04日~令和04年05月31日
 施工業者: 板垣建設(株)
 施工箇所: 瑞浪市釜戸地先
 進 捗 率: 予定 100% 実績 **完**

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2.3号)
 工 期: 令和02年03月29日~令和04年7月28日
 施工業者: (株) 加藤工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先
 進 捗 率: 予定 91.3% 実績 **完**

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



道路土工 排水構造物工 法面工
 工 期: 令和03年05月11日~令和04年12月15日
 施工業者: 恵中建設(株)
 施工箇所: 恵那市武並町地先
 進 捗 率: 予定 85.8% 実績

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



CCTV設備工
 工 期: 令和03年08月17日~令和04年07月8日
 施工業者: 松栄電子工業(株)
 施工箇所: 多治見市~中津川市一本松地先
 進 捗 率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

⑦



橋脚巻立て工
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年06月30日
 施工業者: (株) 吉川工務店
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先
 進 捗 率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



舗装工、区画線工
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年09月28日
 施工業者: 鳴海組
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
 進 捗 率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



法面工、ブロック積工、排水構造物工
 工 期: 令和03年11月9日~令和04年12月28日
 施工業者: (株) 吉川工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市落合
 進 捗 率: 予定 82.0% 実績

令和3年度 多治見国道橋梁補修工事

⑩



現場塗装工、舗装工、橋梁付属物工
 工 期: 令和04年3月30日~令和05年2月17日
 施工業者: (株) 梅田組
 施工箇所: 恵那市、中津川市、御嵩町
 進 捗 率: 予定 82.8% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事

⑪



防護柵工
 工 期: 令和04年03月31日~令和05年06月23日
 施工業者: (株) 中島工務店
 施工箇所: 恵那市武並町
 進 捗 率: 予定 20.0% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



土留・仮締切工 鋼矢板打設、逆T式擁壁工 型枠、鉄筋、コンクリート
 工 期: 令和04年04月01日~令和05年06月23日
 施工業者: (株) 中島工務店
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町
 進 捗 率: 予定 20.2% 実績

瑞浪国道維持出張所 工事進捗状況 2/2

令和 4年 11月8日現在

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

13



道路土工・法面工・擁壁工・排水工

工 期：令和04年04月01日～令和05年3月24日

施工業者：青協建設（株）

施工箇所：瑞浪市釜戸町

進捗率：予定 33.5% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

14



土留・仮締切工（鋼矢板圧入）

工 期：令和04年04月04日～令和05年03月24日

施工業者：（株）市川工務店

施工箇所：瑞浪市土岐町

進捗率：予定 43.7% 実績

令和3年度 多治見国道道路照明設備工事

15



道路照明設備工

工 期：令和04年03月09日～令和05年02月28日

施工業者：（株）清水電気商会

施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

進捗率：予定 65.0% 実績

令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事

16



法面工・法枠工

工 期：令和04年04月30日～令和04年12月28日

施工業者：（株）加藤工務店

施工箇所：中津川市山口

進捗率：予定 30.0% 実績

令和4年度 多治見国道標識工事

17



準備工

工 期：令和04年06月16日～令和05年02月28日

施工業者：（株）キクテック

施工箇所：瑞浪出張所管内

進捗率：予定 7.0% 実績

令和4年度 多治見国道電気通信設備工事

18

写真

準備工

工 期：令和04年08月02日～令和05年2月28日

施工業者：エフコム㈱

施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先

進捗率：予定 % 実績 %

令和4年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事

19



準備工、家屋調査

工 期：令和04年09月01日～令和05年2月28日

施工業者：小池土木㈱

施工箇所：可児郡御嵩町

進捗率：予定 13.1% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路芝原地区下部工事

20



準備工

工 期：令和04年10月03日～令和06年2月29日

施工業者：榑吉川組

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

進捗率：予定 0.2% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

21

写真

工 期：令和05年01月16日～令和06年2月29日

施工業者：榑加藤工務店

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先～恵那市武並町地先

進捗率：予定 % 実績 %

令和4年度 瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事

22



構造物撤去工

工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日

施工業者：榑中島工務店

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

進捗率：予定 2.3% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事

23

写真

工 期：令和04年12月06日～令和06年02月29日

施工業者：榑吉川工務店

施工箇所：恵那市武並町地先

進捗率：予定 % 実績 %

令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪4号橋鋼上部工事

24

写真

工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日

施工業者：宇野重工㈱

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

進捗率：予定 % 実績 %

令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪1号橋鋼上部工事

25

写真

工 期：令和04年09月27日～令和07年2月28日

施工業者：瀬上工業㈱

施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～下沢

進捗率：予定 % 実績 %

令和4年度 多治見国道交通事故対策工事

26



準備工

工 期：令和04年09月15日～令和05年02月28日

施工業者：セントラル建設㈱

施工箇所：瑞浪維持出張所管内

進捗率：予定 3.1% 実績

令和4年度 多治見国道西部除雪工事

27

写真

工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日

施工業者：榑藤本組

施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp

R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

進捗率：予定 % 実績 %

令和4年度 多治見国道西部除雪工事 ②8 写真 工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日 施工業者：(株)中島工務店 施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp 進 捗 率：予定 % 実績 %	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事 ②  道路除草工 工 期：令和04年10月01日～令和06年10月31日 施工業者：(有)木曾ハイウエーサービス 施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp 進 捗 率：予定 5.0% 実績			
--	--	--	--	--
