

令和4年11月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進捗率	②（中津川出張所管内）		進捗率	③（落合川流域）		進捗率
工事名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定 100.0%	工事名：令和3年度 中津川出張所管内整備工事		予定 100.0%	工事名：令和3年度 木曽川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事		予定 79.7%
契約工期：令和3年4月20日 ～ 令和4年11月7日 変更工期：令和5年2月18日		実施	契約工期：令和3年12月1日 ～ 令和4年11月30日		実施	契約工期：令和4年3月14日 ～ 令和5年2月28日		実施
請負業者名：(株)鳴海組		差	請負業者名：(株)吉川工務店		差	請負業者名：(株)吉川工務店		差
								
			完了			馬籠地区 薬師沢 完了		神坂地区 冷川
今月作業：法面工 等			今月作業：松尾谷管理用道路、川上残土処理場整備 完成検査(令和4年12月5日)等			今月作業：—		砂防土工、床固め工、排水構造物工、仮設工 等(神坂地区 冷川)
来月予定：法面工、仮設水路 等			来月予定：—			来月予定：—		砂防土工、仮設工 等(神坂地区 冷川)
④（中津川流域）		進捗率	⑤（四ツ目川流域）		進捗率	⑥（本川筋）		進捗率
工事名：令和3年度 木曽川水系 中津川護岸整備工事		予定 82.0%	工事名：令和3年度 木曽川水系 下平次砂防堰堤改築工事		予定 100.0%	工事名：令和4年度 木曽川水系 和田沢管理用道路工事		予定 38.6%
契約工期：令和4年4月25日 ～ 令和5年2月28日		実施	契約工期：令和4年5月10日 ～ 令和5年2月28日		実施	契約工期：令和4年6月17日 ～ 令和5年3月24日		実施
請負業者名：(株)加藤工務店		差	請負業者名：(株)加藤工務店		差	請負業者名：(株)加藤工務店		差
								
			完了					
今月作業：根固め・水制工、仮設工 等			今月作業：コンクリート堰堤工、鋼製堰堤工、後片付け等			今月作業：道路土工 等		今月作業：流路護岸工、床固め工 等
来月予定：砂防土工、根固め・水制工、仮設工 等			来月予定：完成検査(令和4年12月20日)			来月予定：道路土工、排水構造物工 等		来月予定：流路護岸工、床固め工、根固め・水制工 等

令和4年11月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑧（落合川流域）		進捗率		⑨（本川筋）		進捗率				進捗率	
工事名：令和4年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定	17.7%	工事名：令和4年度 木曽川水系 アラクラ沢砂防堰堤工事		予定	14.3%			予定	
契約工期：令和4年9月5日 ～ 令和5年3月16日		実施		契約工期：令和4年9月1日 ～ 令和5年3月16日		実施				実施	
請負業者名：(株)鳴海組		差		請負業者名：(株)中島工務店		差				差	
											
今月作業：コンクリート堰堤工、仮設工 等				今月作業：伐採工、構造物撤去工、仮設工、排水構造物工、舗装工 等				今月作業：			
来月予定：コンクリート堰堤工、仮設工 等				来月予定：砂防土工、法面工、流出抑制対策工 等				来月予定：			
		進捗率				進捗率				進捗率	
工事名：		予定		工事名：		予定		工事名：		予定	
契約工期：		実施		契約工期：		実施		契約工期：		実施	
請負業者名：		差		請負業者名：		差		請負業者名：		差	
今月作業：				今月作業：				今月作業：			
来月予定：				来月予定：				来月予定：			

令和4年11月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工 事 名 : 令和3年度 妻木出張所管内整備工事 工 期 : 令和3年12月14日 ~ 令和4年11月30日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率: 予定 100.0 % 実施 差 工事完了 《今月作業》- 《1月作業》-	② 工 事 名 : 令和3年度 庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事 工 期 : 令和4年3月28日 ~ 令和5年2月28日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率: 予定 59.9 % 実施 差  《今月作業》【町地区】コンクリート堰堤工(堰堤本体工)、法面工(かご工) 【一の洞地区】準備工 《1月作業》【町地区】コンクリート堰堤工(副堰堤工、垂直壁工、側壁工) 【一の洞地区】準備工
③ 工 事 名 : 令和4年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事 工 期 : 令和4年6月1日 ~ 令和5年3月24日 施工業者: (株)吉川組 進 捗 率: 予定 55.8 % 実施 差 コンクリート堰堤   《今月作業》コンクリート堰堤工 差し筋削孔、 本体工 型枠、コンクリート 《1月作業》コンクリート堰堤工 本体工 型枠、コンクリート	④ 工 事 名 : 令和4年度 妻木出張所管内整備工事 工 期 : 令和4年12月1日 ~ 令和5年11月30日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率: 予定 0.0 % 実施 差 準備中 《今月作業》除草工(市之倉流路、鍛冶ヶ入) 《1月作業》防護柵工

令和4年 11月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和3年度 多治見電気通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)	②	令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	③	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)	④	令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) % (94.1)		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) % (96.1)
		R3. 9.27～R4. 8.31 週休2日		R3.12. 1～R5. 1.31 週休2日、ICT		R3.12. 1～R4.11.30 週休2日		R3.12. 6～R4.12.20 週休2日、CIM、ICT
今月 作業								
		-		砂防土工 仮設工 片付け工		緑石工・応急処理工・舗装工(指示13) 11月29日完成検査		仮設工、道路土工、排水構造物工、法面工
		-		片付け工		-		仮設工、法面工、舗装工
	⑤	令和3年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)	⑥	令和3年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	⑦	令和3年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曽土建工業(株)	⑧	令和4年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) % (93.7)		進捗率(予定工程) % (86.8)		進捗率(予定工程) % (52.8)
		R4. 4. 1～R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT		R4. 5. 2～R5. 2.28 週休2日		R4. 5.10～R5. 2.28 週休2日		R4. 6. 2～R5. 3.24 週休2日、ICT
今月 作業								
		書類作成		構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し)		コンクリート堰堤工(差し筋、型枠、コンクリート打設) 鋼製堰堤工(鋼製枠)		コンクリート堰堤工 (型枠組立・コンクリート打設)
		12月22日完成検査予定		構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し) 仮設工(取壊しヤード撤去・工所用道路工)		コンクリート堰堤工(型枠、二次コンクリート) 鋼製堰堤工(鋼製枠) 12月23日完成検査予定		コンクリート堰堤工 (型枠組立・コンクリート打設)

令和4年 11月末 上松出張所 工事進捗状況


	⑨	令和4年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑩	令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事 施工業者 朝日電気工業(株)			⑪	令和4年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事 施工業者 大宗土建(株)			⑫	令和4年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)						
		進捗率(予定工程)		%		(47.7)	進捗率(予定工程)			%	(1.0)	進捗率(予定工程)		%	(0.0)	進捗率(予定工程)		%	-	
		R4. 9. 5～R5. 3.16		週休2日、ICT		R4. 9.26～R5. 2.28		週休2日		R4. 11. 1～R6. 1.31		週休2日		R4.12. 1～R5.11.30		週休2日				
														写真無し						
今月 作業		砂防土工:掘削・残土処理				現地調査 (一部)一時中止 令和4年11月14日から 102日間 (令和5年2月23日まで)				設計照査、施工計画書、書類作成				-						
来月 予定		砂防土工:掘削・残土処理 仮設工:仮設撤去・片付け				現地調査				仮設工(道路拡幅)				施工計画書 植生工(植生マット)指示1						
	⑬				⑭				⑮				⑯							
今月 作業																				
来月 予定																				

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(下) 40.60km~41.00km 道路除草
 工 期: 令和02年10月30日~令和05年10月31日
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)
 施工箇所: R19 31.5km~55.2km
 R21 3.0km~22.0km 可児御嵩BP
 進捗率: 予定 82.5% 実績

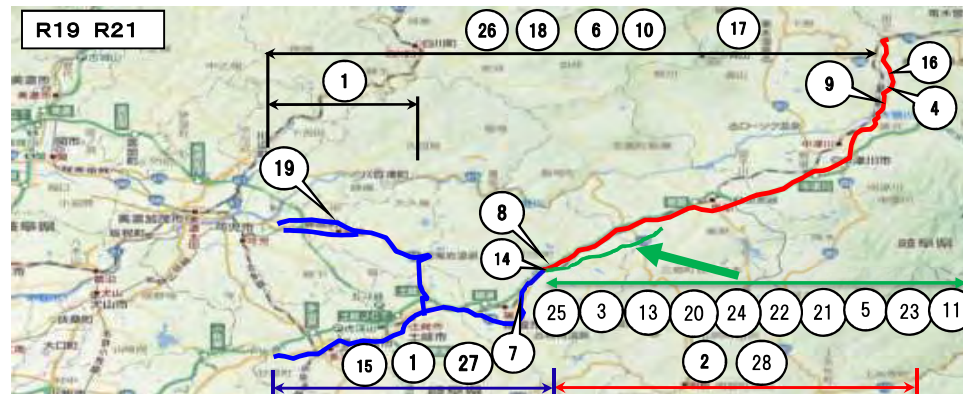

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号78.100km(上) 防草対策工
 工 期: 令和02年04月01日~令和04年10月31日
 施工業者: (有)木曾ハイウェイサービス
 施工箇所: R19 55.2km~97.0km
 進捗率: 予定100.0% 実績 **完**

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

③



4号横断函渠工
 工 期: 令和02年09月04日~令和04年05月31日
 施工業者: 板垣建設(株)
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2.3号)
 工 期: 令和02年03月29日~令和04年7月28日
 施工業者: (株)加藤工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先
 進捗率: 予定 91.3% 実績 **完**

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



道路土工 排水構造物工 法面工
 工 期: 令和03年05月11日~令和04年12月15日
 施工業者: 恵中建設(株)
 施工箇所: 恵那市武並町地先
 進捗率: 予定 98.7% 実績

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



CCTV設備工
 工 期: 令和03年08月17日~令和04年07月8日
 施工業者: 松栄電子工業(株)
 施工箇所: 多治見市~中津川市一本松地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

⑦



橋脚立て工
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年06月30日
 施工業者: (株)吉川工務店
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



舗装工、区画線工
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年09月28日
 施工業者: 鳴海組
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



法面工、ブロック積工、排水構造物工
 工 期: 令和03年11月9日~令和04年12月28日
 施工業者: (株)吉川工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市落合
 進捗率: 予定 92.0% 実績

令和3年度 多治見国道橋梁補修工事

⑩



橋梁支承工
 工 期: 令和04年3月30日~令和05年2月17日
 施工業者: (株)梅田組
 施工箇所: 恵那市、中津川市、御嵩町
 進捗率: 予定 90.3% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事

⑪



畦畔工、排水構造物工、カルバート工
 工 期: 令和04年03月31日~令和05年06月23日
 施工業者: (株)中島工務店
 施工箇所: 恵那市武並町
 進捗率: 予定 20.0% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



土留・仮締切工 鋼矢板打設、逆T式擁壁工 型枠、鉄筋、コンクリート
 工 期: 令和04年04月01日~令和05年06月23日
 施工業者: (株)中島工務店
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町
 進捗率: 予定 35.6% 実績

瑞浪国道維持出張所 工事進捗状況 2/2

令和 4年 12月13日現在

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事 ⑬  道路土工・法面工・排水工 工 期：令和04年04月01日～令和05年3月24日 施工業者：青協建設（株） 施工箇所：瑞浪市釜戸町 進捗率：予定 47.4% 実績	令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事 ⑭  カルバート工 工 期：令和04年04月04日～令和05年03月24日 施工業者：（株）市川工務店 施工箇所：瑞浪市土岐町 進捗率：予定 49.0% 実績	令和3年度 多治見国道道路照明設備工事 ⑮  道路照明設備工 工 期：令和04年03月09日～令和05年02月28日 施工業者：（株）清水電気商会 施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内 進捗率：予定 91.0% 実績	令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事 ⑯  法面工、法枠工 工 期：令和04年04月30日～令和04年12月16日 施工業者：（株）加藤工務店 施工箇所：中津川市山口 進捗率：予定 65.0% 実績	令和4年度 多治見国道標識工事 ⑰  標識工、区画線工、道路付属物工 工 期：令和04年06月16日～令和05年02月28日 施工業者：（株）キクテック 施工箇所：瑞浪出張所管内 進捗率：予定 31.0% 実績
令和4年度 多治見国道電気通信設備工事 ⑱ 写真 機器製作 工 期：令和04年08月02日～令和05年2月28日 施工業者：エフコム㈱ 施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先 進捗率：予定 34.0 % 実績	令和4年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事 ⑲  準備工 工 期：令和04年09月01日～令和05年2月28日 施工業者：小池土木㈱ 施工箇所：可児郡御嵩町 進捗率：予定 27.7% 実績	令和4年度 瑞浪恵那道路芝原地区下部工事 ⑳  準備工 工 期：令和04年10月03日～令和06年2月29日 施工業者：榑吉川組 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先 進捗率：予定 0.4 % 実績	令和4年度 瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事 ㉑ 写真 工 期：令和05年01月16日～令和06年2月29日 施工業者：榑加藤工務店 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先～恵那市武並町地先 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事 ㉒  準備工、構造物撤去工、仮設工 工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日 施工業者：榑中島工務店 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先 進捗率：予定 4.6% 実績
令和4年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事 ㉓ 写真 工 期：令和04年12月06日～令和06年02月29日 施工業者：榑吉川工務店 施工箇所：恵那市武並町地先 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪4号橋鋼上部工事 ㉔ 写真 工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日 施工業者：宇野重工㈱ 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪1号橋鋼上部工事 ㉕ 写真 工 期：令和04年09月27日～令和07年2月28日 施工業者：瀬上工業㈱ 施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～下沢 進捗率：予定 % 実績 %	令和4年度 多治見国道交通事故対策工事 ㉖  薄層カー舗装工・区画線工 工 期：令和04年09月15日～令和05年02月28日 施工業者：セントラル建設㈱ 施工箇所：瑞浪維持出張所管内 進捗率：予定 29.7% 実績	令和4年度 多治見国道西部除雪工事 ㉗  環境整備工 工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日 施工業者：榑藤本組 施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP 進捗率：予定 7.0% 実績

令和4年度 多治見国道東部除雪工事

②8



環境整備工

工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日
施工業者：(株)中島工務店
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp
進 捗 率：予定 7.0 % 実績

令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号77.700kp(下) 欠損部補修工

工 期：令和04年10月01日～令和06年10月31日
施工業者：(有)木曾ハイウエーサービス
施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp
進 捗 率：予定 13.0% 実績
