

令和4年12月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率	②（落合川流域）		進 捗 率	③（中津川流域）		進 捗 率
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定 92.8%	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事		予定 90.7%	工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川護岸整備工事		予定 65.0%
契 約 工 期：令和3年4月20日 ～ 令和4年11月7日		実施	契 約 工 期：令和4年3月14日 ～ 令和5年2月28日		実施	契 約 工 期：令和4年4月25日 ～ 令和5年2月28日		実施
変 更 工 期：令和5年3月30日								
請負業者名：(株)鳴海組		差	請負業者名：(株)吉川工務店		差	請負業者名：(株)加藤工務店		差
								
			馬籠地区 薬師沢 完了			神坂地区 冷川		
今月作業：法面工 等			今月作業：—			砂防土工 等(神坂地区 冷川)		
来月予定：仮設工 等			来月予定：完成検査(令和5年1月31日)(馬籠地区 薬師沢)			砂防土工、後片付け、完成検査(令和5年1月31日)等(神坂地区 冷川)		
④（四ツ目川流域）		進 捗 率	⑤（本川筋）		進 捗 率	⑥（中津川流域）		進 捗 率
工 事 名：令和3年度 木曽川水系 下平次砂防堰堤改築工事		予定 100.0%	工 事 名：令和4年度 木曽川水系 和田沢管理用道路工事		予定 44.6%	工 事 名：令和4年度 木曽川水系 川上流路工事		予定 37.5%
契 約 工 期：令和4年5月10日 ～ 令和5年2月28日		実施	契 約 工 期：令和4年6月17日 ～ 令和5年3月24日		実施	契 約 工 期：令和4年9月1日 ～ 令和5年3月16日		実施
請負業者名：(株)加藤工務店		差	請負業者名：(株)加藤工務店		差	請負業者名：(株)中島工務店		差
								
完了								
今月作業：完成検査(令和4年12月20日)			今月作業：道路土工 等			今月作業：流路護岸工、床固め工、根固め・水制工 等		
来月予定：—			来月予定：道路土工、法面工 等			来月予定：砂防土工、根固め・水制工 等		
								
						今月作業：コンクリート堰堤工、仮設工 等		
						来月予定：コンクリート堰堤工 等		

令和4年12月末 中津川出張所 工事進捗状況

⑧ (本川筋)		進捗率		⑨ (中津川出張所管内)		進捗率				進捗率				進捗率	
工事名: 令和4年度 木曽川水系 アラクラ沢砂防堰堤工事		予定	33.1%	工事名: 令和4年度 中津川出張所管内整備工事		予定	0.0%			予定				予定	
契約工期: 令和4年9月1日 ~ 令和5年3月16日		実施		契約工期: 令和4年12月14日 ~ 令和5年11月30日		実施				実施				実施	
請負業者名: (株)中島工務店		差		請負業者名: (株)加藤工務店		差				差				差	
				工事着手前											
今月作業: 砂防土工、法面工、流出抑制対策工 等				今月作業: 準備工				今月作業:				今月作業:			
来月予定: 法面工、流出抑制対策工 等				来月予定: 準備工 等				来月予定:				来月予定:			
		進捗率				進捗率				進捗率				進捗率	
工事名:		予定		工事名:		予定		工事名:		予定		工事名:		予定	
契約工期:		実施		契約工期:		実施		契約工期:		実施		契約工期:		実施	
請負業者名:		差		請負業者名:		差		請負業者名:		差		請負業者名:		差	
今月作業:				今月作業:				今月作業:				今月作業:			
来月予定:				来月予定:				来月予定:				来月予定:			

令和4年12月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工 事 名： 令和3年度 妻木出張所管内整備工事 工 期： 令和3年12月14日 ～ 令和4年11月30日 施工業者：(株)藤本組 進 捗 率： 予定 100.0 % 実施 差	② 工 事 名： 令和3年度 庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事 工 期： 令和4年3月28日 ～ 令和5年2月28日 施工業者：(株)藤本組 進 捗 率： 予定 68.5 % 実施 差
工事完了	 町地区
《今月作業》－ 《2月作業》－	《今月作業》【町地区】コンクリート堰堤工(副堰堤工、垂直壁工、側壁工) 【一の洞地区】準備工 《2月作業》【町地区】流路工(流路護岸土工)、道路改良工(道路土工・擁壁工) 【一の洞地区】準備工
③ 工 事 名： 令和4年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事 工 期： 令和4年6月1日 ～ 令和5年3月24日 施工業者：(株)吉川組 進 捗 率： 予定 48.3 % 実施 差	④ 工 事 名： 令和4年度 妻木出張所管内整備工事 工 期： 令和4年12月1日 ～ 令和5年11月30日 施工業者：(株)藤本組 進 捗 率： 予定 1.0 % 実施 差
	 市之倉川除草 市之倉里山林道除草
《今月作業》コンクリート堰堤工 本体工 型枠、コンクリート 《2月作業》コンクリート堰堤工 本体工 型枠、コンクリート	《今月作業》除草工(市之倉流路、鍛冶ヶ入) 《2月作業》防護柵工

令和4年 12月末 上松出張所 工事進捗状況

	①	令和3年度 多治見電気通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)	②	令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)	③	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)	④	令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) % (99.1)		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) % (98.1)
		R3. 9.27～R4. 8.31 週休2日		R3.12. 1～R5. 1.31 週休2日、ICT		R3.12. 1～R4.11.30 週休2日		R3.12. 6～R4.12.20 週休2日、CIM、ICT
								
今月作業		-		片付け		-		仮設工、法面工、舗装工
来月予定		-		竣工検査準備		-		仮設工、舗装工
	⑤	令和3年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)	⑥	令和3年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)	⑦	令和3年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曽土建工業(株)	⑧	令和4年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)
		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) % (89.8)		進捗率(予定工程) %		進捗率(予定工程) % (74.8)
		R4. 4. 1～R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT		R4. 5. 2～R5. 2.28 週休2日		R4. 5.10～R5. 2.28 週休2日		R4. 6. 2～R5. 3.24 週休2日、ICT
								
今月作業		12月22日完成検査		構造物撤去工(コンクリート構造物取壊し) 仮設工(取壊しヤード撤去・工所用道路工(林道復旧))		12月23日完成検査		コンクリート堰堤工 (型枠組立・コンクリート打設)
来月予定		-		運搬処理工(コンクリート殻運搬・処分)		-		コンクリート堰堤工 (型枠組立・コンクリート打設)

令和4年 12月末 上松出張所 工事進捗状況


	⑨	令和4年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑩	令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事 施工業者 朝日電気工業(株)			⑪	令和4年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事 施工業者 大宗土建(株)			⑫	令和4年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)									
		進捗率(予定工程)		%		(71.2)	進捗率(予定工程)			%	(1.5)	進捗率(予定工程)		%	(4.1)	進捗率(予定工程)		%					
		R4. 9. 5～R5. 3.16		週休2日、ICT		R4. 9.26～R5. 2.28		週休2日		R4. 11. 1～R6. 1.31		週休2日		R4.12. 1～R5.11.30		週休2日							
																							
今月 作業		砂防土工:掘削・残土処理 仮設工:仮設撤去・片付け					現地調査 (一部)一時中止 令和4年11月14日から 102日間 (令和5年2月23日まで)					準備工、ICT起工測量、仮設工(道路拡幅)、除雪					植生工(指示1)						
来月 予定		竣工検査準備					書類整理、施工図作成					仮設工(道路拡幅)、道路土工、かご工					応急処理工(指示2)						
	⑬					⑭					⑮					⑯							
今月 作業																							
来月 予定																							

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(中) 50.50kp~50.70kp 道路除草
 工 期: 令和02年10月30日~令和05年10月31日
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)
 施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp
 R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP
 進捗率: 予定 84.6% 実績

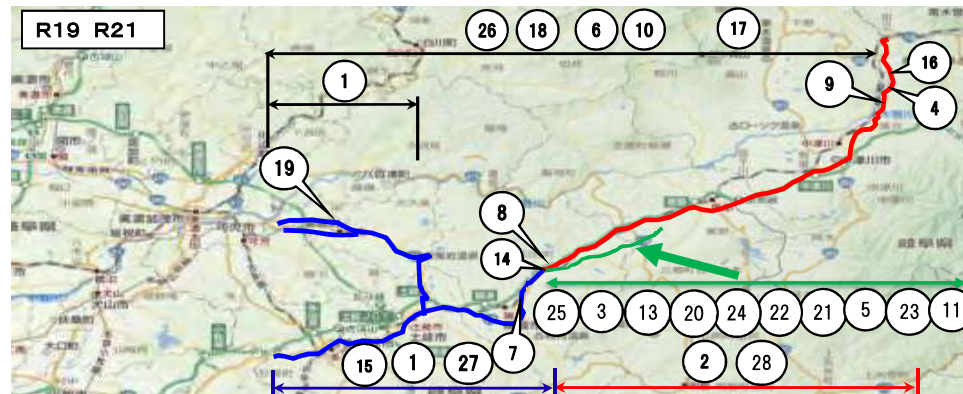

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号78.100kp(上) 防草対策工
 工 期: 令和02年04月01日~令和04年10月31日
 施工業者: (有) 木曾ハイウェイサービス
 施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp
 進捗率: 予定100.0% 実績 **完**

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

③



4号横断涵渠工
 工 期: 令和02年09月04日~令和04年05月31日
 施工業者: 板垣建設(株)
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2.3号)
 工 期: 令和02年03月29日~令和04年7月28日
 施工業者: (株) 加藤工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先
 進捗率: 予定 100.0% 実績 **完**

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



道路土工 法面工
 工 期: 令和03年05月11日~令和05年3月15日
 施工業者: 恵中建設(株)
 施工箇所: 恵那市武並町地先
 進捗率: 予定 85.1% 実績

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



CCTV設備工
 工 期: 令和03年08月17日~令和04年07月8日
 施工業者: 松栄電子工業(株)
 施工箇所: 多治見市~中津川市一本松地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

⑦



橋脚巻立て工
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年06月30日
 施工業者: (株) 吉川工務店
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



舗装工、区画線工
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年09月28日
 施工業者: 鳴海組
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



法面工、ブロック積工、排水構造物工
 工 期: 令和03年11月9日~令和04年12月28日
 施工業者: (株) 吉川工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市落合
 進捗率: 予定 100.0% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道橋梁補修工事

⑩



橋梁支承工
 工 期: 令和04年3月30日~令和05年2月17日
 施工業者: (株) 梅田組
 施工箇所: 恵那市、中津川市、御嵩町
 進捗率: 予定 97.6% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事

⑪



カルバート工
 工 期: 令和04年03月31日~令和05年06月23日
 施工業者: (株) 中島工務店
 施工箇所: 恵那市武並町
 進捗率: 予定 20.8% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



作業土工 床堀 地盤改良工
 工 期: 令和04年04月01日~令和05年06月23日
 施工業者: (株) 中島工務店
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町
 進捗率: 予定 42.8% 実績

瑞浪国道維持出張所 工事進捗状況 2/2

令和 5年 1月1日現在

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑬



道路土工・法面工・排水構造物工・護岸工

工 期：令和04年04月01日～令和05年3月24日

施工業者：青協建設（株）

施工箇所：瑞浪市釜戸町

進捗率：予定 62.3% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑭



カルバート工

工 期：令和04年04月04日～令和05年03月24日

施工業者：（株）市川工務店

施工箇所：瑞浪市土岐町

進捗率：予定 57.8% 実績

令和3年度 多治見国道道路照明設備工事

⑮

写真

道路照明設備工

工 期：令和04年03月09日～令和05年02月28日

施工業者：（株）清水電気商会

施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

進捗率：予定 95.0% 実績

令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事

⑯



法面工・アンカー工

工 期：令和04年04月30日～令和05年3月1日

施工業者：（株）加藤工務店

施工箇所：中津川市山口

進捗率：予定 65.0% 実績

令和4年度 多治見国道標識工事

⑰



標識工、区画線工、道路付属物工

工 期：令和04年06月16日～令和05年02月28日

施工業者：（株）キクテック

施工箇所：瑞浪出張所管内

進捗率：予定 63.0% 実績

令和4年度 多治見国道電気通信設備工事

⑱

写真

機器製作

工 期：令和04年08月02日～令和05年2月28日

施工業者：エフコム㈱

施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先

進捗率：予定 48.0 % 実績

令和4年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事

⑲



充填工

工 期：令和04年09月01日～令和05年2月28日

施工業者：小池土木㈱

施工箇所：可児郡御嵩町

進捗率：予定 39.3% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路芝原地区下部工事

⑳



準備工・仮設工

工 期：令和04年10月03日～令和06年2月29日

施工業者：㈱吉川組

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

進捗率：予定 0.6 % 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

㉑

写真

工 期：令和05年01月16日～令和06年2月29日

施工業者：㈱加藤工務店

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先～恵那市武並町地先

進捗率：予定 % 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事

㉒



準備工、排水構造物工

工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日

施工業者：㈱中島工務店

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

進捗率：予定 7.1% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事

㉓

写真

工 期：令和04年12月06日～令和06年02月29日

施工業者：㈱吉川工務店

施工箇所：恵那市武並町地先

進捗率：予定 % 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪4号橋鋼上部工事

㉔

写真

工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日

施工業者：宇野重工㈱

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

進捗率：予定 % 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪1号橋鋼上部工事

㉕

写真

工 期：令和04年09月27日～令和07年2月28日

施工業者：瀬上工業㈱

施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～下沢

進捗率：予定 % 実績

令和4年度 多治見国道交通事故対策工事

㉖



防護柵工

工 期：令和04年09月15日～令和05年02月28日

施工業者：セントラル建設㈱

施工箇所：瑞浪維持出張所管内

進捗率：予定 24.6% 実績

令和4年度 多治見国道西部除雪工事

㉗



凍結防止工

工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日

施工業者：㈱藤本組

施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp

R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

進捗率：予定 33.8% 実績

令和4年度 多治見国道東部除雪工事

②



除雪工

工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日

施工業者：(株)中島工務店

施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp

進 捗 率：予定 33.8 % 実績

令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



工 期：令和04年10月01日～令和06年10月31日

施工業者：(有)木曾ハイウエーサービス

施工箇所：R19 55.2kp～97.0kp

進 捗 率：予定 21.0% 実績

