

令和5年1月末 中津川出張所 工事進捗状況

①（落合川流域）		進 捗 率		②（落合川流域）		進 捗 率		③（中津川流域）		進 捗 率		④（本川筋）		進 捗 率	
工 事 名：令和2年度 木曽川水系 本谷砂防堰堤改築工事		予定 93.8%		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 薬師沢・冷川砂防堰堤工事		予定 100.0%		工 事 名：令和3年度 木曽川水系 中津川護岸整備工事		予定 80.0%		工 事 名：令和4年度 木曽川水系 和田沢管理用道路工事		予定 64.5%	
契約工期： 令和3年4月20日 ～ 令和4年11月7日 変更工期： 令和5年3月30日		実施		契約工期： 令和4年3月14日 ～ 令和5年2月28日		実施		契約工期： 令和4年4月25日 ～ 令和5年2月28日		実施		契約工期： 令和4年6月17日 ～ 令和5年3月24日		実施	
請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）吉川工務店		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差		請負業者名：（株）加藤工務店		差	
						完了									
今月作業：砂防土工、仮設工 等				今月作業：完成検査(令和5年1月31日)				今月作業：砂防土工、仮設工 等				今月作業：道路土工、法面工 等			
来月予定：砂防土工、仮設工 等				来月予定：－				来月予定：砂防土工、仮設工 等				来月予定：法面工、排水構造物工 等			
⑤（中津川流域）		進 捗 率		⑥（落合川流域）		進 捗 率		⑦（本川筋）		進 捗 率		⑧（中津川出張所管内）		進 捗 率	
工 事 名：令和4年度 木曽川水系 川上流路工事		予定 51.6%		工 事 名：令和4年度 木曽川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事		予定 66.2%		工 事 名：令和4年度 木曽川水系 アクラ沢砂防堰堤工事		予定 49.2%		工 事 名：令和4年度 中津川出張所管内整備工事		実施	
契約工期： 令和4年9月1日 ～ 令和5年3月16日		実施		契約工期： 令和4年9月5日 ～ 令和5年3月16日		実施		契約工期： 令和4年9月1日 ～ 令和5年3月16日		実施		契約工期： 令和4年12月14日 ～ 令和5年11月30日			
請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）鳴海組		差		請負業者名：（株）中島工務店		差		請負業者名：（株）加藤工務店			
															
今月作業：砂防土工、根固め・水制工 等				今月作業：コンクリート堰堤工、仮設工 等				今月作業：法面工、流出抑制対策工 等				今月作業：川上土捨て場舗装作業、松尾谷崩落土砂撤去作業 等			
来月予定：流路護岸工、床固め工、根固め・水制工 等				来月予定：コンクリート堰堤工、仮設工 等				来月予定：法面工 等				来月予定：柳樽川土砂撤去、松尾谷管理用道路整備 等			

令和4年1月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

① 工 事 名 : 令和3年度 妻木出張所管内整備工事 工 期 : 令和3年12月14日 ~ 令和4年11月30日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率: 予定 100.0 % 実施 差	② 工 事 名 : 令和3年度 庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事 工 期 : 令和4年3月28日 ~ 令和5年3月30日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率: 予定 78.0 % 実施 差
工事完了	
《今月作業》- 《3月作業》-	《今月作業》【町地区】流路護岸工、道路土工、地盤改良工、擁壁工 【一の洞地区】準備工 《3月作業》【町地区】法面工、砂防堰堤付属物設置工、舗装工、防護柵工 【一の洞地区】準備工
③ 工 事 名 : 令和4年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事 工 期 : 令和4年6月1日 ~ 令和5年3月24日 施工業者: (株)吉川組 進 捗 率: 予定 56.8 % 実施 差	④ 工 事 名 : 令和4年度 妻木出張所管内整備工事 工 期 : 令和4年12月1日 ~ 令和5年11月30日 施工業者: (株)藤本組 進 捗 率: 予定 5.0 % 実施 差
	
コンクリート堰堤工 《今月作業》本体・側壁工 型枠、コンクリート 砂防土工 掘削工 残土処理工 《3月作業》コンクリート堰堤工 本体・側壁工、鋼製堰堤工、防止柵工 砂防土工 掘削工 残土処理工	《今月作業》里山林道(防草シート貼付け) 《3月作業》防護柵工

令和5年 1月末 上松出張所 工事進捗状況

①	令和3年度 多治見電気通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株)			②	令和3年度 木曽川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株)			③	令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)			④	令和3年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株)			
	進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%	
	R3. 9.27～R4. 8.31		週休2日		R3.12. 1～R5. 1.31		週休2日、ICT		R3.12. 1～R4.11.30		週休2日		R3.12. 6～R5.2.10		週休2日、CIM、ICT	
																
今月作業	-				1月26日完成検査				-				仮設工			
来月予定	-				-				-				2月8日完成検査			

⑤	令和3年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)			⑥	令和3年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株)			⑦	令和3年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曽土建工業(株)			⑧	令和4年度 木曽川水系 宮の沢砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株)			
	進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%		進捗率(予定工程)		%	
	R4. 4. 1～R5. 2.28		週休2日、CIM、ICT		R4. 5. 2～R5. 3.14		週休2日		R4. 5.10～R5. 2.28		週休2日		R4. 6. 2～R5. 3.24		週休2日、ICT	
																
今月作業	-				運搬処理工(コンクリート搬運・処分)				-				コンクリート堰堤工 (型枠組立・コンクリート打設)			
来月予定	-				運搬処理工(コンクリート搬運・処分)				-				後片付け			

令和5年 1月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨	令和4年度 木曽川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)			⑩	令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事 施工業者 朝日電気工業(株)			⑪	令和4年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事 施工業者 大宗土建(株)			⑫	令和4年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)						
		進捗率(予定工程)		%		(94.5)	進捗率(予定工程)			%	(1.9)	進捗率(予定工程)		%	(8.4)	進捗率(予定工程)		%		
		R4. 9. 5～R5. 3.16		週休2日、ICT		R4. 9.26～R5. 6.9		週休2日		R4. 11. 1～R6. 1.31		週休2日		R4.12. 1～R5.11.30		週休2日				
																				
今月作業	-				現地調査(光空き線調査)				仮設工(道路拡幅)、道路土工、かご工、除雪				応急処理工(指示2)下在整備							
来月予定	2月13日完成検査				書類整理、施工図作成				かご工、道路土工、側溝工、伐採工				植生工(指示1)下洞堰堤 応急処理工(指示2)下在整備							


	⑬				⑭				⑮				⑯				
今月作業																	
来月予定																	

令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事

①



19号(中) 50.80kp~51.90kp 道路除草
 工 期: 令和02年10月30日~令和05年10月31日
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)
 施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp
 R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP
 進捗率: 予定 86.7% 実績

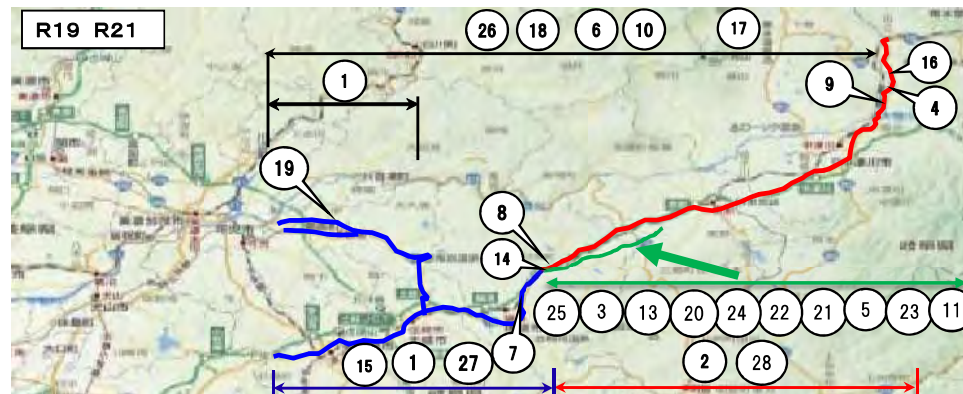

令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号78.100kp(上) 防草対策工
 工 期: 令和02年04月01日~令和04年10月31日
 施工業者: (有) 木曾ハイウェイサービス
 施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp
 進捗率: 予定100.0% 実績 **完**

令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

③



4号横断函渠工
 工 期: 令和02年09月04日~令和04年05月31日
 施工業者: 板垣建設(株)
 施工箇所: 瑞浪市釜戸地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和2年度多治見国道中津川地区整備工事

④



地山補強土工(2,3号)
 工 期: 令和02年03月29日~令和04年7月28日
 施工業者: (株) 加藤工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先
 進捗率: 予定 100.0% 実績 **完**

令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

⑤



道路土工
 工 期: 令和03年05月11日~令和05年3月15日
 施工業者: 恵中建設(株)
 施工箇所: 恵那市武並町地先
 進捗率: 予定 93.5% 実績

令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事

⑥



CCTV設備工
 工 期: 令和03年08月17日~令和04年07月8日
 施工業者: 松栄電子工業(株)
 施工箇所: 多治見市~中津川市一本松地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事

⑦



橋脚巻立て工
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年06月30日
 施工業者: (株) 吉川工務店
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事

⑧



舗装工、区画線工
 工 期: 令和03年09月13日~令和04年09月28日
 施工業者: 鳴海組
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事

⑨



法面工、舗装復旧工
 工 期: 令和03年11月9日~令和04年12月28日
 施工業者: (株) 吉川工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市落合
 進捗率: 予定 100.0% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道橋梁補修工事

⑩



準備工
 工 期: 令和04年3月30日~令和05年2月17日
 施工業者: (株) 梅田組
 施工箇所: 恵那市、中津川市、御嵩町
 進捗率: 予定 99.4% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事

⑪



カルバート工
 工 期: 令和04年03月31日~令和05年06月23日
 施工業者: (株) 中島工務店
 施工箇所: 恵那市武並町
 進捗率: 予定 31.4% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事

⑫



地盤改良工
 工 期: 令和04年04月01日~令和05年06月23日
 施工業者: (株) 中島工務店
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町
 進捗率: 予定 54.4% 実績

瑞浪国道維持出張所 工事進捗状況 2/2

令和 5年 2月1日現在

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑬



道路土工・法面工・排水構造物工・護岸工

工 期：令和04年04月01日～令和05年3月24日

施工業者：青協建設（株）

施工箇所：瑞浪市釜戸町

進捗率：予定 77.2% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑭



カルバート工

工 期：令和04年04月04日～令和05年03月24日

施工業者：（株）市川工務店

施工箇所：瑞浪市土岐町

進捗率：予定 76.6% 実績

令和3年度 多治見国道道路照明設備工事

⑮



道路照明設備工

工 期：令和04年03月09日～令和05年02月28日

施工業者：（株）清水電気商会

施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内

進捗率：予定 98.0% 実績

令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事

⑯



法面工、組立歩道工、排水構造物工

工 期：令和04年04月30日～令和05年3月1日

施工業者：（株）加藤工務店

施工箇所：中津川市山口

進捗率：予定 85.0% 実績

令和4年度 多治見国道標識工事

⑰



標識工、道路付属物工

工 期：令和04年06月16日～令和05年02月28日

施工業者：（株）キクテック

施工箇所：瑞浪出張所管内

進捗率：予定 95.0% 実績

令和4年度 多治見国道電気通信設備工事

⑱



CATV設備更新

工 期：令和04年08月02日～令和05年2月28日

施工業者：エフコム㈱

施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先

進捗率：予定 67.0 % 実績

令和4年度多治見国道21号御嵩地区亜炭坑充填工事

⑲



充填工

工 期：令和04年09月01日～令和05年2月28日

施工業者：小池土木㈱

施工箇所：可児郡御嵩町

進捗率：予定 69.3% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路芝原地区下部工事

⑳



準備工

工 期：令和04年10月03日～令和06年2月29日

施工業者：榑吉川組

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

進捗率：予定 1.4 % 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

㉑

写真

工 期：令和05年01月16日～令和06年2月29日

施工業者：榑加藤工務店

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先～恵那市武並町地先

進捗率：予定 % 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事

㉒



準備工、排水構造物工、仮設工

工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日

施工業者：榑中島工務店

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

進捗率：予定 11.4% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事

㉓

写真

工 期：令和04年12月06日～令和06年02月29日

施工業者：榑吉川工務店

施工箇所：恵那市武並町地先

進捗率：予定 % 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪4号橋鋼上部工事

㉔

写真

工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日

施工業者：宇野重工㈱

施工箇所：瑞浪市釜戸町地先

進捗率：予定 25.8% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪1号橋鋼上部工事

㉕

写真

工 期：令和04年09月27日～令和07年2月28日

施工業者：瀬上工業㈱

施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～下沢

進捗率：予定 14.1% 実績

令和4年度 多治見国道交通事故対策工事

㉖



中津川(2)地区 舗装工

工 期：令和04年09月15日～令和05年02月28日

施工業者：セントラル建設㈱

施工箇所：瑞浪維持出張所管内

進捗率：予定 63.4% 実績

令和4年度 多治見国道西部除雪工事

㉗



凍結防止工

工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日

施工業者：榑藤本組

施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp

R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP

進捗率：予定 56.6% 実績

令和4年度 多治見国道東部除雪工事

②



除雪工

工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日

施工業者： ㈱中島工務店

施工箇所：R19 55.2km～97.0km

進 捗 率：予定 56.6 % 実績

令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事

②



19号58.870km(下) 損傷復旧工

工 期：令和04年10月01日～令和06年10月31日

施工業者： (有) 木曾ハイウエーサービス

施工箇所：R19 55.2km～97.0km

進 捗 率：予定 42.0% 実績

