

令和5年2月末 中津川出張所 工事進捗状況

① (落合川流域)	進捗率	② (中津川流域)	進捗率	③ (本川筋)	進捗率	④ (中津川流域)	進捗率
工事名: 令和2年度 木曾川水系 本谷砂防堰堤改築工事 契約工期: 令和3年4月20日 ~ 令和4年11月7日 変更工期: 令和5年3月30日 請負業者名: (株)鳴海組	予定 94.9% 実施 差	工事名: 令和3年度 木曾川水系 中津川護岸整備工事 契約工期: 令和4年4月25日 ~ 令和5年2月28日 変更工期: 令和5年3月30日 請負業者名: (株)加藤工務店	予定 99.0% 実施 差	工事名: 令和4年度 木曾川水系 和田沢管理用道路工事 契約工期: 令和4年6月17日 ~ 令和5年3月24日 請負業者名: (株)加藤工務店	予定 89.8% 実施 差	工事名: 令和4年度 木曾川水系 川上流路工事 契約工期: 令和4年9月1日 ~ 令和5年3月16日 請負業者名: (株)中島工務店	予定 82.1% 実施 差
							
今月作業: 砂防土工、仮設工等		今月作業: 砂防土工、砂防堰堤付属施設工、仮設工等		今月作業: 道路土工、法面工、排水構造物工等		今月作業: 流路護岸工、床固め工、根固め・水制工等	
来月予定: 舗装工、後片付け等 (完成検査 令和5年3月28日予定)		来月予定: 砂防土工、仮設工、後片付け等 (完成検査 令和5年3月17日予定)		来月予定: 法面工、後片付け等 (完成検査 令和5年3月27日予定)		来月予定: 流路護岸工、床固め工、仮設工等	
⑤ (落合川流域)	進捗率	⑥ (本川筋)	進捗率	⑦ (中津川出張所管内)	進捗率		
工事名: 令和4年度 木曾川水系 荒道谷砂防堰堤改築工事 契約工期: 令和4年9月5日 ~ 令和5年3月16日 請負業者名: (株)鳴海組	予定 90.2% 実施 差	工事名: 令和4年度 木曾川水系 アラクラ沢砂防堰堤工事 契約工期: 令和4年9月1日 ~ 令和5年3月16日 請負業者名: (株)中島工務店	予定 51.7% 実施 差	工事名: 令和4年度 中津川出張所管内整備工事 契約工期: 令和4年12月14日 ~ 令和5年11月30日 請負業者名: (株)加藤工務店	実施 差		
							
今月作業: コンクリート堰堤工、仮設工等		今月作業: 砂防土工、法面工等		今月作業: 松尾谷崩落土砂撤去作業等		今月作業:	
来月予定: コンクリート工、仮設工、後片付け等 (完成検査 令和5年3月24日予定)		来月予定: 法面工等		来月予定: 柳樽川用水取水入土砂撤去作業、滝ヶ沢落石除去等		来月予定:	

令和5年2月末 妻木出張所管内 工事進捗状況

<p>①</p> <p>工事名： 令和3年度 妻木出張所管内整備工事</p> <p>工期： 令和3年12月14日 ～ 令和4年11月30日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 予定 100.0 % 実施 差</p>	<p>②</p> <p>工事名： 令和3年度 庄内川水系 町・一の洞砂防堰堤工事</p> <p>工期： 令和4年3月28日 ～ 令和5年3月30日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 予定 93.1 % 実施 差</p>
<p>工事完了</p>	
<p>《今月作業》 -</p> <p>《4月作業》 -</p>	<p>《今月作業》 【町地区】道路土工、地盤改良工、法面工、排水構造物工、舗装工 【一の洞地区】準備工</p> <p>《4月作業》 -</p>
<p>③</p> <p>工事名： 令和4年度 庄内川水系 妻木管内砂防施設整備工事</p> <p>工期： 令和4年6月1日 ～ 令和5年3月30日</p> <p>施工業者： (株)吉川組</p> <p>進捗率： 予定 90.2 % 実施 差</p>	<p>④</p> <p>工事名： 令和4年度 妻木出張所管内整備工事</p> <p>工期： 令和4年12月1日 ～ 令和5年11月30日</p> <p>施工業者： (株)藤本組</p> <p>進捗率： 予定 10.0 % 実施 差</p>
	
<p>《今月作業》 コンクリート堰堤工 本体・側壁工 型枠、コンクリート 鋼製堰堤工、防止柵工 砂防土工 掘削工 残土処理工</p> <p>《4月作業》 -</p>	<p>《今月作業》 転落防止柵工</p> <p>《4月作業》 転落防止柵工</p>

町地区

生田遊歩道整備

令和5年 2月末 上松出張所 工事進捗状況

	① 令和3年度 多治見電気通信設備工事 施工業者 朝日電機工業(株) 進捗率(予定工程) % R3. 9.27~R4. 8.31 週休2日	② 令和3年度 木曾川水系 下在蛇抜沢流路工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % R3.12. 1~R5. 1.31 週休2日、ICT	③ 令和3年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % R3.12. 1~R4.11.30 週休2日	④ 令和3年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤管理用道路工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % (100.0) R3.12. 6~R4.12.20 週休2日、CIM、ICT
今月作業	-	-	-	2月8日完成検査
来月予定	-	-	-	-
	⑤ 令和3年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株) 進捗率(予定工程) % R4. 4. 1~R5. 2.28 週休2日、CIM、ICT	⑥ 令和3年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % (99.5) R4. 5. 2~R5. 2.28 週休2日	⑦ 令和3年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事 施工業者 木曾土建工業(株) 進捗率(予定工程) % R4. 5.10~R5. 2.28 週休2日	⑧ 令和4年度 木曾川水系 宮の沢砂防堰堤工事 施工業者 奥田工業(株) 進捗率(予定工程) % (96.7) R4. 6. 2~R5. 3.24 週休2日、ICT
今月作業	-	運搬処理工(コンクリート殻運搬・処分) 仮設工(整地)・跡片付付	-	後片付付
来月予定	-	3月15日完成検査	-	竣工書類作成 3月16日完成検査




令和5年 2月末 上松出張所 工事進捗状況

	⑨ 令和4年度 木曾川水系 上松管内除石工事 施工業者 木曾土建工業(株)			⑩ 令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事 施工業者 朝日電気工業(株)			⑪ 令和4年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤工事 施工業者 大宗土建(株)			⑫ 令和4年度 上松出張所管内整備工事 施工業者 大宗土建(株)		
	進捗率(予定工程)	%	(100.0)	進捗率(予定工程)	%	(14.6)	進捗率(予定工程)	%	(11.4)	進捗率(予定工程)	%	(100.0)
	R4. 9. 5~R5. 3.16		週休2日、ICT	R4. 9.26~R5. 6.9		週休2日	R4. 11. 1~R6. 1.31		週休2日	R4.12. 1~R5.11.30		週休2日
				<p>工事無し 写真無し</p>								
今月作業	2月13日完成検査			書類整理、施工図作成			かご工、道路掘削、側溝工、伐採工			植生工(指示1)下洞沢、植生マット 応急処理工(指示2)下在、借地箇所整備 応急処理工(指示3)滑川、資材運搬路整備 応急処理工(指示4)下在、下流水路整備		
来月予定	-			L3-SW取付(上松出張所)			側溝工、道路路面工			応急処理工(指示3)滑川、資材運搬路整備 応急処理工(指示4)下在、下流水路整備 応急処理工(指示5)滑川、敬神の滝付近整備		
	⑬ 令和4年度 木曾川水系 宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事 施工業者 奥田工業(株)			⑭ 令和3年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂池工事 施工業者 大宗土建(株)			⑮ 令和4年度 木曾川水系 十王沢砂防堰堤改築工事 施工業者 木曾土建工業(株)			⑯ 令和4年度 木曾川水系 猿沢砂防施設整備工事 施工業者 奥田工業(株)		
	進捗率(予定工程)	%	-	進捗率(予定工程)	%	-	進捗率(予定工程)	%	-	進捗率(予定工程)	%	-
	R5.4.3(予定)~R6.2.29			R5.4.3(予定)~R6.2.29			R5.4.28(予定)~R6.2.29			R5.4.28(予定)~R6.1.31		
	写真無し			写真無し			写真無し			写真無し		
今月作業	-			-			-			-		
来月予定	-			-			-			-		

① 令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事



19号(中) 52.80kp~53.60kp 道路除草
 工期: 令和02年10月30日~令和05年10月31日
 施工業者: 日本ハイウェイ・サービス(株)
 施工箇所: R19 31.5kp~55.2kp
 R21 3.0kp~22.0kp 可児御嵩BP
 進捗率: 予定 88.7% 実施

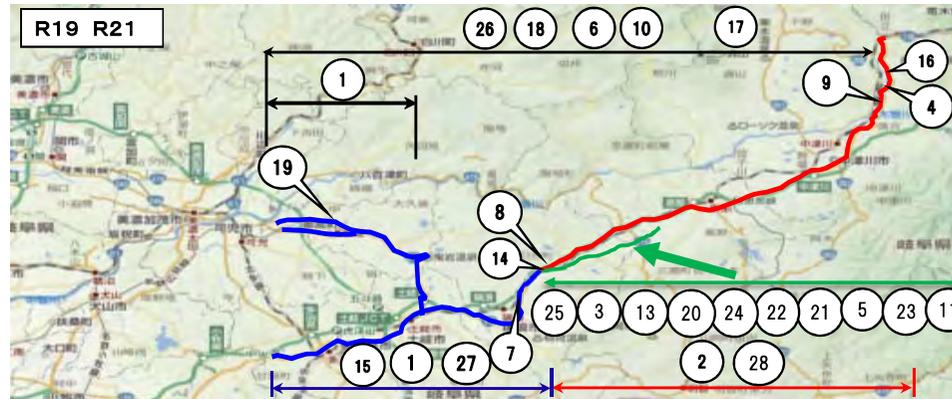

② 令和2年度 多治見国道東部維持修繕工事



19号78.100kp(上) 防草対策工
 工期: 令和02年04月01日~令和04年10月31日
 施工業者: (有)木曾ハイウェイサービス
 施工箇所: R19 55.2kp~97.0kp
 進捗率: 予定100.0% 実績 **完**

③ 令和2年度瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事



4号横断函渠工
 工期: 令和02年09月04日~令和04年05月31日
 施工業者: 板垣建設(株)
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
 進捗率: 予定 100% 実施 **完**

④ 令和2年度多治見国道中津川地区整備工事



地山補強土工(2,3号)
 工期: 令和02年03月29日~令和04年7月28日
 施工業者: (株)加藤工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市山口地先
 進捗率: 予定 100.0% 実績 **完**

⑤ 令和2年度瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事



道路土工
 工期: 令和03年05月11日~令和05年3月15日
 施工業者: 恵中建設(株)
 施工箇所: 恵那市武並町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

⑥ 令和3年度 多治見国道電気通信設備整備工事



CCTV設備工
 工期: 令和03年08月17日~令和04年07月8日
 施工業者: 松栄電子工業(株)
 施工箇所: 多治見市~中津川市一本松地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

⑦ 令和3年度 多治見国道小里川橋耐震補強工事



橋脚巻立て工
 工期: 令和03年09月13日~令和04年06月30日
 施工業者: (株)吉川工務店
 施工箇所: 瑞浪市土岐町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

⑧ 令和3年度 多治見国道瑞浪地区歩道整備工事



舗装工、区画線工
 工期: 令和03年09月13日~令和04年09月28日
 施工業者: 鳴海組
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町地先
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

⑨ 令和3年度 19号中津川落合地区災害復旧工事



法面工、舗装復旧工
 工期: 令和03年11月9日~令和04年12月28日
 施工業者: (株)吉川工務店
 施工箇所: 岐阜県中津川市落合
 進捗率: 予定 100.0% 実績 **完**

⑩ 令和3年度 多治見国道橋梁補修工事



準備工
 工期: 令和04年3月30日~令和05年2月17日
 施工業者: (株)梅田組
 施工箇所: 恵那市、中津川市、御嵩町
 進捗率: 予定 100% 実績 **完**

⑪ 令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事



カルバート工、地下排水工
 工期: 令和04年03月31日~令和05年06月23日
 施工業者: (株)中島工務店
 施工箇所: 恵那市武並町
 進捗率: 予定 43.9% 実績

⑫ 令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事



カルバート工
 工期: 令和04年04月01日~令和05年06月23日
 施工業者: (株)中島工務店
 施工箇所: 瑞浪市釜戸町
 進捗率: 予定 65.9% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路釜戸地区道路建設工事

⑬



道路土工・護岸工

工 期：令和04年04月01日～令和05年3月24日
 施工業者：青協建設（株）
 施工箇所：瑞浪市釜戸町
 進捗率：予定 93.7% 実績

令和3年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事

⑭



カルバート工

工 期：令和04年04月04日～令和05年03月24日
 施工業者：（株）市川工務店
 施工箇所：瑞浪市土岐町
 進捗率：予定 90.9% 実績

令和3年度 多治見国道道路照明設備工事

⑮



道路照明設備工

工 期：令和04年03月09日～令和05年02月28日
 施工業者：（株）清水電気商会
 施工箇所：瑞浪国道維持出張所管内
 進捗率：予定 100.0% 実績 **完**

令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事

⑯



組立歩道工、舗装工、防護柵工

工 期：令和04年04月30日～令和05年6月30日
 施工業者：（株）加藤工務店
 施工箇所：中津川市山口
 進捗率：予定 88.5% 実績

令和4年度 多治見国道標識工事

⑰



標識工、道路付属物工

工 期：令和04年06月16日～令和05年05月31日
 施工業者：（株）キクテック
 施工箇所：瑞浪出張所管内
 進捗率：予定 91.0% 実績

令和4年度 多治見国道電気通信設備工事

⑱



CATV設備更新

工 期：令和04年08月02日～令和05年2月28日
 施工業者：エフコム㈱
 施工箇所：多治見市～中津川市一本松地先
 進捗率：予定 74.0% 実績

令和4年度多治見国道21号御嵩地区垂炭坑充填工事

⑲



充填工

工 期：令和04年09月01日～令和05年3月20日
 施工業者：小池土木㈱
 施工箇所：可児郡御嵩町
 進捗率：予定 93.6% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路芝原地区下部工事

⑳



準備工

工 期：令和04年10月03日～令和06年2月29日
 施工業者：榑吉川組
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先
 進捗率：予定 9.2% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路上切地区道路建設工事

㉑

写真

工 期：令和05年01月16日～令和06年2月29日
 施工業者：榑加藤工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先～恵那市武並町地先
 進捗率：予定 % 実績 %

令和4年度 瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事

㉒



道路土工、排水構造物工、仮設工

工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日
 施工業者：榑中島工務店
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先
 進捗率：予定 25.9% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事

㉓

写真

工 期：令和04年12月06日～令和06年02月29日
 施工業者：榑吉川工務店
 施工箇所：恵那市武並町地先
 進捗率：予定 % 実績 %

令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪4号橋鋼上部工事

㉔

写真

工 期：令和04年09月09日～令和06年2月29日
 施工業者：宇野重工㈱
 施工箇所：瑞浪市釜戸町地先
 進捗率：予定 31.1% 実績

令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪1号橋鋼上部工事

㉕

写真

工 期：令和04年09月27日～令和07年2月28日
 施工業者：瀧上工業㈱
 施工箇所：瑞浪市土岐町鶴城～下沢
 進捗率：予定 19.9% 実績

令和4年度 多治見国道交通事故対策工事

㉖



中津川(3)地区 防護柵工

工 期：令和04年09月15日～令和05年03月20日
 施工業者：セントラル建設㈱
 施工箇所：瑞浪維持出張所管内
 進捗率：予定 98.7% 実績

令和4年度 多治見国道西部除雷工事

㉗



凍結防止工

工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日
 施工業者：榑藤本組
 施工箇所：R19 31.5kp～55.2kp
 R21 3.0kp～22.0kp 可児御嵩BP
 進捗率：予定 77.2% 実績

令和4年度 多治見国道東部除雪工事

㊸



除雪工

工 期：令和04年11月15日～令和05年3月31日

施工業者： 榑中島工務店

施工箇所：R19 55.2k ρ ～97.0k ρ

進 捗 率：予定 56.6 % 実績

令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事

㊹



19号80.600k ρ (下) 道路除草工

工 期：令和04年10月01日～令和06年10月31日

施工業者： (有) 木曾ハイウエーサービス

施工箇所：R19 55.2k ρ ～97.0k ρ

進 捗 率：予定21.0% 実績

