

工事進捗状況（令和5年9月末）

中津川出張所

|                                                                                     |                                             |                                                                                      |                                     |                                                                                       |                                                    |                                                                                       |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ①                                                                                   |                                             | ②                                                                                    |                                     | ③                                                                                     |                                                    | ④                                                                                     |                                            |
| 工事名                                                                                 | 令和4年度 木曽川水系川上流路工事                           | 工事名                                                                                  | 令和4年度 木曽川水系アクラ沢砂防堰堤工事               | 工事名                                                                                   | 令和4年度 中津川出張所管内整備工事                                 | 工事名                                                                                   | 令和4年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事                      |
| 工期                                                                                  | 当初 R4.9.1～R5.3.16 変更 R4.9.1～R5.7.31         | 工期                                                                                   | 当初 R4.9.1～R5.3.16 変更 R3.9.1～R5.6.30 | 工期                                                                                    | 当初 R4.12.14～R5.11.30 変更                            | 工期                                                                                    | 当初 R5.4.17～R6.2.29 変更 R5.4.17～R6.3.29      |
| 受注者名                                                                                | (株)中島工務店                                    | 受注者名                                                                                 | (株)中島工務店                            | 受注者名                                                                                  | (株)加藤工務店                                           | 受注者名                                                                                  | (株)鳴海組                                     |
| 進捗率                                                                                 | 予定 100 実施 100 差 0.0                         | 進捗率                                                                                  | 予定 100 実施 100 差 0.0                 | 進捗率                                                                                   | 予定 — 実施 79.1 差 —                                   | 進捗率                                                                                   | 予定 17.1 実施 17.1 差 0                        |
| 今月作業                                                                                | 完                                           | 今月作業                                                                                 | 完                                   | 今月作業                                                                                  | 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、川上橋土捨場整備 等                        | 今月作業                                                                                  | 仮締切設置、構造物取壊し                               |
| 来月作業                                                                                |                                             | 来月作業                                                                                 |                                     | 川上川流路工第7床固工下流右岸補修、薬師沢管理用道路整備 等                                                        | 来月作業                                               | コンクリート堰堤床掘り、仮設モルタル吹付、鉄筋挿入                                                             |                                            |
|   |                                             |   |                                     |   |                                                    |   |                                            |
| ⑤                                                                                   |                                             | ⑥                                                                                    |                                     | ⑦                                                                                     |                                                    | ⑧                                                                                     |                                            |
| 工事名                                                                                 | 令和4年度 木曽川水系和田沢砂防堰堤工事                        | 工事名                                                                                  | 令和5年度 木曽川水系地獄谷管理用道路工事               | 工事名                                                                                   | 令和5年度 木曽川水系アクラ沢砂防堰堤工事                              | 工事名                                                                                   | 令和5年度 木曽川水系荒道谷砂防堰堤改築工事                     |
| 工期                                                                                  | 当初 R5.4.28～R6.2.29 変更                       | 工期                                                                                   | 当初 R5.6.19～R6.3.15 変更               | 工期                                                                                    | 当初 R5.7.26～R6.3.13 変更                              | 工期                                                                                    | 当初 R5.8.1～R6.3.8 変更                        |
| 受注者名                                                                                | (株)加藤工務店                                    | 受注者名                                                                                 | (株)吉川工務店                            | 受注者名                                                                                  | (株)中島工務店                                           | 受注者名                                                                                  | (株)鳴海組                                     |
| 進捗率                                                                                 | 予定 35.8 実施 31.7 差 -4.1                      | 進捗率                                                                                  | 予定 67.8 実施 67.8 差 0.0               | 進捗率                                                                                   | 予定 6.7 実施 7.5 差 0.8                                | 進捗率                                                                                   | 予定 2.5 実施 2.5 差 0.0                        |
| 今月作業                                                                                | コンクリート堰堤本体(A・C7°ロック5/10、B7°ロック5/7)、アスファルト舗装 | 今月作業                                                                                 | 掘削、大型ブロック据付(6/10段目)                 | 今月作業                                                                                  | コンクリート堰堤床掘り(ICT)、土砂運搬                              | 今月作業                                                                                  | 工事用道路・仮締切設置、仮水路据付                          |
| 来月作業                                                                                | コンクリート堰堤本体(A・C7°ロック10/10、B7°ロック6/7)         | 来月作業                                                                                 | 路体盛土、大型ブロック据付(10/10段目)              | 来月作業                                                                                  | 置換コンクリート、コンクリート堰堤本体(A7°ロック1/4、B7°ロック3/5、C7°ロック3/6) | 来月作業                                                                                  | コンクリート表面処理、コンクリート堰堤本体(D7°ロック1/7、F7°ロック1/5) |
|  |                                             |  |                                     |  |                                                    |  |                                            |


工事進捗状況（令和5年9月末）

中津川出張所

|                                                                                    |                                |      |  |  |    |      |  |  |   |       |                           |    |   |  |  |    |   |  |  |      |       |     |    |  |  |  |    |  |  |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--|--|----|------|--|--|---|-------|---------------------------|----|---|--|--|----|---|--|--|------|-------|-----|----|--|--|--|----|--|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ⑨                                                                                  |                                |      |  |  | ⑩  |      |  |  |   |       |                           |    |   |  |  |    |   |  |  |      |       |     |    |  |  |  |    |  |  |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事名                                                                                | 令和5年度 木曽川水系中津川管内施設改築工事         |      |  |  |    |      |  |  |   | 工事名   | 令和5年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事      |    |   |  |  |    |   |  |  | 工事名  |       |     |    |  |  |  |    |  |  |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期                                                                                 | 当初 R5. 8. 1～R6. 3. 8 変更        |      |  |  |    |      |  |  |   | 工期    | 当初 R5. 9. 25～R6. 3. 13 変更 |    |   |  |  |    |   |  |  | 工期   | 当初 変更 |     |    |  |  |  |    |  |  |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受注者名                                                                               | (株)中島工務店                       |      |  |  |    |      |  |  |   | 受注者名  | (株)吉川工務店                  |    |   |  |  |    |   |  |  | 受注者名 |       |     |    |  |  |  |    |  |  |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗率                                                                                | 予定                             | 4. 6 |  |  | 実施 | 2. 4 |  |  | 差 | -2. 2 | 進捗率                       | 予定 | － |  |  | 実施 | － |  |  | 差    | －     | 進捗率 | 予定 |  |  |  | 実施 |  |  |      | 差     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 今月作業                                                                               | 【川上地区】根固めﾌﾟﾛｯｸ型枠組立、工事用道路・仮締切設置 |      |  |  |    |      |  |  |   | 今月作業  | 準備工                       |    |   |  |  |    |   |  |  | 今月作業 |       |     |    |  |  |  |    |  |  |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 来月作業                                                                               | 【川上地区】根固めﾌﾟﾛｯｸ床付、工事用道路・仮締切設置   |      |  |  |    |      |  |  |   | 来月作業  | 道路土工、既設構造物撤去              |    |   |  |  |    |   |  |  | 来月作業 |       |     |    |  |  |  |    |  |  |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |                                |      |  |  |    |      |  |  |   | 準備工   |                           |    |   |  |  |    |   |  |  |      |       |     |    |  |  |  |    |  |  |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                |      |  |  |    |      |  |  |   |       |                           |    |   |  |  |    |   |  |  |      |       |     |    |  |  |  |    |  |  |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事名                                                                                |                                |      |  |  |    |      |  |  |   | 工事名   |                           |    |   |  |  |    |   |  |  | 工事名  |       |     |    |  |  |  |    |  |  | 工事名  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工期                                                                                 | 当初 変更                          |      |  |  |    |      |  |  |   | 工期    | 当初 変更                     |    |   |  |  |    |   |  |  | 工期   | 当初 変更 |     |    |  |  |  |    |  |  | 工期   | 当初 変更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受注者名                                                                               |                                |      |  |  |    |      |  |  |   | 受注者名  |                           |    |   |  |  |    |   |  |  | 受注者名 |       |     |    |  |  |  |    |  |  | 受注者名 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進捗率                                                                                | 予定                             |      |  |  | 実施 |      |  |  | 差 |       | 進捗率                       | 予定 |   |  |  | 実施 |   |  |  | 差    |       | 進捗率 | 予定 |  |  |  | 実施 |  |  |      | 差     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 今月作業                                                                               |                                |      |  |  |    |      |  |  |   | 今月作業  |                           |    |   |  |  |    |   |  |  | 今月作業 |       |     |    |  |  |  |    |  |  | 今月作業 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 来月作業                                                                               |                                |      |  |  |    |      |  |  |   | 来月作業  |                           |    |   |  |  |    |   |  |  | 来月作業 |       |     |    |  |  |  |    |  |  | 来月作業 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                |      |  |  |    |      |  |  |   |       |                           |    |   |  |  |    |   |  |  |      |       |     |    |  |  |  |    |  |  |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

工事進捗状況 (令和5年9月末)

妻木出張所

|                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ①                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | ②                                                                                  |  |  |  | ③                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | ④                                                                                   |  |  |  |
| 工事名 令和4年度 妻木出張所管内整備工事                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 工事名 令和4年度 富士下第2砂防堰堤改築工事                                                            |  |  |  | 工事名 令和5年度 妻木管内砂防施設整備工事                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 工事名 令和5年度 寺下第3砂防堰堤改築工事                                                              |  |  |  |
| 工期 当初 R4.12.1～R5.11.30 変更                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 工期 当初 R5.4.3～R6.2.29 変更 R5.4.3～R6.3.25                                             |  |  |  | 工期 当初 R5.5.15～R6.3.15 変更                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 工期 当初 R5.8.1～R6.3.13 変更                                                             |  |  |  |
| 受注者名 (株) 藤本組                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 受注者名 (株) 藤本組                                                                       |  |  |  | 受注者名 (株) 吉川組                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 受注者名 (株) 藤本組                                                                        |  |  |  |
| 進捗率 予定 80   実施 128   差 48                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | 進捗率 予定 38.6   実施 39.2   差 0.6                                                      |  |  |  | 進捗率 予定 28.3   実施 23.8   差 -4.5                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | 進捗率 予定 10.7   実施 2.0   差 -8.7                                                       |  |  |  |
| 今月作業 雲五川流路工整備、浦山第2砂防堰堤施設整備                                                                                                                                                                                                              |  |  |  | 今月作業 砂防土工、堰堤コンクリート工                                                                |  |  |  | 今月作業 準備工 立木伐採（寺下富士）コンクリート堰堤本体工（鍛冶ヶ入）                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 今月作業 準備工（家屋調査）、仮設工（工事用道路工）                                                          |  |  |  |
| 来月作業 雲五川流路工整備                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 来月作業 堰堤コンクリート工                                                                     |  |  |  | 来月作業 仮設工 仮水路（寺下富士）コンクリート堰堤本体工（鍛冶ヶ入）                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 来月作業 仮設工（仮橋・仮栈橋工）、準備工（立木伐採）                                                         |  |  |  |
| <div><div></div><div></div><div>雲五川流路工</div><div>浦山第2砂防堰堤</div></div> |  |  |  |  |  |  |  | <div><div></div><div></div><div>鍛冶ヶ入地区</div><div>寺下富士地区</div></div> |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | ⑥                                                                                  |  |  |  | ⑦                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | ⑧                                                                                   |  |  |  |
| 工事名                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 工事名                                                                                |  |  |  | 工事名                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 工事名                                                                                 |  |  |  |
| 工期 当初 変更                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 工期 当初 変更                                                                           |  |  |  | 工期 当初 変更                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | 工期 当初 変更                                                                            |  |  |  |
| 受注者名                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 受注者名                                                                               |  |  |  | 受注者名                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 受注者名                                                                                |  |  |  |
| 進捗率 予定 実施 差 0                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  | 進捗率 予定 実施 差 0                                                                      |  |  |  | 進捗率 予定 実施 差 0                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | 進捗率 予定 実施 差 0                                                                       |  |  |  |
| 今月作業                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 今月作業                                                                               |  |  |  | 今月作業                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 今月作業                                                                                |  |  |  |
| 来月作業                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 来月作業                                                                               |  |  |  | 来月作業                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 来月作業                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                    |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |

工事進捗状況（令和5年9月末）

上松出張所

|                                                                                     |                                     |      |    |      |                                                                                      |                                 |     |    |      |                                                                                       |                              |   |     |     |                                                                                       |                               |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-------|---|-----|-----|----|------|----|------|---|------|
| ①                                                                                   |                                     |      |    |      | ②                                                                                    |                                 |     |    |      | ③                                                                                     |                              |   |     |     | ④                                                                                     |                               |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| 工事名                                                                                 | 令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事                 |      |    |      | 工事名                                                                                  | 令和4年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事          |     |    |      | 工事名                                                                                   | 令和4年度 上松出張所管内整備工事            |   |     |     | 工事名                                                                                   | 令和4年度 木曽川水系 宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事   |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| 工期                                                                                  | 当初 R4. 9. 26～R5. 2. 28 変更 R5. 10. 6 |      |    |      | 工期                                                                                   | 当初 R4. 11. 1～R6. 1. 31 変更 -     |     |    |      | 工期                                                                                    | 当初 R4. 12. 1～R5. 11. 30 変更 - |   |     |     | 工期                                                                                    | 当初 R5. 4. 3～R6. 2. 29 変更 -    |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| 受注者名                                                                                | 朝日電気工業（株）                           |      |    |      | 受注者名                                                                                 | 大宗土建（株）                         |     |    |      | 受注者名                                                                                  | 大宗土建（株）                      |   |     |     | 受注者名                                                                                  | 奥田工業（株）                       |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| 進捗率                                                                                 | 予定                                  | 99.9 | 実施 | 99.6 | 差                                                                                    | -0.3                            | 進捗率 | 予定 | 63.1 | 実施                                                                                    | 64.2                         | 差 | 1.1 | 進捗率 | 予定                                                                                    | -                             | 実施 | 117.2 | 差 | -   | 進捗率 | 予定 | 72.7 | 実施 | 73.2 | 差 | 0.5  |
| 今月作業                                                                                | 土石流観測装置更新工事                         |      |    |      | 今月作業                                                                                 | 道路改良 植生基材吹付工、崩壊土砂除去準備           |     |    |      | 今月作業                                                                                  | 地質調査（指示8滑川法面復旧）              |   |     |     | 今月作業                                                                                  | コンクリート堰堤工、鋼製堰堤工、砂防土工（掘削・土砂運搬） |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| 来月作業                                                                                | 土石WEBサーバ改造                          |      |    |      | 来月作業                                                                                 | 道路復旧 崩壊土砂除去、仮設土留工               |     |    |      | 来月作業                                                                                  | 準備工                          |   |     |     | 来月作業                                                                                  | 流路護岸工、根固め・水制工、砂防土工（掘削）        |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
|   |                                     |      |    |      |   |                                 |     |    |      |   |                              |   |     |     |   |                               |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| ⑤                                                                                   |                                     |      |    |      | ⑥                                                                                    |                                 |     |    |      | ⑦                                                                                     |                              |   |     |     | ⑧                                                                                     |                               |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| 工事名                                                                                 | 令和4年度 木曽川水系 猿沢砂防施設整備工事              |      |    |      | 工事名                                                                                  | 令和4年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事          |     |    |      | 工事名                                                                                   | 令和4年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事    |   |     |     | 工事名                                                                                   | 令和5年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事      |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| 工期                                                                                  | 当初 R5. 4. 3～R6. 1. 31 変更 R6. 3. 29  |      |    |      | 工期                                                                                   | 当初 R5. 4. 3～R6. 2. 29 変更 -      |     |    |      | 工期                                                                                    | 当初 R5. 4. 28～R6. 2. 29 変更 -  |   |     |     | 工期                                                                                    | 当初 R5. 5. 16～R6. 3. 15 変更 -   |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| 受注者名                                                                                | 奥田工業（株）                             |      |    |      | 受注者名                                                                                 | 大宗土建（株）                         |     |    |      | 受注者名                                                                                  | 木曽土建工業（株）                    |   |     |     | 受注者名                                                                                  | 奥田工業（株）                       |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| 進捗率                                                                                 | 予定                                  | 18.8 | 実施 | 16.9 | 差                                                                                    | -1.9                            | 進捗率 | 予定 | 73.4 | 実施                                                                                    | 74.5                         | 差 | 1.1 | 進捗率 | 予定                                                                                    | 35.6                          | 実施 | 35.7  | 差 | 0.1 | 進捗率 | 予定 | 27.6 | 実施 | 22.0 | 差 | -5.6 |
| 今月作業                                                                                | 伐採工                                 |      |    |      | 今月作業                                                                                 | 砂防土工（残土処理工）・コンクリート堰堤工（作業土工）・法面工 |     |    |      | 今月作業                                                                                  | コンクリート堰堤工                    |   |     |     | 今月作業                                                                                  | 土工（作業土工、盛土撤去）構造物撤去工           |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
| 来月作業                                                                                | 伐採工・工事用道路工                          |      |    |      | 来月作業                                                                                 | 砂防土工（残土処理工）・コンクリート堰堤工（作業土工）     |     |    |      | 来月作業                                                                                  | コンクリート堰堤工、鋼製堰堤工              |   |     |     | 来月作業                                                                                  | 構造物撤去工（切断、取壊し）仮設工（仮水路設置）      |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |
|  |                                     |      |    |      |  |                                 |     |    |      |  |                              |   |     |     |  |                               |    |       |   |     |     |    |      |    |      |   |      |

工事進捗状況（令和5年9月末）

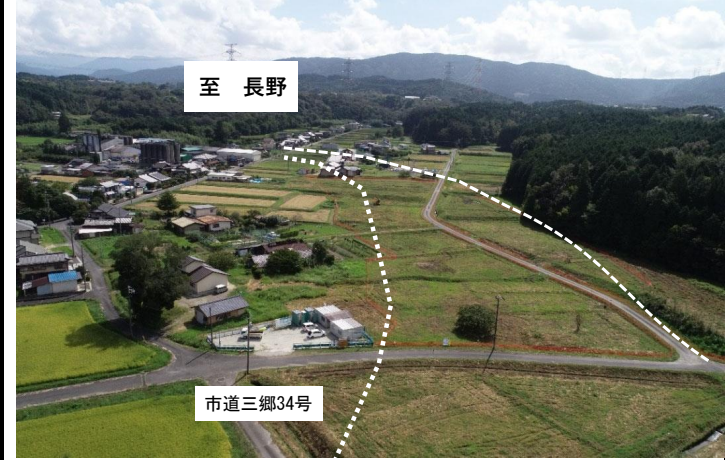
上松出張所

[illegible]

工事進捗状況（令和5年9月末）

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

|                                                                                     |                                     |                                                                                      |                                       |                                                                                       |                                    |                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ①                                                                                   |                                     | ②                                                                                    |                                       | ③                                                                                     |                                    | ④                                                                                     |                                     |
| 工事名                                                                                 | 令和3年度 瑞浪恵那道路 中切道路建設工                | 工事名                                                                                  | 令和3年度 瑞浪恵那道路 中畑道路建設工事                 | 工事名                                                                                   | 令和4年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事            | 工事名                                                                                   | 令和4年度 瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事               |
| 工期                                                                                  | 当初 R4. 3. 31～R5. 3. 24 変更 R5. 8. 30 | 工期                                                                                   | 当初 R4. 4. 1～R5. 2. 28 変更 R5. 11. 15   | 工期                                                                                    | 当初 R4. 9. 9～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29 | 工期                                                                                    | 当初 R4. 10. 3～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29 |
| 受注者名                                                                                | (株) 中島工務店                           | 受注者名                                                                                 | (株) 中島工務店                             | 受注者名                                                                                  | (株) 中島工務店                          | 受注者名                                                                                  | (株) 吉川組                             |
| 今月作業                                                                                |                                     | 今月作業                                                                                 | カルバート工 脱型、埋戻し                         | 今月作業                                                                                  | 道路工、舗装工、土工、仮設工、準備工                 | 今月作業                                                                                  | 道路土工、排水構造物工、舗装工、区画線工、防護柵工、仮設工       |
| 来月作業                                                                                |                                     | 来月作業                                                                                 | カルバート工 地下排水工、埋戻し                      | 来月作業                                                                                  | 仮設工、準備工                            | 来月作業                                                                                  | 道路土工、橋台工、仮設工                        |
|    |                                     |    |                                       |    |                                    |    |                                     |
| ⑤                                                                                   |                                     | ⑥                                                                                    |                                       | ⑦                                                                                     |                                    | ⑧                                                                                     |                                     |
| 工事名                                                                                 | 令和4年度 瑞浪恵那道路 上切道路建設工事               | 工事名                                                                                  | 令和4年度 瑞浪恵那道路 名滝地区下部工事                 | 工事名                                                                                   | 令和4年度 瑞浪恵那道路 名滝地区道路建設工事            | 工事名                                                                                   | 令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事              |
| 工期                                                                                  | 当初 R5. 1. 16～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29 | 工期                                                                                   | 当初 R5. 4. 14～R5. 9. 29 変更 ～R5. 11. 16 | 工期                                                                                    | 当初 R5. 4. 28～R6. 2. 29 変更          | 工期                                                                                    | 当初 R4. 12. 6～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29 |
| 受注者名                                                                                | (株) 加藤工務店                           | 受注者名                                                                                 | 板垣建設 (株)                              | 受注者名                                                                                  | (株) 鳴海組                            | 受注者名                                                                                  | (株) 吉川工務店                           |
| 今月作業                                                                                | 上切工区重力式擁壁・L型擁壁工                     | 今月作業                                                                                 | 深礎工                                   | 今月作業                                                                                  | 仮設工 (準備)                           | 今月作業                                                                                  | 仮橋工、防護柵工、車道舗装工                      |
| 来月作業                                                                                | L型擁壁工・舗装工                           | 来月作業                                                                                 | 工事用道路工 排水工                            | 来月作業                                                                                  | 仮設工                                | 来月作業                                                                                  | 仮橋工、歩道舗装工、カルバート工                    |
|  |                                     |  |                                       |  |                                    |  |                                     |

|                                                                                     |                         |                                                                                     |                         |                                                                                      |                         |                                                                                      |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ⑨                                                                                   |                         | ⑩                                                                                   |                         | ⑪                                                                                    |                         | ⑫                                                                                    |                         |
| 工事名                                                                                 | 令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪4号橋鋼上部工事 | 工事名                                                                                 | 令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事 | 工事名                                                                                  | 令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事 | 工事名                                                                                  | 令和5年度 瑞浪恵那道路 恵那地区道路建設工事 |
| 工期                                                                                  | 当初 R4.9.9～R6.2.29 変更    | 工期                                                                                  | 当初 R4.9.27～R7.2.28 変更   | 工期                                                                                   | 当初 R5.3.16～R7.2.28 変更   | 工期                                                                                   | 当初 R5.7.7～R6.1.31 変更    |
| 受注者名                                                                                | 宇野重工（株）                 | 受注者名                                                                                | 瀧上工業（株）                 | 受注者名                                                                                 | （株）北都鉄工                 | 受注者名                                                                                 | 恵中建設（株）                 |
| 今月作業                                                                                | 準備工・作業ヤード整備工            | 今月作業                                                                                | 工場製作                    | 今月作業                                                                                 | 工場製作                    | 今月作業                                                                                 | 排水工                     |
| 来月作業                                                                                | 作業ヤード整備工・架設工            | 来月作業                                                                                | 工場製作                    | 来月作業                                                                                 | 工場製作                    | 来月作業                                                                                 | 排水工                     |
|   |                         |  |                         |  |                         |  |                         |
| ⑬                                                                                   |                         | ⑭                                                                                   |                         | ⑮                                                                                    |                         | ⑯                                                                                    |                         |
| 工事名                                                                                 | 令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区道路建設工事 | 工事名                                                                                 |                         | 工事名                                                                                  |                         | 工事名                                                                                  |                         |
| 工期                                                                                  | 当初 R5.9.1～R7.2.28 変更    | 工期                                                                                  |                         | 工期                                                                                   |                         | 工期                                                                                   |                         |
| 受注者名                                                                                | （株）中島工務店                | 受注者名                                                                                |                         | 受注者名                                                                                 |                         | 受注者名                                                                                 |                         |
| 今月作業                                                                                | 準備工                     | 今月作業                                                                                |                         | 今月作業                                                                                 |                         | 今月作業                                                                                 |                         |
| 来月作業                                                                                | 準備工、仮設工、橋台工             | 来月作業                                                                                |                         | 来月作業                                                                                 |                         | 来月作業                                                                                 |                         |
|  |                         | 写真                                                                                  |                         | 写真                                                                                   |                         | 写真                                                                                   |                         |

工事進捗状況（令和5年9月末）

瑞浪国道維持出張所

|                                                                                     |                                    |                                                                                      |                                                   |                                                                                       |                                      |                                                                                       |                                                                                      |                                     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| ①                                                                                   |                                    | ②                                                                                    |                                                   | ③                                                                                     |                                      | 完                                                                                     | ④                                                                                    |                                     | 完 |
| 工事名                                                                                 | 令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事                | 工事名                                                                                  | 令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事                               | 工事名                                                                                   | 令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事                 |                                                                                       | 工事名                                                                                  | 令和4年度 多治見国道標識工事                     |   |
| 工期                                                                                  | 当初 R2. 10. 30～R5. 10. 31 変更        | 工期                                                                                   | 当初 R4. 10. 1～R6. 10. 31 変更                        | 工期                                                                                    | 当初 R4. 4. 30～R4. 12. 16 変更 R5. 6. 30 |                                                                                       | 工期                                                                                   | 当初 R4. 4. 30～R5. 2. 28 変更 R5. 5. 31 |   |
| 受注者名                                                                                | 日本ハイウェイサービス（株）                     | 受注者名                                                                                 | （有）木曽ハイウェーサービス                                    | 受注者名                                                                                  | （株）加藤工務店                             |                                                                                       | 受注者名                                                                                 | （株）キクテック                            |   |
| 今月作業                                                                                | 排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他    | 今月作業                                                                                 | 道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工 | 今月作業                                                                                  |                                      |                                                                                       | 今月作業                                                                                 |                                     |   |
| 来月作業                                                                                | 排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他    | 来月作業                                                                                 | 道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工 | 来月作業                                                                                  |                                      |                                                                                       | 来月作業                                                                                 |                                     |   |
|   |                                    |   |                                                   |   |                                      |                                                                                       |  |                                     |   |
| ⑤                                                                                   |                                    | 完                                                                                    | ⑥                                                 |                                                                                       | ⑦                                    |                                                                                       | ⑧                                                                                    |                                     |   |
| 工事名                                                                                 | 令和4年度 多治見国道電気通信設備工事                |                                                                                      | 工事名                                               | 令和4年度 多治見国道防災工事                                                                       | 工事名                                  | 令和4年度 多治見国道橋梁補修工事                                                                     | 工事名                                                                                  | 令和4年度 多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事            |   |
| 工期                                                                                  | 当初 R4. 8. 2～R5. 2. 28 変更 R5. 8. 18 |                                                                                      | 工期                                                | 当初 R5. 3. 1～R6. 2. 28 変更 R6. 3. 29                                                    | 工期                                   | 当初 R5. 3. 13～R6. 1. 31 変更 R5. 11. 29                                                  | 工期                                                                                   | 当初 R5. 3. 30～R6. 2. 28 変更           |   |
| 受注者名                                                                                | エフコム（株）                            |                                                                                      | 受注者名                                              | （株）加藤工務店                                                                              | 受注者名                                 | （株）梅田組                                                                                | 受注者名                                                                                 | 徳倉建設（株）                             |   |
| 今月作業                                                                                |                                    |                                                                                      | 今月作業                                              | 小割除去、ロープ掛、ロープ伏、ロープ被覆                                                                  | 今月作業                                 | 橋梁付属物工、橋梁補修工、仮設工（多治見工区）                                                               | 今月作業                                                                                 | 準備工、技術管理、充填孔設置工                     |   |
| 来月作業                                                                                |                                    |                                                                                      | 来月作業                                              | 小割除去、ロープ掛、ロープ伏、仮設足場                                                                   | 来月作業                                 | 橋梁付属物工、橋梁補修工、仮設工（多治見工区）                                                               | 来月作業                                                                                 | 準備工、技術管理、充填孔設置工                     |   |
|  |                                    |  |                                                   |  |                                      |  |                                                                                      |                                     |   |

|                                                                                    |                          |                                                                                     |                           |                                                                                      |                           |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--|
| ⑨                                                                                  |                          | ⑩                                                                                   |                           | ⑪                                                                                    |                           | ⑫    |  |
| 工事名                                                                                | 令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事     | 工事名                                                                                 | 令和4年度 多治見国道照明設備工事         | 工事名                                                                                  | 令和4年度 多治見国道瑞浪維持管内整備工事     | 工事名  |  |
| 工期                                                                                 | 当初 R5. 4. 3～R6. 2. 28 変更 | 工期                                                                                  | 当初 R5. 4. 20～R6. 2. 29 変更 | 工期                                                                                   | 当初 R5. 4. 24～R6. 1. 31 変更 | 工期   |  |
| 受注者名                                                                               | (株) 加藤工務店                | 受注者名                                                                                | (株) 関電工事                  | 受注者名                                                                                 | セントラル建設(株)                | 受注者名 |  |
| 今月作業                                                                               | 準備工 (調査ボーリング)            | 今月作業                                                                                | 準備工                       | 今月作業                                                                                 | 準備工、地下横断歩道補修工             | 今月作業 |  |
| 来月作業                                                                               | 地山補強土工                   | 来月作業                                                                                | 道路照明設備工                   | 来月作業                                                                                 | 準備工、地下横断歩道補修工             | 来月作業 |  |
|  |                          |  |                           |  |                           | 写真   |  |
| ⑬                                                                                  |                          | ⑭                                                                                   |                           | ⑮                                                                                    |                           | ⑯    |  |
| 工事名                                                                                |                          | 工事名                                                                                 |                           | 工事名                                                                                  |                           | 工事名  |  |
| 工期                                                                                 |                          | 工期                                                                                  |                           | 工期                                                                                   |                           | 工期   |  |
| 受注者名                                                                               |                          | 受注者名                                                                                |                           | 受注者名                                                                                 |                           | 受注者名 |  |
| 今月作業                                                                               |                          | 今月作業                                                                                |                           | 今月作業                                                                                 |                           | 今月作業 |  |
| 来月作業                                                                               |                          | 来月作業                                                                                |                           | 来月作業                                                                                 |                           | 来月作業 |  |
| 写真                                                                                 |                          | 写真                                                                                  |                           | 写真                                                                                   |                           | 写真   |  |
