

工事進捗状況（令和５年１０月末）

中津川出張所

①					
工事名	令和４年度 木曽川水系川上流路工事				
工期	当初 R4. 9. 1～R5. 3. 16		変更 R4. 9. 1～R5. 7. 31		
受注者名	(株)中島工務店				
進捗率	予定	100	実施	100	差 0.0
今月作業	－				
来月作業	－				



②					
工事名	令和４年度 木曽川水系アクラ沢砂防堰堤工事				
工期	当初 R4. 9. 1～R5. 3. 16		変更 R3. 9. 1～R5. 6. 30		
受注者名	(株)中島工務店				
進捗率	予定	100	実施	100	差 0
今月作業	－				
来月作業	－				



③					
工事名	令和４年度 中津川出張所管内整備工事				
工期	当初 R4. 12. 14～R5. 11. 30		変更		
受注者名	(株)加藤工務店				
進捗率	予定	—	実施	94.0	差 —
今月作業	川上川流路工第7床固工下流右岸補修、薬師沢管理用道路整備 等				
来月作業	薬師沢管理用道路整備、砂防施設看板設置 等				



④				
工事名	令和４年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事			
工期	当初 R5. 4. 17～R6. 2. 29		変更 R5. 4. 17～R6. 3. 29	
受注者名	(株)鳴海組			
進捗率	予定	24.2	実施	19.8 差 -4.4
今月作業	工事用道路盛土、残土処理			
来月作業	コンクリート堰堤床掘り、仮設ミル吹付、鉄筋挿入			



⑤					
工事名	令和４年度 木曽川水系和田沢砂防堰堤工事				
工期	当初 R5. 4. 28～R6. 2. 29		変更		
受注者名	(株)加藤工務店				
進捗率	予定	51.7	実施	49.4	差 -2.3
今月作業	コンクリート堰堤本体工 (Aﾌﾟﾛｸﾞ10/10、Bﾌﾟﾛｸﾞ6/7、Cﾌﾟﾛｸﾞ9/10、)、鋼製堰堤本体工				
来月作業	コンクリート堰堤本体工 (Cﾌﾟﾛｸﾞ10/10)、コンクリート垂直壁工 (4/4)、コンクリート側壁工 (6/12)				



⑥					
工事名	令和５年度 木曽川水系地獄谷管理用道路工事				
工期	当初 R5. 6. 19～R6. 3. 15		変更		
受注者名	(株)吉川工務店				
進捗率	予定	89.9	実施	96.2	差 6.3
今月作業	路体盛土、大型ﾌﾞﾛｯｸ据付 (10/10段目)、根固めﾌﾞﾛｯｸ設置				
来月作業	路体盛土、仮締切撤去				



⑦					
工事名	令和５年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事				
工期	当初 R5. 7. 26～R6. 3. 13		変更		
受注者名	(株)中島工務店				
進捗率	予定	26.9	実施	26.0	差 -0.9
今月作業	置換コンクリート、コンクリート堰堤本体 (Aﾌﾟﾛｸﾞ1/4、Bﾌﾟﾛｸﾞ2/5、Cﾌﾟﾛｸﾞ2/6)				
来月作業	コンクリート堰堤本体 (Aﾌﾟﾛｸﾞ4/4、Bﾌﾟﾛｸﾞ5/5、Cﾌﾟﾛｸﾞ6/6)				



⑧					
工事名	令和５年度 木曽川水系荒道谷砂防堰堤改築工事				
工期	当初 R5. 8. 1～R6. 3. 8		変更		
受注者名	(株)鳴海組				
進捗率	予定	4.1	実施	11.0	差 6.9
今月作業	コンクリート表面処理、コンクリート堰堤本体 (Dﾌﾟﾛｸﾞ1/7、Fﾌﾟﾛｸﾞ1/5)				
来月作業	コンクリート堰堤本体工 (Gﾌﾟﾛｸﾞ2/7、Dﾌﾟﾛｸﾞ3/7、Eﾌﾟﾛｸﾞ3/3、Fﾌﾟﾛｸﾞ3/5)				



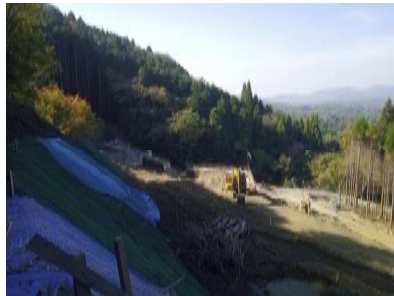
工事進捗状況（令和5年10月末）

中津川出張所

⑨				⑩																											
工事名	令和5年度 木曽川水系中津川管内施設改築工事							工事名	令和5年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事							工事名															
工期	当初 R5. 8. 1～R6. 3. 8 変更							工期	当初 R5. 9. 25～R6. 3. 13 変更							工期	当初 変更														
受注者名	(株)中島工務店							受注者名	(株)吉川工務店							受注者名															
進捗率	予定	12.6	実施	12.6	差	0.0		進捗率	予定	3.7	実施	1.6	差	-2.1		進捗率	予定		実施		差										
今月作業	【川上地区】根固めﾌﾞﾛｯｸ床付、工事用道路・仮締切設置							今月作業	準備工							今月作業															
来月作業	【川上地区】根固めﾌﾞﾛｯｸｺﾝｸﾘｰﾄ打設、護岸補修							来月作業	道路土工、伐採							来月作業															
								準備工																							
工事名								工事名								工事名								工事名							
工期	当初 変更							工期	当初 変更							工期	当初 変更							工期	当初 変更						
受注者名								受注者名								受注者名								受注者名							
進捗率	予定		実施		差			進捗率	予定		実施		差			進捗率	予定		実施		差										
今月作業								今月作業								今月作業								今月作業							
来月作業								来月作業								来月作業								来月作業							

工事進捗状況 (令和5年10月末)

妻木出張所

①				②				③				④				
工事名	令和4年度 妻木出張所管内整備工事			工事名	令和4年度 富士下第2砂防堰堤改築工事			工事名	令和5年度 妻木管内砂防施設整備工事			工事名	令和5年度 寺下第3砂防堰堤改築工事			
工期	当初 R4.12.1～R5.11.30 変更			工期	当初 R5.4.3～R6.2.29 変更 R5.4.3～R6.3.25			工期	当初 R5.5.15～R6.3.15 変更			工期	当初 R5.8.1～R6.3.13 変更			
受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 吉川組			受注者名	(株) 藤本組			
進捗率	予定	90	実施 100	差 10	進捗率	予定 52.1	実施 53.7	差 1.6	進捗率	予定 47.6	実施 44.7	差 -2.9	進捗率	予定 30.1	実施 22.1	差 -8
今月作業	作業完了			今月作業	堰堤コンクリート工			今月作業	道路土工 路体盛土（寺下富士）コンクリート堰堤 埋戻し・工事用道路撤去（鍛冶ヶ入）			今月作業	仮設工（工事用道路工、仮橋・仮棧橋工）、準備工（立木伐採）			
来月作業	-			来月作業	堰堤コンクリート工、砂防土工、道路土工			来月作業	流路護岸工 コンクリートブロック積（寺下富士）			来月作業	準備工（立木伐採）、道路土工（掘削工）			
 雲五川流路工  CCTV除草対策								鍛冶ヶ入地区  寺下富士地区 								
⑤				⑥				⑦				⑧				
工事名				工事名				工事名				工事名				
工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名				
進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業				
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業				

工事進捗状況（令和5年10月末）

上松出張所

①					②					③					④									
工事名	令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事					工事名	令和4年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事					工事名	令和4年度 上松出張所管内整備工事					工事名	令和4年度 木曽川水系 宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事					
工期	当初 R4.9.26～R5.2.28 変更 R5.10.6					工期	当初 R4.11.1～R6.1.31 変更 -					工期	当初 R4.12.1～R5.11.30 変更 -					工期	当初 R5.4.3～R6.2.29 変更 -					
受注者名	朝日電気工業（株）					受注者名	大宗土建（株）					受注者名	大宗土建（株）					受注者名	奥田工業（株）					
進捗率	予定	100.0	実施	100.0	差 0.0	進捗率	予定	70.1	実施	77.3	差 7.2	進捗率	予定 -	実施	117.2	差 -	進捗率	予定 78.3	実施	79.6	差 1.3			
今月作業	10月19日完成検査					今月作業	道路復旧 崩壊土砂除去、仮設土留工					今月作業	準備工					今月作業	流路護岸工・根固め・水制工、砂防土工（掘削）					
来月作業						来月作業	準備工 立木伐採、伐採木運搬・処分					来月作業	準備工					来月作業	砂防土工（盛土工）、植生工、道路土工、舗装工					
																								
⑤					⑥					⑦					⑧									
工事名	令和4年度 木曽川水系 猿沢砂防施設整備工事					工事名	令和4年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事					工事名	令和4年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事					工事名	令和5年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事					
工期	当初 R5.4.3～R6.1.31 変更 R6.3.29					工期	当初 R5.4.3～R6.2.29 変更 -					工期	当初 R5.4.28～R6.2.29 変更 -					工期	当初 R5.5.16～R6.3.15 変更 -					
受注者名	奥田工業（株）					受注者名	大宗土建（株）					受注者名	木曽土建工業（株）					受注者名	奥田工業（株）					
進捗率	予定	33.6	実施	32.9	差 -0.7	進捗率	予定	84.4	実施	85.9	差 1.5	進捗率	予定 78.2	実施	85.3	差 7.1	進捗率	予定 36.6	実施	33.1	差 -3.5			
今月作業	伐採工					今月作業	砂防土工（残土処理工）・コンクリート堰堤工（作業土工）					今月作業	コンクリート堰堤工、鋼製堰堤工					今月作業	構造物撤去工（切断、取壊し、搬出）仮設工					
来月作業	工事用道路工					来月作業	砂防土工（残土処理工）・コンクリート堰堤工（作業土工）・法面工					来月作業	コンクリート堰堤工					来月作業	コンクリート堰堤工（差し筋、型枠、打設）仮設工（仮水路）					
																								

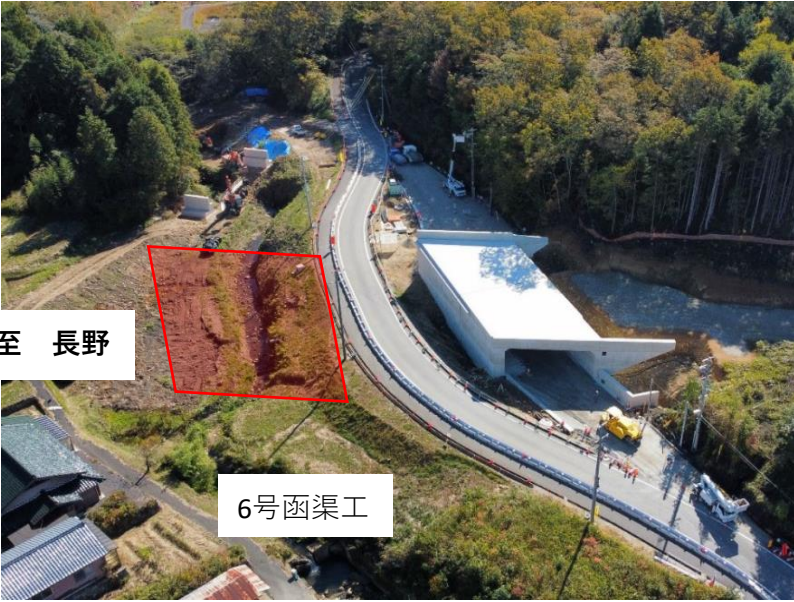
工事進捗状況（令和5年10月末）

上松出張所

⑨						⑩													
工事名	令和5年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事					工事名	令和5年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事												
工期	当初 R5. 8. 7～R6. 3. 8 変更					工期	当初 R5. 12. 11～R7. 1. 31 変更												
受注者名	神稲建設（株）					受注者名	奥田工業(株)												
進捗率	予定	19. 8	実施	19. 8	差	0. 0	進捗率	予定		実施		差	0. 0						
今月作業	作業土工・法面工・鉄筋挿入					今月作業	令和5年10月30日 契約締結												
来月作業	作業土工・法面工・鉄筋挿入・地下水排除・擁壁工					来月作業	施工計画書作成												
						写真なし													

工事進捗状況（令和5年10月末）

瑞浪国道維持出張所（瑞恵道路）

①		②		③		④	
工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路 中切道路建設工事	工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路 中畑道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事
工期	当初 R4.3.31～R5.3.24 変更 R5.8.30	工期	当初 R4.4.1～R5.2.28 変更 R5.11.15	工期	当初 R4.9.9～R6.2.29 変更 R6.3.29	工期	当初 R4.10.3～R6.2.29 変更 R6.3.29
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)吉川組
今月作業		今月作業	カルバート工 埋戻し	今月作業	仮設工、準備工	今月作業	道路土工、橋台工、仮設工
来月作業		来月作業	地下排水工、残土処理工、後片付け	来月作業	仮設工、準備工	来月作業	道路土工、橋台工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 名滝地区下部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 名滝地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事
工期	当初 R5.1.16～R6.2.29 変更 R6.3.29	工期	当初 R5.4.14～R5.9.29 変更 ～R5.11.16	工期	当初 R5.4.28～R6.2.29 変更	工期	当初 R4.12.6～R6.2.29 変更 R6.3.29
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	L型擁壁工・舗装工	今月作業	橋台工	今月作業	仮設工(準備)	今月作業	仮橋工、歩道舗装工、カルバート工、仮水路工
来月作業	上切地区：防護柵工 公文垣内地区：作業土工	来月作業	橋台工・法尻排水工・放流工	来月作業	仮設工鋼矢板打設 排水構造物工	来月作業	カルバート工、伐採工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪4号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 恵那地区道路建設工事
工期	当初 R4.9.9～R6.2.29 変更	工期	当初 R4.9.27～R7.2.28 変更	工期	当初 R5.3.16～R7.2.28 変更	工期	当初 R5.7.7～R6.1.31 変更
受注者名	宇野重工（株）	受注者名	瀧上工業（株）	受注者名	（株）北都鉄工	受注者名	恵中建設（株）
今月作業	準備工・作業ヤード整備工	今月作業	工場製作	今月作業	工場製作	今月作業	排水工・待避所
来月作業	作業ヤード整備工・架設工	来月作業	工場製作、搬入JRへ引渡	来月作業	工場製作	来月作業	地盤改良工
							
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区道路建設工事	工事名		工事名		工事名	
工期	当初 R5.9.1～R7.2.28 変更	工期		工期		工期	
受注者名	（株）中島工務店	受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業	準備工、仮設工、橋台工	今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	準備工、仮設工、橋台工	来月作業		来月作業		来月作業	
		写真		写真		写真	

工事進捗状況（令和5年10月末）

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和4年度 多治見国道標識工事
工期	当初 R2. 10. 30～R5. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 10. 1～R6. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 4. 30～R4. 12. 16 変更 R5. 6. 30	工期	当初 R4. 4. 30～R5. 2. 28 変更 R5. 5. 31
受注者名	日本ハイウェイサービス（株）	受注者名	（有）木曽ハイウェーサービス	受注者名	（株）加藤工務店	受注者名	（株）キクテック
今月作業		今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	来月作業		来月作業	
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 多治見国道電気通信設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道防災工事	工事名	令和4年度 多治見国道橋梁補修工事	工事名	令和4年度 多治見国道21号中地区垂炭坑充填工事
工期	当初 R4. 8. 2～R5. 2. 28 変更 R5. 8. 18	工期	当初 R5. 3. 1～R6. 2. 28 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R5. 3. 13～R6. 1. 31 変更 R5. 11. 29	工期	当初 R5. 3. 30～R6. 2. 28 変更
受注者名	エフコム（株）	受注者名	（株）加藤工務店	受注者名	（株）梅田組	受注者名	徳倉建設（株）
今月作業		今月作業	小割除去、ロープ掛、ロープ伏、仮設足場	今月作業	橋梁付属物工、橋梁補修工、仮設工（多治見工区）	今月作業	準備工、技術管理、充填孔設置工
来月作業		来月作業	小割除去、ロープ掛、ロープ伏、仮設足場	来月作業	準備工	来月作業	準備工、技術管理、充填孔設置工
							

⑨		⑩		⑪		①	
工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和4年度 多治見国道照明設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道瑞浪維持管内整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事
工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 28 変更 R6. 3. 28	工期	当初 R5. 4. 20～R6. 2. 29 変更	工期	当初 R5. 4. 24～R6. 1. 31 変更	工期	当初 R5. 10. 1～R7. 10. 31 変更
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 関電工事	受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	日本ハイウェイサービス(株)
今月作業	準備工(調査ボーリング)	今月作業	照明設備工	今月作業	準備工、地下横断歩道補修工	今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他
来月作業	地山補強土工	来月作業	道路照明設備工	来月作業	準備工、地下横断歩道補修工	来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他
							
⑭		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	
