

工事進捗状況 (令和5年12月末)

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 木曾川水系川上流路工事	工事名	令和4年度 木曾川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和4年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和4年度 木曾川水系本谷砂防堰堤改築工事
工期	当初 R4.9.1~R5.3.16 変更 R4.9.1~R5.7.31	工期	当初 R4.9.1~R5.3.16 変更 R3.9.1~R5.6.30	工期	当初 R4.12.14~R5.11.30 変更	工期	当初 R5.4.17~R6.2.29 変更 R5.4.17~R6.3.29
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)鳴海組
進捗率	予定 100 実施 100 差 0.0	進捗率	予定 100 実施 100 差 0.0	進捗率	予定 - 実施 100.0 差 -	進捗率	予定 26.7 実施 22.2 差 -4.5
今月作業	-	今月作業	-	今月作業	完成検査(12月8日)	今月作業	舗装
来月作業	-	来月作業	-	来月作業	-	来月作業	コンクリート堰堤床掘り、仮設物吹付、鉄筋挿入、残土処理



⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 木曾川水系和田沢砂防堰堤工事	工事名	令和5年度 木曾川水系地獄谷管理用道路工事	工事名	令和5年度 木曾川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和5年度 木曾川水系荒道谷砂防堰堤改築工事
工期	当初 R5.4.28~R6.2.29 変更	工期	当初 R5.6.19~R6.3.15 変更	工期	当初 R5.7.26~R6.3.13 変更	工期	当初 R5.8.1~R6.3.8 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)鳴海組
進捗率	予定 77.6 実施 73.1 差 -4.5	進捗率	予定 100 実施 100 差 0.0	進捗率	予定 66.6 実施 66.6 差 0.0	進捗率	予定 62.7 実施 63.7 差 1.0
今月作業	コンクリート垂直壁工(4/4)、コンクリート側壁工(6/12)、水叩工(1/1)	今月作業	後片付け、完成検査(12月26日)	今月作業	コンクリート堰堤作業土工、コンクリート堰堤本体(D7'ロック2/4、E7'ロック1/4)	今月作業	コンクリート堰堤本体工(C7'ロック3/7、D7'ロック4/7、F7'ロック4/5)、既設堰堤切断・取壊し
来月作業	コンクリート側壁工(12/12)、かご工(右岸側)	来月作業	-	来月作業	コンクリート堰堤本体(D7'ロック4/4、E7'ロック4/4)、床固め作業土工	来月作業	コンクリート堰堤本体工(B7'ロック3/4、C7'ロック5/7、D7'ロック6/7、F7'ロック5/5)




工事進捗状況 (令和5年12月末)

中津川出張所

⑨		⑩		⑪			
工事名	令和5年度 木曾川水系中津川管内施設改築工事	工事名	令和5年度 木曾川水系新梨沢砂防堰堤工事	工事名	令和5年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	
工期	当初 R5.8.1~R6.3.8 変更	工期	当初 R5.9.25~R6.3.13 変更	工期	当初 R5.12.1~R6.11.29 変更	工期	当初 変更
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	
進捗率	予定 31.4 実施 33.9 差 2.5	進捗率	予定 15.4 実施 15.0 差 -0.4	進捗率	予定 - 実施 0.8 差 -	進捗率	予定 実施 差
今月作業	【川上地区】根固めブロックコンクリート打設	今月作業	準備工、道路土工、伐採	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	【川上地区】根固めブロックコンクリート打設、仮締切撤去(下流側一部)	来月作業	準備工、道路土工、擁壁工、構造物撤去工、伐採	来月作業	中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、大又沢雨量観測所伐採等	来月作業	
				<p>準備工</p>			
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

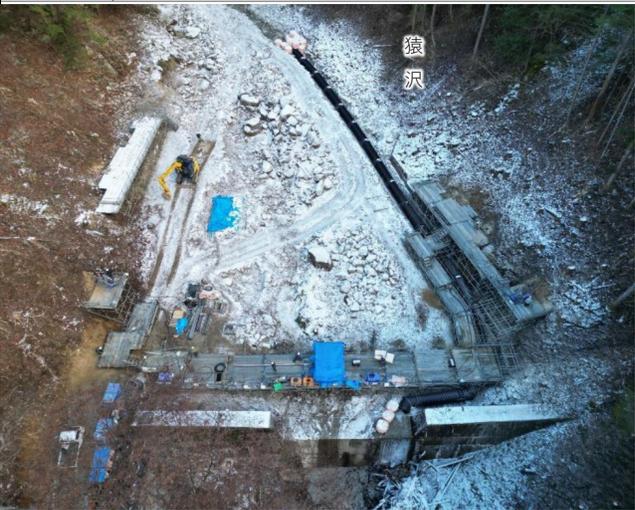
工事進捗状況 (令和5年12月末)

妻木出張所

①				②				③				④															
工事名	令和4年度 妻木出張所管内整備工事			工事名	令和4年度 富士下第2砂防堰堤改築工事			工事名	令和5年度 妻木管内砂防施設整備工事			工事名	令和5年度 寺下第3砂防堰堤改築工事														
工期	当初 R4. 12. 1~R5. 11. 30 変更			工期	当初 R5. 4. 3~R6. 2. 29 変更 R5. 4. 3~R6. 3. 25			工期	当初 R5. 5. 15~R6. 3. 15 変更			工期	当初 R5. 8. 1~R6. 3. 13 変更														
受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 吉川組			受注者名	(株) 藤本組														
進捗率%	予定	100	実施	100	差	0	進捗率%	予定	63.7	実施	65.2	差	1.5	進捗率%	予定	76.3	実施	75.8	差	-0.5	進捗率%	予定	76.6	実施	69.4	差	-7.2
今月作業	-			今月作業	法面補強工, 砂防土工, 道路土工			今月作業	流路護岸工 ブロック積, 床固め工 (寺下富士)			今月作業	伐木除根工 (伐木伐竹運搬)、排水構造物工 (側溝工)														
来月作業	-			来月作業	法面補強工, 砂防土工, 道路土工, 伐採工			来月作業	流路護岸工 ブロック積, 床固め工 (寺下富士)			来月作業	排水構造物工 (側溝工)、法面工 (植生工)														
工事完成								 																			
⑤				⑥				⑦				⑧															
工事名	令和5年度 妻木出張所管内整備工事			工事名				工事名				工事名															
工期	当初 R5. 12. 11~R6. 11. 29 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更														
受注者名	(株) 藤本組			受注者名				受注者名				受注者名															
進捗率%	予定	2.0	実施	1.9	差	-0.1	進捗率%	予定		実施		差	0	進捗率%	予定		実施		差	0	進捗率%	予定		実施		差	0
今月作業	指示: 1 【生田川除草】 【上細峰除草】			今月作業				今月作業				今月作業															
来月作業	指示: 1 【大平堰堤整備】 指示: 2 【狭間川整備】			来月作業				来月作業				来月作業															
 																											

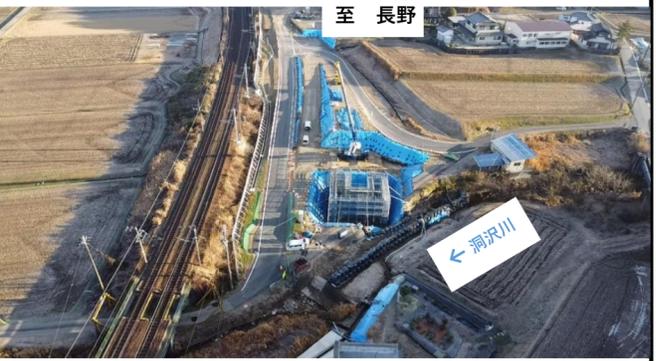
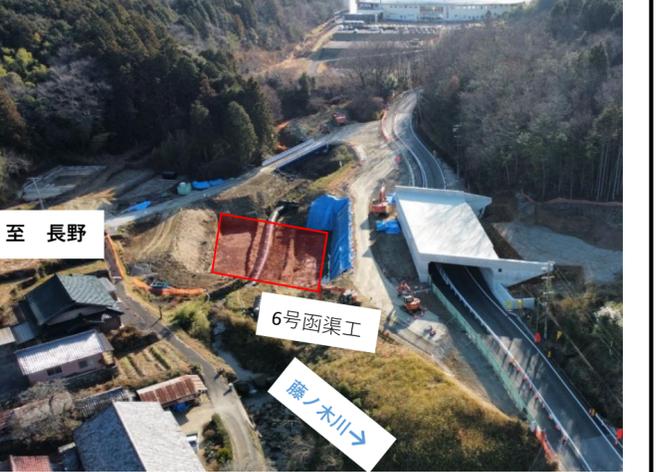
工事進捗状況 (令和5年12月末)

上松出張所

①					②					③					④														
工事名	令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事				工事名	令和4年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤工事				工事名	令和4年度 上松出張所管内整備工事				工事名	令和4年度 木曾川水系 宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事													
工期	当初	R4.9.26	～	R5.2.28	変更	R5.10.6	工期	当初	R4.11.1	～	R6.1.31	変更	R5.2.29	工期	当初	R4.12.1	～	R5.11.30	変更	-	工期	当初	R5.4.3	～	R6.2.29	変更	R5.4.3	～	R6.3.21
受注者名	朝日電気工業(株)				受注者名	大宗土建(株)				受注者名	大宗土建(株)				受注者名	奥田工業(株)													
進捗率	予定	-	実施	-	差	-	進捗率	予定	79.2	実施	98.8	差	19.6	進捗率	予定	-	実施	100.0	差	-	進捗率	予定	87.3	実施	88.3	差	1.0		
今月作業	-				今月作業	伐採木運搬・処分、わら伏工、片付け				今月作業	12月11日完成検査				今月作業	植生工、排水構造物工、砂防付属物設置工													
来月作業	-				来月作業	側溝工、片付け				来月作業	-				来月作業	舗装工(アスファルト舗装工)													
																													
⑤					⑥					⑦					⑧														
工事名	令和4年度 木曾川水系 猿沢砂防施設整備工事				工事名	令和4年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事				工事名	令和4年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事				工事名	令和5年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事													
工期	当初	R5.4.3	～	R6.1.31	変更	R6.3.29	工期	当初	R5.4.3	～	R6.2.29	変更	-	工期	当初	R5.4.28	～	R6.2.29	変更	-	工期	当初	R5.5.16	～	R6.3.15	変更	-		
受注者名	奥田工業(株)				受注者名	大宗土建(株)				受注者名	木曾土建工業(株)				受注者名	奥田工業(株)													
進捗率	予定	58.2	実施	54.6	差	-3.6	進捗率	予定	99.5	実施	99.5	差	0.0	進捗率	予定	95.0	実施	99.0	差	4.0	進捗率	予定	85.7	実施	88.4	差	2.7		
今月作業	強靱ワイヤーネット工				今月作業	法面工・片付け				今月作業	仮設撤去、片付け				今月作業	鋼製堰堤工(現場塗装)、コンクリート堰堤工(型枠、打設)													
来月作業	強靱ワイヤーネット工				来月作業	片付け				来月作業	無し				来月作業	コンクリート堰堤工(脱枠～仕上げ)、仮設工(掘削)													
																													

工事進捗状況 (令和5年11月末)

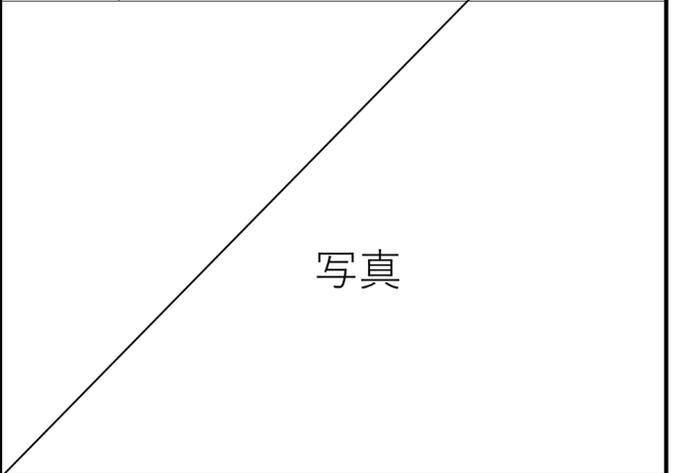
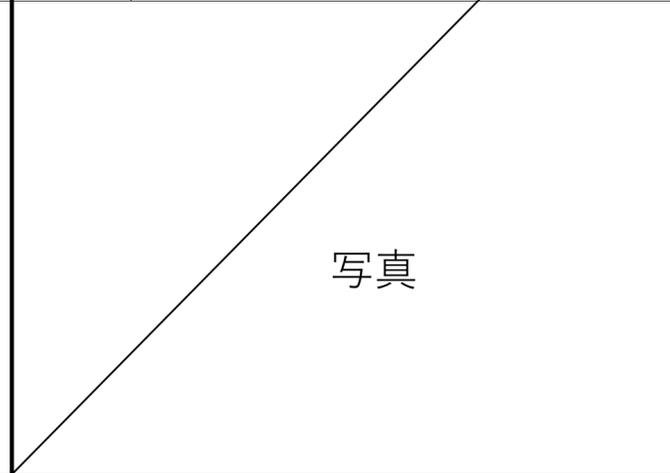
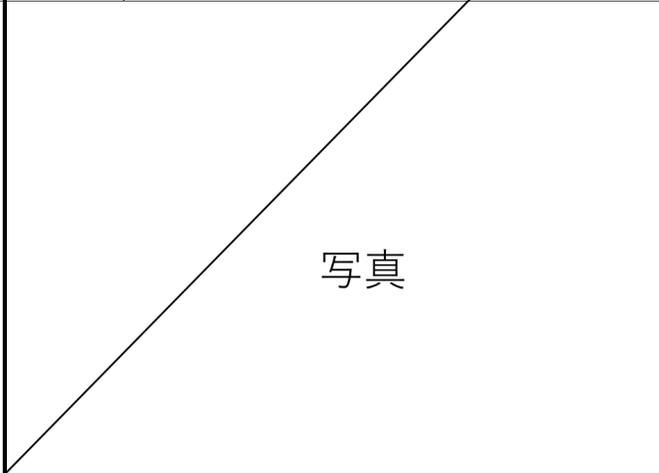
瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路 中切道路建設工 完成	工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路 中畑道路建設工 完成	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事
工期	当初 R4.3.31~R5.3.24 変更 R5.8.30	工期	当初 R4.4.1~R5.2.28 変更 R5.11.15	工期	当初 R4.9.9~R6.2.29 変更 R6.3.29	工期	当初 R4.10.3~R6.2.29 変更 R6.3.29
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)吉川組
今月作業		今月作業		今月作業	擁壁工、仮設工、準備工	今月作業	道路土工、橋台工
来月作業		来月作業		来月作業	擁壁工、仮設工、準備工	来月作業	道路土工、排水構造物工、橋台工、法覆護岸工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 名滝地区下部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 名滝地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事
工期	当初 R5.1.16~R6.2.29 変更 R6.3.29	工期	当初 R5.4.14~R5.9.29 変更 ~R6.3.22	工期	当初 R5.4.28~R6.2.29 変更 R6.3.29	工期	当初 R4.12.6~R6.2.29 変更 R6.3.29
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	護岸工(仮設工)・6号函渠工	今月作業	橋台工・法尻排水工・放流工	今月作業	仮設工(鋼管杭圧入) 排水構造物工	今月作業	カルバート工、石・ブロック積工
来月作業	護岸工(仮設工)重力式擁壁・6号函渠工	来月作業	橋台工・法尻排水工・放流工	来月作業	仮設工(鋼管杭圧入) 排水構造物工	来月作業	カルバート工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪4号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 恵那地区道路建設工事
工期	当初 R4.9.9~R6.2.29 変更	工期	当初 R4.9.27~R7.2.28 変更	工期	当初 R5.3.16~R7.2.28 変更	工期	当初 R5.7.7~R6.1.31 変更
受注者名	宇野重工(株)	受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株)北都鉄工	受注者名	恵中建設(株)
今月作業	架設工	今月作業	工場製作、搬入JRへ引渡	今月作業	工場製作	今月作業	地盤改良工
来月作業	現場塗装工、作業ヤード整備工	来月作業	工場製作、搬入JRへ引渡	来月作業	工場製作	来月作業	地盤改良工



⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区道路建設工事	工事名		工事名		工事名	
工期	当初 R5.9.1~R7.2.28 変更	工期		工期		工期	
受注者名	(株)中島工務店	受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業	準備工、仮設工、橋台工	今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	橋台工、法覆護岸工	来月作業		来月作業		来月作業	



工事進捗状況 (令和5年12月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事 完	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事 完	工事名	令和4年度 多治見国道標識工事 完
工期	当初 R2. 10. 30~R5. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 10. 1~R6. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 4. 30~R4. 12. 16 変更 R5. 6. 30	工期	当初 R4. 4. 30~R5. 2. 28 変更 R5. 5. 31
受注者名	日本ハイウェイサービス (株)	受注者名	(有) 木曾ハイウェイサービス	受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) キクテック
今月作業		今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	来月作業		来月作業	
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 多治見国道電気通信設備工事 完	工事名	令和4年度 多治見国道防災工事	工事名	令和4年度 多治見国道橋梁補修工事 完	工事名	令和4年度 多治見国道21号中地区垂炭坑充填工事
工期	当初 R4. 8. 2~R5. 2. 28 変更 R5. 8. 18	工期	当初 R5. 3. 1~R6. 2. 28 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R5. 3. 13~R6. 1. 31 変更 R5. 11. 29	工期	当初 R5. 3. 30~R6. 2. 28 変更
受注者名	エフコム (株)	受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 梅田組	受注者名	徳倉建設 (株)
今月作業		今月作業	小割除去、ロープ掛、ロープ伏、仮設足場、舗装	今月作業		今月作業	準備工、技術管理、事業損失防止施設工
来月作業		来月作業	小割除去、ロープ伏、仮設撤去	来月作業		来月作業	準備工
							

⑨		⑩		⑪		①	
工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和4年度 多治見国道照明設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道瑞浪維持管内整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事
工期	当初 R5. 4. 3~R6. 2. 28 変更 R6. 3. 28	工期	当初 R5. 4. 20~R6. 2. 29 変更	工期	当初 R5. 4. 24~R6. 1. 31 変更 R6. 2. 28	工期	当初 R5. 10. 1~R7. 10. 31 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)関電工事	受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	日本ハイウェイサービス(株)
今月作業	地山補強土工	今月作業	照明設備工	今月作業	地下横断歩道補修工、法面保護工	今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他
来月作業	地山補強土工	来月作業	道路照明設備工	来月作業	地下横断歩道補修工、アスファルト舗装工	来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他
							
⑫		⑬		⑭		⑮	
工事名	令和5年度 多治見国道西部除雪作業工事	工事名	令和5年度 多治見国道東部除雪作業工事	工事名	令和5年度 多治見国道橋梁補修工事	工事名	
工期	当初 R5. 11. 15~R6. 3. 31 変更	工期	当初 R5. 11. 10~R6. 3. 31 変更	工期	当初 R5. 12. 11~R7. 2. 28 変更	工期	
受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)梅田組	受注者名	
今月作業	凍結防止工	今月作業	除雪工	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	凍結防止工	来月作業	除雪工	来月作業	準備工	来月作業	
		 <div data-bbox="819 1591 982 1787" style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: small;"> 工事名 令和5年度 多治見国道東部除雪作業工事 工種 除雪材料受け取り 期日 12月21日 塩化ナトリウム(1t) 12袋 納入箇所 恵那雪害倉庫 </div>				写真	
