

工事進捗状況（令和6年2月末）

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 木曽川水系川上流路工事	工事名	令和4年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和4年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和4年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事
工期	当初 R4.9.1～R5.3.16 変更 R4.9.1～R5.7.31	工期	当初 R4.9.1～R5.3.16 変更 R3.9.1～R5.6.30	工期	当初 R4.12.14～R5.11.30 変更	工期	当初 R5.4.17～R6.2.29 変更 R5.4.17～R6.3.29
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)鳴海組
進捗率	予定 100 実施 100 差 0.0	進捗率	予定 100 実施 100 差 0	進捗率	予定 — 実施 100.0 差 —	進捗率	予定 85.2 実施 88.6 差 3.4
今月作業	—	今月作業	—	今月作業	完成検査(12月8日)	今月作業	コンクリート堰堤床掘り、仮設モルタル吹付、鉄筋挿入、残土処理
来月作業	—	来月作業	—	来月作業	—	来月作業	コンクリート堰堤床掘り、仮設モルタル吹付、鉄筋挿入、残土処理、後片付け
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 木曽川水系和田沢砂防堰堤工事	工事名	令和5年度 木曽川水系地獄谷管理用道路工事	工事名	令和5年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和5年度 木曽川水系荒道谷砂防堰堤改築工事
工期	当初 R5.4.28～R6.2.29 変更 R5.4.28～R6.3.29	工期	当初 R5.6.19～R6.3.15 変更	工期	当初 R5.7.26～R6.3.13 変更	工期	当初 R5.8.1～R6.3.8 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)鳴海組
進捗率	予定 87.9 実施 88.2 差 0.3	進捗率	予定 100 実施 100 差 0	進捗率	予定 96.2 実施 98.0 差 1.8	進捗率	予定 100 実施 100 差 0.0
今月作業	コンクリート堰堤本体(D7° ロック5/5)、かご工(右・左岸側)	今月作業	後片付け、完成検査(12月26日)	今月作業	床固め本体(A7° ロック4/4、B7° ロック4/4)、垂直壁(3/3)	今月作業	コンクリート堰堤本体工(B7° ロック4/4、C7° ロック7/7、D7° ロック7/7)、後片付け
来月作業	コンクリート堰堤本体(E7° ロック3/3)、盛土工、後片付け、完成検査(3月28日)	来月作業	—	来月作業	作業土工(埋戻し)、後片付け、完成検査(3月22日)	来月作業	完成検査(3月6日)
							

工事進捗状況（令和6年2月末）										中津川出張所																																											
⑨					⑩					⑪																																											
工事名		令和5年度 木曽川水系中津川管内施設改築工事								工事名		令和5年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事								工事名																																	
工期		当初 R5. 8. 1～R6. 3. 8				変更 R5. 8. 1～R6. 6. 20				工期		当初 R5. 9. 25～R6. 3. 13				変更 R5. 9. 25～R6. 6. 25				工期		当初 R5. 12. 1～R6. 11. 29				変更				工事名		当初				変更																	
受注者名		(株)中島工務店								受注者名		(株)吉川工務店								受注者名		(株)鳴海組								受注者名																							
進捗率		予定		45. 8		実施		41. 3		差		-4. 5		進捗率		予定		28. 3		実施		27. 2		差		-1. 1		進捗率		予定		－		実施		6. 4		差		－		進捗率		予定				実施				差	
今月作業		【川上地区】仮締切撤去、河床整正 【正ヶ根地区】大型土のう作成								今月作業		準備工								今月作業		中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、地獄谷土壌調査、冷川排水路整備、大玉石採取 等								今月作業																							
来月作業		【正ヶ根地区】立木伐採、大型土のう作成								来月作業		準備工、管理用道路掘削・盛土、落石防止工								来月作業		中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、冷川排水路整備、大玉石採取 等								来月作業																							
																																																					
工事名										工事名										工事名										工事名																							
工期		当初								工期		当初								工期		当初								工期		当初																					
受注者名										受注者名										受注者名										受注者名																							
進捗率		予定				実施				差		進捗率		予定				実施				差		進捗率		予定				実施				差		進捗率		予定				実施				差							
今月作業										今月作業										今月作業										今月作業																							
来月作業										来月作業										来月作業										来月作業																							

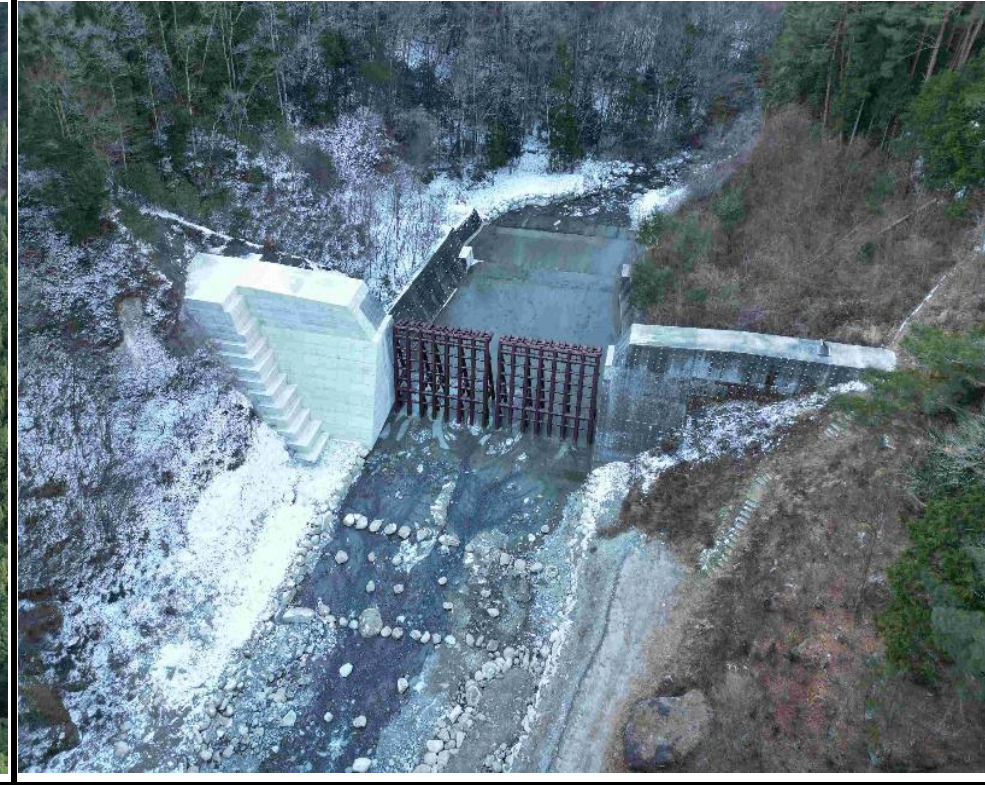
工事進捗状況（令和6年2月末）

妻木出張所

①					②					③					④					
工事名	令和4年度 妻木出張所管内整備工事				工事名	令和4年度 富士下第2砂防堰堤改築工事				工事名	令和5年度 妻木管内砂防施設整備工事				工事名	令和5年度 寺下第3砂防堰堤改築工事				
工期	当初 R4. 12. 1～R5. 11. 30 変更				工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 29 変更 R5. 4. 3～R6. 3. 25				工期	当初 R5. 5. 15～R6. 3. 15 変更 R5. 5. 15～R6. 3. 28				工期	当初 R5. 8. 1～R6. 3. 13 変更 R5. 8. 1～R6. 3. 28				
受注者名	(株) 藤本組				受注者名	(株) 藤本組				受注者名	(株) 吉川組				受注者名	(株) 藤本組				
進捗率%	予定	100	実施	100	差	0	進捗率%	予定	95.3	実施	96.3	差	1.0	進捗率%	予定	95.0	実施	95.0	差	0.0
今月作業	-				今月作業	排水構造物工, 法面工, 仮設工				今月作業	流路護岸工 ブロック積、床張工、床固め工 仮設工、工事用道路撤去（寺下富士）				今月作業	準備工				
来月作業	-				来月作業	無し				来月作業	無し				来月作業	無し				
工事完成										鍛冶ヶ入地区  寺下富士地区 										
⑤					⑥					⑦					⑧					
工事名	令和5年度 妻木出張所管内整備工事				工事名					工事名					工事名					
工期	当初 R5. 12. 11～R6. 11. 29 変更				工期	当初 変更				工期	当初 変更				工期	当初 変更				
受注者名	(株) 藤本組				受注者名					受注者名					受注者名					
進捗率%	予定	12	実施	11.6	差	-0.4	進捗率%	予定		実施		差	0	進捗率%	予定		実施		差	0
今月作業	指示 1 【生田川整備】				今月作業					今月作業					今月作業					
来月作業	指示 1 【生田川整備】、指示 2 【梅平護岸整備】				来月作業					来月作業					来月作業					
																				

工事進捗状況（令和6年2月末）

上松出張所

①						②						③						④																													
工事名		令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事										工事名		令和4年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事										工事名		令和4年度 木曽川水系 宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事																					
工期		当初 R4.9.26～R5.2.28 変更 R5.10.6										工期		当初 R4.11.1～R6.1.31 変更 R5.2.29										工期		当初 R4.12.1～R5.11.30 変更 -										工期		当初 R5.4.3～R6.2.29 変更 R6.3.21									
受注者名		朝日電気工業（株）										受注者名		大宗土建（株）										受注者名		大宗土建（株）										受注者名		奥田工業（株）									
進捗率		予定 -		実施 -		差 -						進捗率		予定 100.0		実施 100.0		差 0.0						進捗率		予定 -		実施 100.0		差 -				進捗率		予定 98.8		実施 98.8		差 0.0							
今月作業		-										今月作業		路盤整正、後片付け、2月29日完成検査										今月作業		-										今月作業		舗装工（アスファルト舗装工）、片付け									
来月作業		-										来月作業		-										来月作業		-										来月作業		片付け、3月18日完成検査									
																																															
⑤						⑥						⑦						⑧																													
工事名		令和4年度 木曽川水系 猿沢砂防施設整備工事										工事名		令和4年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事										工事名		令和4年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事										工事名		令和5年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事									
工期		当初 R5.4.3～R6.1.31 変更 R6.3.29										工期		当初 R5.4.3～R6.2.29 変更 -										工期		当初 R5.4.28～R6.2.29 変更 -										工期		当初 R5.5.16～R6.3.15 変更 -									
受注者名		奥田工業（株）										受注者名		大宗土建（株）										受注者名		木曽土建工業（株）										受注者名		奥田工業（株）									
進捗率		予定 99.0		実施 99.8		差 0.8						進捗率		予定 100.0		実施 100.0		差 0.0						進捗率		予定 100.0		実施 100.0		差 0.0		進捗率		予定 99.1		実施 95.2		差 -3.9									
今月作業		仮設物等片付け										今月作業		2月9日完成検査										今月作業		-										今月作業		仮設工（上流掘削、大型土のう）									
来月作業		3月19日完成検査										来月作業		-										来月作業		3月7日完成検査										来月作業		仮設工（上流掘削、大型土のう）片付け、3月14日完成検査									
																																															

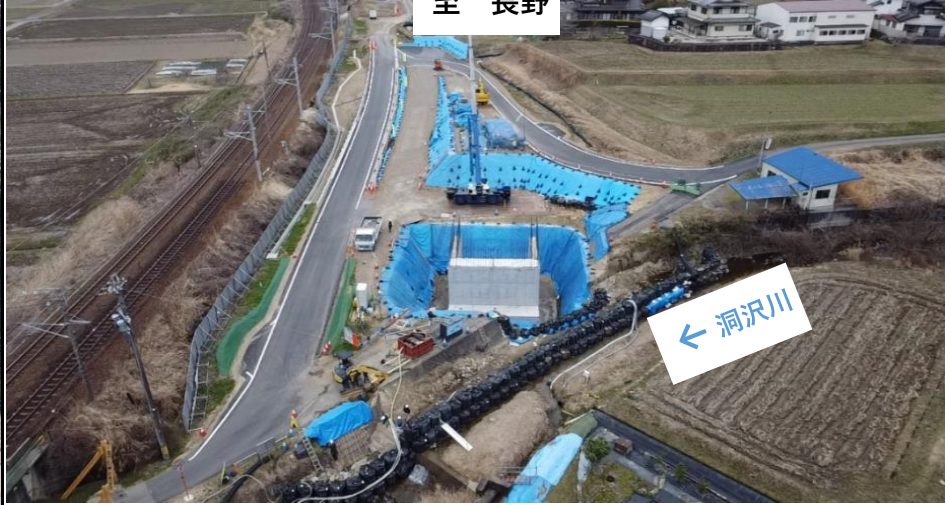
工事進捗状況（令和6年2月末）

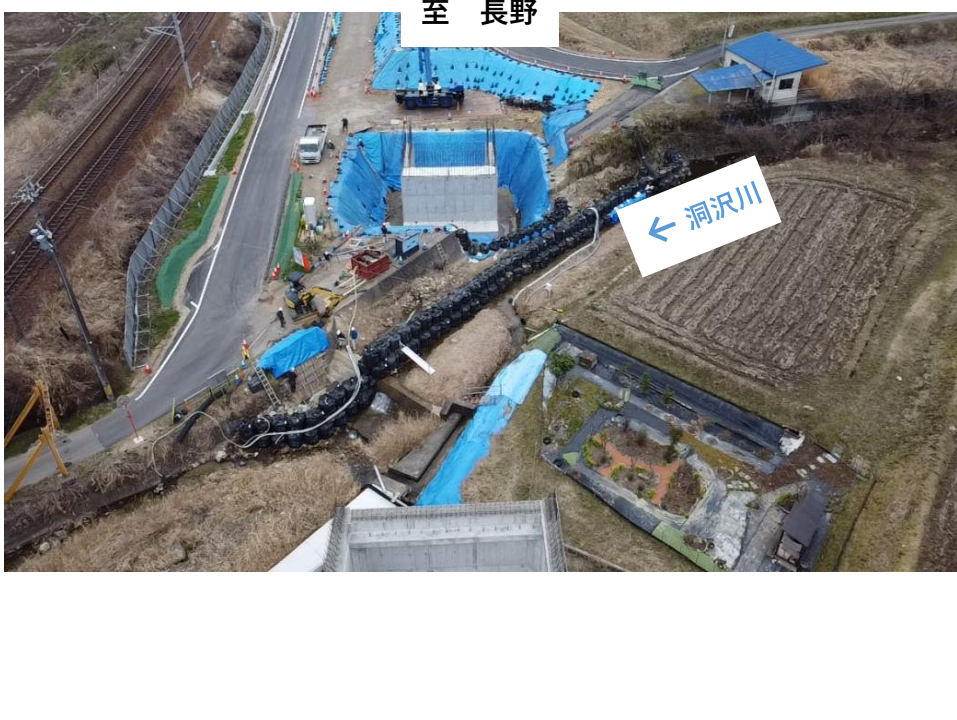
上松出張所

⑨						⑩				⑪												
工事名	令和5年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事					工事名	令和5年度 上松出張所管内整備工事				工事名	令和5年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事										
工期	当初 R5. 8. 7～R6. 3. 8 変更 R6. 3. 29					工期	当初 R5. 12. 1～R6. 11. 29 変更 -				工期	当初 R5. 12. 11～R7. 1. 31 変更										
受注者名	神稲建設（株）					受注者名	木曽土建工業（株）				受注者名	奥田工業(株)										
進捗率	予定	94.8	実施	97.0	差	2.2	進捗率	予定	-	実施	11.2	差	-	進捗率	予定	6.6	実施	4.2	差	-2.4		
今月作業	土工・後片付け					今月作業	滑川法面復旧：対策工法検討、2月29日既済部分検査				今月作業	仮設工、砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工										
来月作業	3月27日完成検査予定					来月作業	神戸沢自営柱支障木撤去作業計画				来月作業	砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工、3月27日既済部分検査予定										
																						

工事進捗状況（令和6年 2 月末）

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和 3 年度 瑞浪恵那道路 中切道路建設工 完成	工事名	令和 3 年度 瑞浪恵那道路 中畑道路建設工 完成	工事名	令和 4 年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和 4 年度 瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事
工期	当初 R4. 3. 31～R5. 3. 24 変更 R5. 8. 30	工期	当初 R4. 4. 1～R5. 2. 28 変更 R5. 11. 15	工期	当初 R4. 9. 9～R6. 2. 29 変更 R6. 6. 28	工期	当初 R4. 10. 3～R6. 2. 29 変更 R6. 5. 28
受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 吉川組
今月作業		今月作業		今月作業	道路土工、排水構造物工、舗装工、仮設工	今月作業	道路土工、橋台工
来月作業		来月作業		来月作業	道路土工、排水構造物工、舗装工、仮設工	来月作業	道路土工、排水構造物工、法覆護岸工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和 4 年度 瑞浪恵那道路 上切道路建設工事	工事名	令和 4 年度 瑞浪恵那道路 名滝地区下部工事	工事名	令和 4 年度 瑞浪恵那道路 名滝地区道路建設工事	工事名	令和 4 年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事
工期	当初 R5. 1. 16～R6. 2. 29 変更 R6. 6. 28	工期	当初 R5. 4. 14～R5. 9. 29 変更 ～R6. 3. 22	工期	当初 R5. 4. 28～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R4. 12. 6～R6. 2. 29 変更 R6. 6. 28
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株) 鳴海組	受注者名	(株) 吉川工務店
今月作業	重力式擁壁・6号函渠工	今月作業	橋台工・法尻排水工・放流工・片付け	今月作業	排水構造物工	今月作業	カルバート工
来月作業	舗装工・6号函渠工	来月作業		来月作業		来月作業	カルバート工、石・ブロック積工、仮設工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪4号橋鋼上部	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 恵那地区道路建設工事
工期	当初 R4. 9. 9～R6. 2. 29 変更	工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 3. 16～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 7. 7～R6. 1. 31 変更 R5. 7. 7～R6. 3. 29
受注者名	宇野重工（株）	受注者名	瀧上工業（株）	受注者名	（株）北都鉄工	受注者名	恵中建設（株）
今月作業		今月作業	工場製作	今月作業	工場製作	今月作業	地盤改良工・片付け
来月作業		来月作業	工場製作	来月作業	工場製作	来月作業	
							
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区道路建設工事	工事名		工事名		工事名	
工期	当初 R5. 9. 1～R7. 2. 28 変更	工期		工期		工期	
受注者名	（株）中島工務店	受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業	準備工、橋台工、法覆護岸工	今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	準備工、橋台工、法覆護岸工	来月作業		来月作業		来月作業	
		写真		写真		写真	

工事進捗状況（令和5年2月末）

瑞浪国道維持出張所

① 完		②		③ 完		④ 完	
工事名	令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和4年度 多治見国道標識工事
工期	当初 R2. 10. 30～R5. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 10. 1～R6. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 4. 30～R4. 12. 16 変更 R5. 6. 30	工期	当初 R4. 4. 30～R5. 2. 28 変更 R5. 5. 31
受注者名	日本ハイウェイサービス（株）	受注者名	（有）木曽ハイウェーサービス	受注者名	（株）加藤工務店	受注者名	（株）キクテック
今月作業		今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	来月作業		来月作業	
							
⑤ 完		⑥ 完		⑦ 完		⑧ 完	
工事名	令和4年度 多治見国道電気通信設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道防災工事	工事名	令和4年度 多治見国道橋梁補修工事	工事名	令和4年度 多治見国道21号中地区垂炭坑充填工事
工期	当初 R4. 8. 2～R5. 2. 28 変更 R5. 8. 18	工期	当初 R5. 3. 1～R6. 2. 28 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R5. 3. 13～R6. 1. 31 変更 R5. 11. 29	工期	当初 R5. 3. 30～R6. 2. 28 変更
受注者名	エフコム（株）	受注者名	（株）加藤工務店	受注者名	（株）梅田組	受注者名	徳倉建設（株）
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
							

⑨		⑩		⑪		①	
工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和4年度 多治見国道照明設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道瑞浪維持管内整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事
工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 28 変更 R6. 6. 28	工期	当初 R5. 4. 20～R6. 2. 29 変更	工期	当初 R5. 4. 24～R6. 1. 31 変更 R6. 2. 28	工期	当初 R5. 10. 1～R7. 10. 31 変更
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 関電工事	受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	日本ハイウェイサービス(株)
今月作業	抑制期間(残土処理工)	今月作業	照明設備工	今月作業	地下横断歩道補修工、舗装工、区画線工	今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他
来月作業	地山補強土工(ルートパイル)	来月作業	道路照明設備工	来月作業	準備工	来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他
							
⑫		⑬		⑭		⑮	
工事名	令和5年度 多治見国道西部除雪作業工事	工事名	令和5年度 多治見国道東部除雪作業工事	工事名	令和5年度 多治見国道橋梁補修工事	工事名	令和5年度 多治見国道交通事故対策工事
工期	当初 R5. 11. 15～R6. 3. 31 変更	工期	当初 R5. 11. 10～R6. 3. 31 変更	工期	当初 R5. 12. 11～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 2. 1～R6. 9. 30 変更
受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	(株) 鳴海組	受注者名	(株) 梅田組	受注者名	セントラル建設(株)
今月作業		今月作業		今月作業	多治見地区 橋梁付属物工 橋梁補修工 仮設工	今月作業	準備工
来月作業		来月作業		来月作業	多治見地区 舗装工 橋梁付属物工 仮設工	来月作業	準備工
						写真	
