



工事進捗状況 (令和6年3月末)

中津川出張所

①					②					③					④																													
工事名	令和4年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事									工事名	令和4年度 木曽川水系和田沢砂防堰堤工事									工事名	令和5年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事									工事名	令和5年度 木曽川水系荒道谷砂防堰堤改築工事													
工期	当初 R5.4.17～R6.2.29 変更 R5.4.17～R6.3.29									工期	当初 R5.4.28～R6.2.29 変更 R5.4.28～R6.3.29									工期	当初 R5.7.26～R6.3.13 変更									工期	当初 R5.8.1～R6.3.8 変更													
受注者名	(株)鳴海組									受注者名	(株)加藤工務店									受注者名	(株)中島工務店									受注者名	(株)鳴海組													
受注金額	当初	126,500,000			変更	109,813,000				受注金額	当初	137,500,000			変更	169,840,000				受注金額	当初	146,850,000			変更	136,917,000				受注金額	当初	150,700,000			変更	177,474,000								
進捗率	予定	100.0			実施	100.0				差	0				進捗率	予定	100.0			実施	100.0				差	0.0				進捗率	予定	100.0			実施	100.0				差	0.0			
今月作業	コンクリート堰堤床掘り、仮設砂防吹付、鉄筋挿入、後片付け、完成検査(3月29日)									今月作業	コンクリート堰堤本体(E7・D73/3)、盛土工、後片付け、完成検査(3月28日)									今月作業	作業土工(埋戻し)、後片付け、完成検査(3月22日)									今月作業	完成検査(3月6日)													
来月作業	—									来月作業	—									来月作業	—									来月作業														
	完										完										完										完													

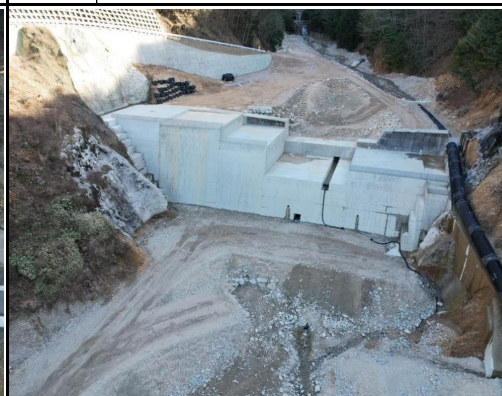

⑤					⑥					⑦										
工事名	令和5年度 木曽川水系中津川管内施設改築工事				工事名	令和5年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事				工事名	令和5年度 中津川出張所管内整備工事				工事名					
工期	当初 R5.8.1～R6.3.8 変更 R5.8.1～R6.7.31				工期	当初 R5.9.25～R6.3.13 変更 R5.9.25～R6.6.25				工期	当初 R5.12.1～R6.11.29 変更				工期					
受注者名	(株)中島工務店				受注者名	(株)吉川工務店				受注者名	(株)鳴海組				受注者名					
受注金額	当初	134,750,000		変更	138,424,000		受注金額	当初	129,800,000		変更			受注金額	当初	97,900,000		変更		
進捗率	予定	45.8		実施	44.6		差	-1.2		進捗率	予定	26.8		実施	25.3		差	-1.5		
今月作業	川上:工事用道路撤去 正ヶ根:伐採・集積・盛土				今月作業	準備工、道路土工(掘削・盛土・法面整形)				今月作業	中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、冷川排水路整備、大玉石採取 等				今月作業					
来月作業	川上:残土搬出・片付け 正ヶ根:工事用道路切・盛土				来月作業	準備工、落石雪害防止工、碎石舗装工 等				来月作業	中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、冷川排水路整備、和田沢砂防堰堤周辺整備 等				来月作業					

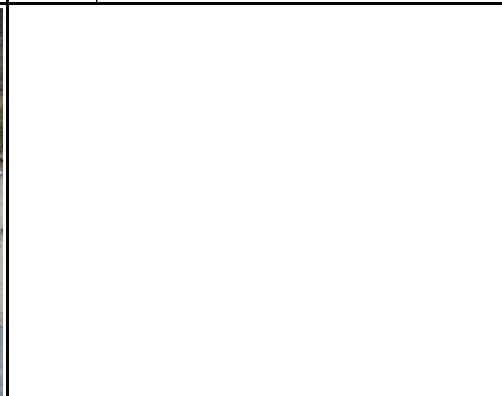

工事進捗状況（令和6年3月末）

妻木出張所

①				②				③				④			
工事名	令和5年度 妻木出張所管内整備工事			工事名				工事名				工事名			
工期	当初 R5.12.11～R6.11.29 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名	(株) 藤本組			受注者名				受注者名				受注者名			
進捗率	予定	－	実施 19.9 差 －	進捗率	予定	0	実施 0 差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0
今月作業	指示 1【生田川整備】、指示 2【梅平護岸整備】、指示3【鍛冶ヶ入管理用道路整備】			今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業	指示 2【梅平護岸整備】、指示3【鍛冶ヶ入管理用道路整備】			来月作業				来月作業				来月作業			
   指示 3：鍛冶ヶ入川管理用道路整備															
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名				工事名				工事名				工事名			
工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名			
進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			


工事進捗状況 (令和6年3月末)

上松出張所

①										②										③										④																																																																																	
工事名		令和5年度 上松出張所管内整備工事																		工事名		令和5年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事																		工事名		令和5年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事																		工事名		令和5年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事																																																	
工期		当初 R5.12.1～R6.11.29 変更 -																		工期		当初 R5.12.11～R7.1.31 変更																		工期		当初 R6.3.13～R7.2.28 変更																		工期		当初 R6.3.14～R7.2.28 変更																																																	
受注者名		木曽土建工業(株)																		受注者名		奥田工業(株)																		受注者名		大宗土建(株)																		受注者名		木曽土建工業(株)																																																	
受注金額		当初 100,100,000 変更 100,100,000																		受注金額		当初 172,700,000 変更																		受注金額		当初 166,980,000 変更																		受注金額		当初 75,240,000 変更																																																	
進捗率		予定 - 実施 14.8 差 -																		進捗率		予定 14.0 実施 12.6 差 -1.4																		進捗率		予定 0.3 実施 0.3 差 0.0																		進捗率		予定 0.5 実施 0.5 差 0.0																																																	
今月作業		滑川法面復旧：対策工法検討																		今月作業		砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工																		今月作業		準備工																		今月作業		準備工																																																	
来月作業		板橋沢沿線道路整備・神戸沢電線支障木除去整備																		来月作業		コンクリート堰堤工																		来月作業		準備工・構造物撤去工・工事用道路工																		来月作業		準備工 仮設工 構造物撤去工																																																	
懸案事項等		無し																		懸案事項等		無し																		懸案事項等		無し																		懸案事項等		無し																																																	
																																																																																																															
⑤																												⑥																												⑦																												⑧																											
工事名		令和5年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事																										工事名																												工事名																												工事名																											
工期		当初 R6.4.1～R7.2.28 変更																										工期		当初 変更																										工期		当初 変更																										工期		当初 変更																									
受注者名		大宗土建(株)																										受注者名																												受注者名																												受注者名																											
受注金額		当初 173,580,000 変更																										受注金額		当初 変更																										受注金額		当初 変更																										受注金額		当初 変更																									
進捗率		予定 0.0 実施 0.0 差 0.0																										進捗率		予定 実施 差 0.0																										進捗率		予定 実施 差 0.0																										進捗率		予定 実施 差 0.0																									
今月作業		-																										今月作業																												今月作業																												今月作業																											
来月作業		施工計画、準備工																										来月作業																												来月作業																												来月作業																											
懸案事項等		管理用道路法面工の施工時期等について																										懸案事項等																												懸案事項等																												懸案事項等																											
																																																																																																															

工事進捗状況 (令和6年 3月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

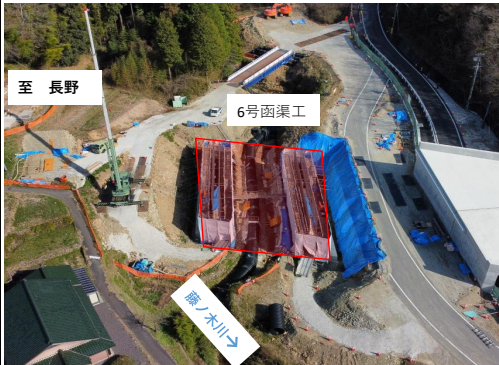①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 名滝地区下部工事
工期	当初 R4.9.9～R6.2.29 変更 R6.6.28	工期	当初 R4.10.3～R6.2.29 変更 R6.5.31	工期	当初 R5.1.16～R6.2.29 変更 R6.6.28	工期	当初 R5.4.14～R5.9.29 変更 R6.3.22
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)吉川組	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)
今月作業	道路土工、舗装工、仮設工	今月作業	道路土工、橋台工、仮設工	今月作業	6号函渠工・舗装工	今月作業	
来月作業	舗装工、仮設工	来月作業	道路土工、排水構造物工、橋台工	来月作業	6号函渠工・排水工・ブロック積	来月作業	
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 名滝道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪4号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事
工期	当初 R5.4.28～R6.2.29 変更 R6.3.29	工期	当初 R4.12.6～R6.2.29 変更 R6.6.28	工期	当初 R4.9.9～R6.2.29 変更	工期	当初 R4.9.27～R7.2.28 変更
受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	宇野重工(株)	受注者名	瀬上工業(株)
今月作業		今月作業	カルバート工	今月作業		今月作業	工場製作
来月作業		来月作業	カルバート工、石・ブロック積工、仮設工	来月作業		来月作業	工場製作
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 恵那道路建設工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区下部工事	工事名	
工期	当初 R5.3.16～R7.2.28 変更	工期	当初 R5.7.7～R6.1.31 変更 R6.3.29	工期	当初 R5.9.1～R7.2.28 変更 R7.3.28	工期	
受注者名	(株)北都鉄工	受注者名	恵中建設(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	
今月作業	工場製作	今月作業		今月作業	準備工、橋台工、法覆護岸工	今月作業	
来月作業	工場製作	来月作業		来月作業	準備工、法覆護岸工、カルバート工、仮設工	来月作業	
						写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況（令和6年3月末）

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道橋梁補修工事
工期	当初 R5. 10. 1～R7. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 10. 1～R6. 10. 31 変更	工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 28 変更 R6. 6. 28	工期	当初 R5. 12. 11～R7. 2. 28 変更
受注者名	日本ハイウェイサービス（株）	受注者名	（有）木曾ハイウェーサービス	受注者名	（株）加藤工務店	受注者名	（株）梅田組
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類）舗装修繕工	今月作業	地山補強土工6号（ルートパイル）	今月作業	多治見地区 橋梁付属物工 橋梁補修工 仮設工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類）舗装修繕工	来月作業	地山補強土工6号（ルートパイル）	来月作業	多治見地区 舗装工 橋梁付属物工 仮設工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名	令和5年度 多治見国道管内整備工事				
工期	当初 R6. 2. 1～R6. 9. 30 変更	工期	当初 R6. 3. 14～R7. 2. 28 変更				
受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	セントラル建設㈱				
今月作業	準備工	今月作業	準備工				
来月作業	準備工	来月作業	準備工				
				写真		写真	
