

工事進捗状況 (令和6年5月末)

中津川出張所

①				②				③				④			
工事名 令和5年度 木曽川水系中津川管内施設改築工事 工期 当初 R5. 8. 1～R6. 3. 8 変更 R5. 8. 1～R6. 7. 31 受注者名 (株)中島工務店 受注金額 当初 134,750,000 変更 138,424,000 進捗率 予定 89.7 実施 92.0 差 2.3 今月作業 伐採木撤出、切・盛土、大型土のう設置、巨石積 来月作業 植生マット、工事用道路仕上げ、片付け				工事名 令和5年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事 工期 当初 R5. 9. 25～R6. 3. 13 変更 R5. 9. 25～R6. 10. 31 受注者名 (株)吉川工務店 受注金額 当初 129,800,000 変更 進捗率 予定 47.9 実施 45.8 差 -2.1 今月作業 落石雪害防止工、排水構造物工、立木調査 等 来月作業 排水構造物工、砕石舗装工、伐採 等				工事名 令和5年度 中津川出張所管内整備工事 工期 当初 R5. 12. 1～R6. 11. 29 変更 受注者名 (株)鳴海組 受注金額 当初 97,900,000 変更 進捗率 予定 ー 実施 41.4 差 ー 今月作業 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、砂防教室補助、四ツ目川遊砂工整備 来月作業 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、砂防教室補助、和田沢砂防堰堤周辺整備 等				工事名 令和5年度 木曽川水系地獄谷除石工事 工期 当初 R6. 4. 8～R7. 2. 28 変更 受注者名 (株)吉川工務店 受注金額 当初 155,100,000 変更 進捗率 予定 12.0 実施 8.0 差 -4.0 今月作業 重力式擁壁、仮締切、護岸床堀、排水工、ヤード整備 来月作業 流路護岸工、コンクリート舗装養生			
⑤				⑥											
工事名 令和5年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事 工期 当初 R6. 4. 11～R7. 2. 28 変更 受注者名 (株)鳴海組 受注金額 当初 181,500,000 変更 進捗率 予定 6.1 実施 4.7 差 -1.4 今月作業 重機足場盛土、切土、法枠工 来月作業 法枠工、鉄筋挿入工、掘削				工事名 令和6年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事 工期 当初 R6. 7. 5～R7. 3. 14 変更 受注者名 (株)鳴海組 受注金額 当初 93,500,000 変更 進捗率 予定 ー 実施 ー 差 ー 今月作業 ー 来月作業 ー											

工事進捗状況（令和6年5月末）

妻木出張所

①				②				③				④			
工事名	令和5年度 妻木出張所管内整備工事			工事名	令和6年度 庄内川水系寺下第3砂防堰堤改築工事			工事名				工事名			
工期	当初 R5.12.11～R6.11.29 変更			工期	当初 R6.5.7～R7.2.28 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名			
進捗率	予定	—	実施 41.8	差 —	進捗率	予定 0	実施 0	差 0	進捗率	予定	—	実施	—	差 0	
今月作業	指示2【梅平護岸整備】、指示3【鍛冶ヶ入管理用道路整備】			今月作業	準備工			今月作業				今月作業			
来月作業	指示6【深山谷砂防堰堤施設整備】、指示7【一の洞第2砂防堰堤施設整備】			来月作業	構造物取壊し工			来月作業				来月作業			
 指示2：梅平川整備  指示3：鍛冶ヶ入川管理用道路整備															
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名				工事名				工事名				工事名			
工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名			
進捗率	予定	—	実施	差 0	進捗率	予定	—	実施	差 0	進捗率	予定	—	実施	差 0	
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			

工事進捗状況 (令和6年5月末)

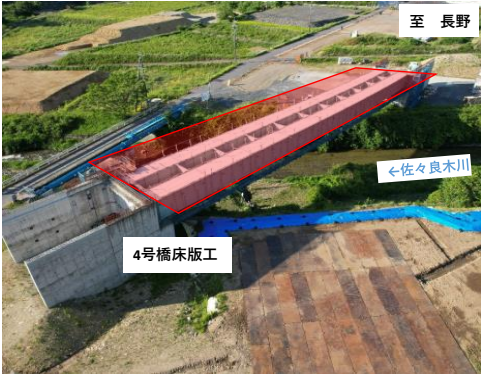
上松出張所

①										②										③										④																																																																																																																																	
工事名 令和5年度 上松出張所管内整備工事										工事名 令和5年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事										工事名 令和5年度 木曽川水系 和合蛇抜沈砂地工事										工事名 令和5年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事																																																																																																																																	
工期 当初 R5.12.1～R6.11.29 変更 -										工期 当初 R5.12.11～R7.1.31 変更										工期 当初 R6.3.13～R7.2.28 変更										工期 当初 R6.3.14～R7.2.28 変更																																																																																																																																	
受注者名 木曽土建工業(株)										受注者名 奥田工業(株)										受注者名 大宗土建(株)										受注者名 木曽土建工業(株)																																																																																																																																	
受注金額 当初 100,100,000 変更 100,100,000										受注金額 当初 172,700,000 変更										受注金額 当初 166,980,000 変更										受注金額 当初 75,240,000 変更																																																																																																																																	
進捗率 予定 - 実施 31.2 差 -										進捗率 予定 41.3 実施 41.7 差 0.4										進捗率 予定 12.9 実施 13.4 差 0.5										進捗率 予定 12.9 実施 6.4 差 -6.5																																																																																																																																	
今月作業 上松町：北股沢崩壊法面对策										今月作業 (深沢)コンクリート堰堤工、(猿沢)仮設工、強じんワイヤーネット工										今月作業 構造物撤去工・工事用道路工・残土処理工										今月作業 仮設工 構造物撤去工 コンクリート堰堤工床掘																																																																																																																																	
来月作業 上松町：北股沢崩壊法面对策・板橋沢沿線道路整備										来月作業 (深沢)コンクリート堰堤工、(猿沢)強じんワイヤーネット工										来月作業 構造物撤去工・工事用道路工・残土処理工										来月作業 コンクリート堰堤工 床掘 表面処理 型枠 打設																																																																																																																																	
																																																																																																																																																															
⑤										⑥										⑦										⑧																																																																																																																																	
工事名 令和5年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事										工事名 令和6年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事										工事名										工事名																																																																																																																																	
工期 当初 R6.4.1～R7.2.28 変更										工期 当初 R6.5.13～R7.3.18 変更										工期 当初 変更										工期 当初 変更																																																																																																																																	
受注者名 大宗土建(株)										受注者名 奥田工業(株)										受注者名										受注者名																																																																																																																																	
受注金額 当初 173,580,000 変更										受注金額 当初 144,100,000 変更										受注金額 当初 変更										受注金額 当初 変更																																																																																																																																	
進捗率 予定 2.6 実施 1.6 差 -1.0										進捗率 予定 0.1 実施 0.1 差 0.0										進捗率 予定 実施 差										進捗率 予定 実施 差																																																																																																																																	
今月作業 仮設工										今月作業 準備工										今月作業										今月作業																																																																																																																																	
来月作業 道路土工、地盤改良工										来月作業 仮設工(ヤード整備等)、作業土工										来月作業										来月作業																																																																																																																																	
																																																																																																																																																															

工事進捗状況 (令和6年 5月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事
工期	当初 R4.9.9～R6.2.29 変更 R6.6.28	工期	当初 R4.10.3～R6.2.29 変更 R6.6.28	工期	当初 R5.1.16～R6.2.29 変更 R6.6.28	工期	当初 R4.12.6～R6.2.29 変更 R6.6.28
受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 吉川工務店
今月作業	片付け	今月作業	橋台工	今月作業	6号函渠工・排水工	今月作業	仮設工、カルバート工
来月作業		来月作業		来月作業	6号函渠工・排水工・ブロック積	来月作業	カルバート工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区下部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 土岐地区道路建設工事
工期	当初 R4.9.27～R7.2.28 変更	工期	当初 R5.3.16～R7.2.28 変更	工期	当初 R5.9.1～R7.2.28 変更 R7.3.28	工期	当初 R6.4.12～R7.2.28 変更
受注者名	瀧上工業 (株)	受注者名	(株) 北都鉄工	受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 加藤工務店
今月作業	工場製作	今月作業	工場製作	今月作業	準備工、仮設工、カルバート工	今月作業	準備工
来月作業	工場製作	来月作業	工場製作	来月作業	準備工、カルバート工、畦畔工	来月作業	道路土工、カルバート工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区床版工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事	工事名		工事名	
工期	当初 R6.4.8～R7.2.28 変更	工期	当初 R6.4.15～R7.2.28 変更	工期		工期	
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	恵中建設(株)	受注者名		受注者名	
今月作業	鋼橋足場等設置工.床版工.排水構造物工.路体盛土工	今月作業	準備工	今月作業		今月作業	
来月作業	床版工.橋梁付属物工.排水構造物工.路体盛土工	来月作業	準備工、仮設工	来月作業		来月作業	
				写真		写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和6年5月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道橋梁補修工事
工期	当初 R5.10.1～R7.10.31 変更	工期	当初 R4.10.1～R6.10.31 変更	工期	当初 R5.4.3～R6.2.28 変更 R6.6.28	工期	当初 R5.12.11～R7.2.28 変更
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	㈱ 梅田組
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	今月作業	地山補強土工(キャベツゲーム工)	今月作業	中津川1地区 舗装工 橋梁付属物工 仮設工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃、舗装維持工他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	来月作業	現場片付け及び書類整理	来月作業	中津川1地区 橋梁付属物工 橋梁補修工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名	令和5年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道道路情報表示設備工事 新
工期	当初 R6.2.1～R6.9.30 変更	工期	当初 R6.3.14～R7.2.28 変更	工期	当初 R6.5.7～R7.2.28 変更	工期	当初 R6.5.24～R7.2.28 変更
受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	エフコム(株)
今月作業	防護柵工 道路付属施設工	今月作業	瑞浪土岐地区 法面工	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	防護柵工 道路付属施設工	来月作業	瑞浪土岐地区 法面工	来月作業	準備工	来月作業	
				写真		写真	

