

工事進捗状況 (令和6年6月末)

中津川出張所

①				②				③				④			
工事名 令和5年度 木曽川水系中津川管内施設改築工事				工事名 令和5年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事				工事名 令和5年度 中津川出張所管内整備工事				工事名 令和5年度 木曽川水系地獄谷除石工事			
工期 当初 R5.8.1～R6.3.8 変更 R5.8.1～R6.7.31				工期 当初 R5.9.25～R6.3.13 変更 R5.9.25～R6.10.1				工期 当初 R5.12.1～R6.11.29 変更				工期 当初 R6.4.8～R7.2.28 変更			
受注者名 (株)中島工務店				受注者名 (株)吉川工務店				受注者名 (株)鳴海組				受注者名 (株)吉川工務店			
受注金額 当初 134,750,000 変更 138,424,000				受注金額 当初 129,800,000 変更				受注金額 当初 97,900,000 変更				受注金額 当初 155,100,000 変更			
進捗率 予定 95.0 実施 99.0 差 4.0				進捗率 予定 51.8 実施 50.4 差 -1.4				進捗率 予定 - 実施 47.5 差 -				進捗率 予定 25.8 実施 27.2 差 1.4			
今月作業 植生マット、工事用道路仕上げ、片付け				今月作業 法面工、落石雪害防止工、排水構造物工、伐採				今月作業 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、砂防教室補助、四ツ目川遊砂工整備				今月作業 流路護岸工、コンクリート舗装養生			
来月作業 -				来月作業 道路土工(掘削、盛土)、砕石舗装工、構造物撤去工 等				来月作業 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、和田沢砂防堰堤周辺整備、荒道管理用道路整備				来月作業 流路護岸工、砂防土工準備工 掘削・運搬			
															
⑤				⑥								遠隔操縦という安全の導入！ ロボQS® 簡易遠隔操縦装置 -Tele operated robot for backhoe (RoboQS)-  【特許第6646190号】 2017 全日本建設技術協会 全建賞受賞 2019 日本ロボット学会 実用化技術賞受賞 IHI Realize your dreams			
工事名 令和5年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事				工事名 令和6年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事				工事名							
工期 当初 R6.4.11～R7.2.28 変更				工期 当初 R6.7.5～R7.3.14 変更				工期							
受注者名 (株)鳴海組				受注者名 (株)鳴海組				受注者名							
受注金額 当初 181,500,000 変更				受注金額 当初 93,500,000 変更				受注金額							
進捗率 予定 13.3 実施 12.5 差 -0.8				進捗率 予定 実施 差				進捗率							
今月作業 法枠工、鉄筋挿入工 (2段目)				今月作業 -				今月作業							
来月作業 2段目法枠工、鉄筋挿入工 3段目掘削・搬出				来月作業 -				来月作業							
				工事着手前											

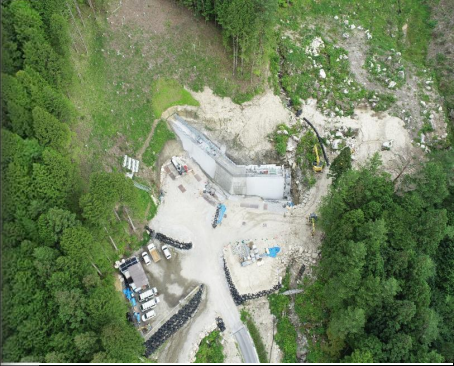
工事進捗状況（令和6年6月末）

妻木出張所

①				②				③				④			
工事名	令和5年度 妻木出張所管内整備工事			工事名	令和6年度 庄内川水系寺下第3砂防堰堤改築工事			工事名	令和6年度 庄内川水系寺下第3砂防堰堤改築工事			工事名			
工期	当初 R5.12.11～R6.11.29 変更			工期	当初 R6.5.7～R7.2.28 変更			工期	当初 R6.6.17～R7.3.14 変更			工期	当初 変更		
受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名			
進捗率	予定	—	実施 55.2 差 —	進捗率	予定 2.8 実施 0 差 -2.8			進捗率	予定 0 実施 0 差 0			進捗率	予定 実施 差 0		
今月作業	指示5【砂防教室補助業務】、指示6【深山谷第一砂防堰堤施設整備】 指示7【一の洞第2砂防堰堤施設整備】			今月作業	準備工			今月作業	準備工			今月作業			
来月作業	指示4【応急作業整備】、指示5【砂防教室補助業務】			来月作業	構造物取壊し工			来月作業	仮設工			来月作業			
指示5：砂防教室補助業務  指示7：一の洞第砂防堰堤施設整備  指示6：深山谷第一砂防堰堤施設整備															
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名				工事名				工事名				工事名			
工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名			
進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			

工事進捗状況 (令和6年6月末)

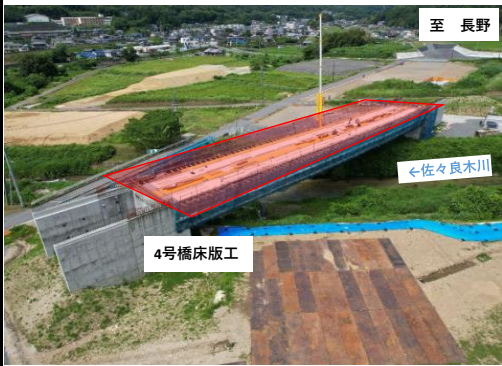
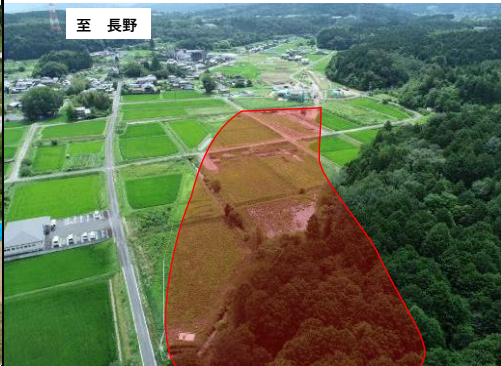
上松出張所

①										②										③										④									
工事名 令和5年度 上松出張所管内整備工事										工事名 令和5年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事										工事名 令和5年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事										工事名 令和5年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事									
工期 当初 R5.12.1～R6.11.29 変更										工期 当初 R5.12.11～R7.1.31 変更										工期 当初 R6.3.13～R7.2.28 変更										工期 当初 R6.3.14～R7.2.28 変更									
受注者名 木曾土建工業(株)										受注者名 奥田工業(株)										受注者名 大宗土建(株)										受注者名 木曾土建工業(株)									
受注金額 当初 100,100,000 変更 100,100,000										受注金額 当初 172,700,000 変更										受注金額 当初 166,980,000 変更 169,499,000										受注金額 当初 75,240,000 変更 76,725,000									
進捗率 予定 ー 実施 55.9 差 ー										進捗率 予定 53.5 実施 59.4 差 5.9										進捗率 予定 21.7 実施 22.2 差 0.5										進捗率 予定 25.3 実施 21.5 差 -3.8									
今月作業 上松町：北股沢崩壊法面対策										今月作業 (深沢)コンクリート堰堤工、(猿沢)強じんワイヤーネット工										今月作業 構造物撤去工・工事用道路工・残土処理工										今月作業 コンクリート堰堤工 床掘 表面処理 型枠 打設									
来月作業 上松町：北股沢崩壊法面対策・板橋沢沿線道路整備										来月作業 (深沢)コンクリート堰堤工、(猿沢)強じんワイヤーネット工、仮設工										来月作業 工事用道路工・残土処理工・法面工・コンクリート堰堤工										来月作業 コンクリート堰堤工 型枠 打設 埋戻									
																																							
⑤										⑥										⑦										⑧									
工事名 令和5年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事										工事名 令和6年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事										工事名										工事名									
工期 当初 R6.4.1～R7.2.28 変更										工期 当初 R6.5.13～R7.3.18 変更										工期 当初 変更										工期 当初 変更									
受注者名 大宗土建(株)										受注者名 奥田工業(株)										受注者名										受注者名									
受注金額 当初 173,580,000 変更 176,198,000										受注金額 当初 144,100,000 変更										受注金額 当初 変更										受注金額 当初 変更									
進捗率 予定 8.4 実施 2.3 差 -6.1										進捗率 予定 0.3 実施 0.3 差 0.0										進捗率 予定 実施 差										進捗率 予定 実施 差									
今月作業 地盤改良工、舗装工										今月作業 準備工										今月作業										今月作業									
来月作業 舗装工、コンクリート堰堤工(床掘)										来月作業 仮設工(ヤード整備)、作業土工、構造物撤去工										来月作業										来月作業									
																																							

工事進捗状況 (令和6年 6月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 芝原地区下部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事
工期	当初 R4. 9. 9～R6. 2. 29 変更 R6. 6. 28	工期	当初 R4. 10. 3～R6. 2. 29 変更 R6. 6. 28	工期	当初 R5. 1. 16～R6. 2. 29 変更 R6. 10. 31	工期	当初 R4. 12. 6～R6. 2. 29 変更 R6. 12. 27
受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 吉川工務店
今月作業		今月作業	橋台工	今月作業	6号函渠工・排水工	今月作業	カルバート工
来月作業		来月作業		来月作業	6号函渠工・道路土工	来月作業	カルバート工、仮設工
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区下部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 土岐地区道路建設工事
工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 3. 16～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 9. 1～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 28	工期	当初 R6. 4. 12～R7. 2. 28 変更
受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株) 北都鉄工	受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 加藤工務店
今月作業	工場製作	今月作業	工場製作	今月作業	準備工、カルバート工、畦畔工	今月作業	道路土工、カルバート工
来月作業	工場製作	来月作業	工場製作	来月作業	準備工、カルバート工、排水構造物工	来月作業	道路土工、カルバート工、仮設工

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区床版工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事	工事名		工事名	
工期	当初 R6. 4. 8～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 4. 15～R7. 2. 28 変更	工期		工期	
受注者名	(株) 吉川工務店	受注者名	恵中建設㈱	受注者名		受注者名	
今月作業	床版工. 排水構造物工. 路体盛土工	今月作業	準備工	今月作業		今月作業	
来月作業	床版工. 橋梁付属物工. 排水構造物工. 路体盛土工	来月作業	伐採工、道路土工、排水構造物工	来月作業		来月作業	
				写真		写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和6年6月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道橋梁補修工事
工期	当初 R5.10.1~R7.10.31 変更	工期	当初 R4.10.1~R6.10.31 変更	工期	当初 R5.4.3~R6.2.28 変更 R6.7.31	工期	当初 R5.12.11~R7.2.28 変更
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	㈱ 梅田組
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	今月作業	地山補強土工(ルートバイル)	今月作業	中津川1地区 橋梁付属物工 橋梁補修工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃、舗装維持工他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	来月作業	準備工	来月作業	土岐地区・中津川1地区 橋梁補修工、中津川2地区 仮設工
							
		損傷復旧工 86.470k 以下					
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名	令和5年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道道路情報表示設備工事
工期	当初 R6.2.1~R6.9.30 変更	工期	当初 R6.3.14~R7.2.28 変更	工期	当初 R6.5.7~R7.2.28 変更	工期	当初 R6.5.24~R7.2.28 変更
受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	エフコム(株)
今月作業	防護柵工 道路付属施設工	今月作業	瑞浪土岐地区：法面工	今月作業	準備工	今月作業	道路情報表示板 現地調査
来月作業	防護柵工 道路付属施設工 舗装工	来月作業	瑞浪土岐地区：法面工 多治見(3)地区：道路土工	来月作業	準備工	来月作業	道路情報表示板 現地調査 機器製作工
							

⑨		⑩		⑪		①	
工事名	令和6年度 多治見国道御嵩地区垂炭坑充填工事						
工期	当初 R6. 6. 17～R7. 1. 31 変更						
受注者名	徳倉建設(株)						
今月作業	準備工						
来月作業	準備工						
		写真		写真		写真	
⑫		⑬		⑭		⑮	
写真		写真		写真		写真	
