

工事進捗状況 (令和6年7月末)

中津川出張所

①					②					③					④											
工事名	令和5年度 木曽川水系中津川管内施設改築工事				工事名	令和5年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事				工事名	令和5年度 中津川出張所管内整備工事				工事名	令和5年度 木曽川水系地獄谷除石工事										
工期	当初 R5.8.1～R6.3.8 変更 R5.8.1～R6.7.31				工期	当初 R5.9.25～R6.3.13 変更 R5.9.25～R6.10.3				工期	当初 R5.12.1～R6.11.29 変更				工期	当初 R6.4.8～R7.2.28 変更										
受注者名	(株)中島工務店				受注者名	(株)吉川工務店				受注者名	(株)鳴海組				受注者名	(株)吉川工務店										
受注金額	当初	134,750,000		変更	147,103,000				受注金額	当初	129,800,000		変更			受注金額	当初	155,100,000		変更	159,808,000					
進捗率	予定	100.0		実施	100.0		差	0.0	進捗率	予定	58.8		実施	54.9		差	-3.9	進捗率	予定	—		実施	57.9		差	—
今月作業	工事用道路仕上げ、片付け				今月作業	道路土工(法面整形)、法面工、構造物撤去工				今月作業	中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、四ツ目川遊砂工整備、恵那山林道整備				今月作業	流路護岸工、砂防土工準備工 掘削・運搬										
来月作業	-				来月作業	道路土工(法面整形)、法面工、残土処理工 等				来月作業	中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、和田沢砂防堰堤周辺整備 等				来月作業	流路護岸工、砂防土工 掘削・運搬										
																										
⑤					⑥																					
工事名	令和5年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事				工事名	令和6年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事				工事名					工事名											
工期	当初 R6.4.11～R7.2.28 変更				工期	当初 R6.7.5～R7.3.14 変更				工期					工期											
受注者名	(株)鳴海組				受注者名	(株)鳴海組				受注者名					受注者名											
受注金額	当初	181,500,000		変更	183,887,000				受注金額	当初	93,500,000		変更			受注金額										
進捗率	予定	25.3		実施	23.0		差	-2.3	進捗率	予定	1.4		実施	1.4		差	0.0	進捗率								
今月作業	2段目鉄筋挿入工 3段目掘削・搬出 法枠工				今月作業	準備工				今月作業					今月作業											
来月作業	3段目法枠工、副堤掘削・岩掘削・搬出				来月作業	準備工、仮設工 等				来月作業					来月作業											
					準備工																					

工事進捗状況（令和6年7月末）

妻木出張所

①				②				③				④			
工事名	令和5年度 妻木出張所管内整備工事			工事名	令和6年度 庄内川水系寺下第3砂防堰堤改築工事			工事名	令和6年度 庄内川水系寺下第3砂防堰堤改築工事			工事名			
工期	当初 R5. 12. 11～R6. 11. 29 変更			工期	当初 R6. 5. 7～R7. 2. 28 変更			工期	当初 R6. 6. 17～R7. 3. 14 変更			工期	当初 変更		
受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名			
進捗率	予定	—	実施 63.4 差 —	進捗率	予定 9.7 実施 5.1 差 -4.6			進捗率	予定 1.6 実施 1.8 差 0.2			進捗率	予定	実施	差 0
今月作業	指示4【小家洞管理用道路整備】、指示9【市之倉里山林道整備】、指示7【一の畑第2砂防堰堤地盤整備】			今月作業	構造物取壊し工			今月作業	準備工			今月作業			
来月作業	指示4【堰切第3砂防堰堤整備】、指示10【市之倉川整備】			来月作業	コンクリート堰堤工			来月作業	コンクリート堰堤工 作業土工			来月作業			
指示5：砂防教室補助業務  指示4：小麦平旧工事用道路整備  指示4：小家洞管理用道路整備  指示4：追沢川右岸整備  指示9：市之倉里山林道整備 															
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名				工事名				工事名				工事名			
工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名			
進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			

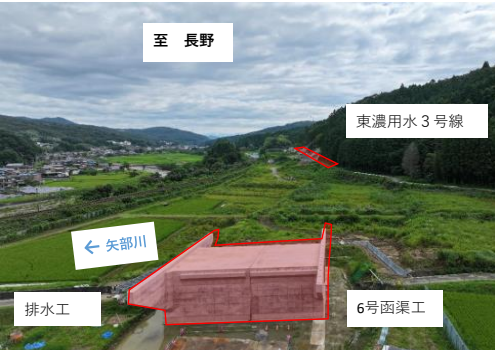
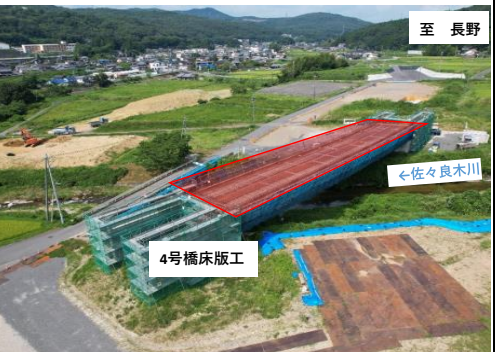
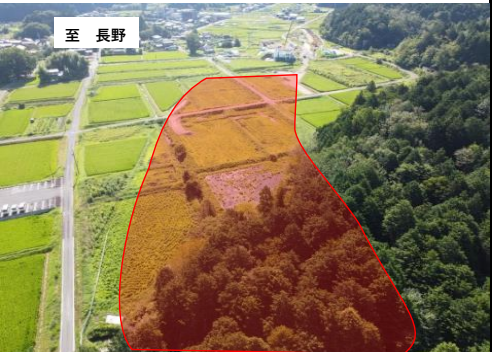
工事進捗状況 (令和6年7月末)

上松出張所

①					②					③					④					
工事名	令和5年度 上松出張所管内整備工事				工事名	令和5年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事				工事名	令和5年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事				工事名	令和5年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事				
工期	当初 R5.12.1～R6.11.29 変更				工期	当初 R5.12.11～R7.1.31 変更				工期	当初 R6.3.13～R7.2.28 変更				工期	当初 R6.3.14～R7.2.28 変更				
受注者名	木曽土建工業（株）				受注者名	奥田工業（株）				受注者名	大宗土建（株）				受注者名	木曽土建工業（株）				
受注金額	当初	100,100,000		変更	100,100,000		受注金額	当初	172,700,000		変更			受注金額	当初	75,240,000		変更	76,725,000	
進捗率	予定	—	実施	81.2	差	—	進捗率	予定	70.4	実施	73.0	差	2.6	進捗率	予定	29.3	実施	30.3	差	1.0
今月作業	上松町：北股沢崩壊法面対策				今月作業	（深沢）コンクリート堰堤工、（猿沢）強じんワイヤーネット工、仮設工				今月作業	工事用道路工・残土処理工・法面工・コンクリート堰堤工				今月作業	コンクリート堰堤工 型枠 打設 埋戻				
来月作業	上松町：北股沢崩壊法面対策・板橋沢沿線道路整備				来月作業	（深沢）コンクリート堰堤工、砂防土工				来月作業	コンクリート堰堤工・残土処理工				来月作業	コンクリート堰堤工 型枠 打設 埋戻				
																				
⑤					⑥					⑦					⑧					
工事名	令和5年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事				工事名	令和6年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事				工事名	令和6年度 木曽川水系 職沢第2砂防堰堤管理用道路工事				工事名					
工期	当初 R6.4.1～R7.2.28 変更				工期	当初 R6.5.13～R7.3.18 変更				工期	当初 R6.7.29～R7.1.31 変更				工期	当初 変更				
受注者名	大宗土建（株）				受注者名	奥田工業（株）				受注者名	大宗土建（株）				受注者名					
受注金額	当初	173,580,000		変更	176,198,000		受注金額	当初	144,100,000		変更	144,650,000		受注金額	当初			変更		
進捗率	予定	8.7	実施	8.7	差	0.0	進捗率	予定	4.6	実施	0.5	差	-4.1	進捗率	予定	0.0	実施	0.0	差	0.0
今月作業	舗装工、防護柵工、コンクリート堰堤工（床掘）				今月作業	準備工他				今月作業	工事契約。				今月作業					
来月作業	コンクリート堰堤工（床掘）、法面工、仮設工（吹付）				来月作業	仮設工（ヤード整備）、作業土工、構造物撤去工				来月作業	施工計画書、準備工				来月作業					
																				

工事進捗状況 (令和6年 7月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事
工期	当初 R5. 1. 16～R6. 2. 29 変更 R6. 10. 31	工期	当初 R4. 12. 6～R6. 2. 29 変更 R6. 12. 27	工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 3. 16～R7. 2. 28 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	瀬上工業(株)	受注者名	(株)北都鉄工
今月作業	6号函渠工・排水工	今月作業	カルバート工	今月作業	工場製作	今月作業	工場製作
来月作業	道路土工・重力式擁壁工・ブロック積工	来月作業	カルバート工、仮設工	来月作業	工場製作	来月作業	準備工、仮設工(ヤード整備・敷鉄板設置)、ペント組立
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区下部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 土岐地区道路建設工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区床版工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事
工期	当初 R5. 9. 1～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 28	工期	当初 R6. 4. 12～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 4. 8～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 4. 15～R7. 2. 28 変更
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	恵中建設㈱
今月作業	準備工、カルバート工、畦畔工	今月作業	道路土工、カルバート工、仮設工	今月作業	床版工、排水構造物工、路体盛土工	今月作業	準備工
来月作業	準備工、カルバート工	来月作業	道路土工、カルバート工、仮設工	来月作業	床版工、橋梁付属物工、排水構造物工、路体盛土工	来月作業	道路土工、排水構造物工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区整備工事	工事名		工事名		工事名	
工期	当初 R6. 7. 31～R7. 3. 31 変更	工期	当初 変更	工期		工期	
受注者名	(株) 鳴海組	受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業	準備	今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	準備	来月作業		来月作業		来月作業	
		写真		写真		写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和6年7月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事 完	工事名	令和5年度 多治見国道橋梁補修工事
工期	当初 R5. 10. 1～R7. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 10. 1～R6. 10. 31 変更	工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 28 変更 R6. 6. 28	工期	当初 R5. 12. 11～R7. 2. 28 変更
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有) 木曾ハイウェーサービス	受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	㈱ 梅田組
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	今月作業	完成	今月作業	土岐地区・中津川1地区 橋梁補修工、中津川2地区 仮設工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	来月作業		来月作業	中津川(2)地区 支取代替工、中津川(3)地区 橋梁補修工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名	令和5年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道道路情報表示設備工事
工期	当初 R6. 2. 1～R6. 9. 30 変更	工期	当初 R6. 3. 14～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 5. 7～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 5. 24～R7. 2. 28 変更
受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	エフコム(株)
今月作業	準備工・防護柵工	今月作業	瑞浪土岐地区：法面工 多治見(3)地区：道路土工	今月作業	準備工	今月作業	道路情報表示板 現地調査
来月作業	準備工・防護柵工・構造物撤去工	来月作業	瑞浪土岐地区：法面工 多治見(3)地区：防止柵工	来月作業	準備工	来月作業	道路情報表示板 現地調査
							

⑨		⑩		⑪		①	
工事名	令和6年度 多治見国道御嵩地区亜炭坑充填工事						
工期	当初 R6.6.17～R7.1.31 変更						
受注者名	徳倉建設（株）						
今月作業	準備工						
来月作業	準備工						
		写真		写真		写真	
⑫		⑬		⑭		⑮	
写真		写真		写真		写真	
