

工事進捗状況 (令和6年8月末)

中津川出張所

①				②				③				④									
工事名	令和5年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事			工事名	令和5年度 中津川出張所管内整備工事			工事名	令和5年度 木曽川水系地獄谷除石工事			工事名	令和5年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事								
工期	当初 R5.9.25～R6.3.13 変更 R5.9.25～R6.10.13			工期	当初 R5.12.1～R6.11.29 変更			工期	当初 R6.4.8～R7.2.28 変更			工期	当初 R6.4.11～R7.2.28 変更								
受注者名	(株)吉川工務店			受注者名	(株)鳴海組			受注者名	(株)吉川工務店			受注者名	(株)鳴海組								
受注金額	当初	129,800,000	変更		受注金額	当初	97,900,000	変更		受注金額	当初	155,100,000	変更	159,808,000	受注金額	当初	181,500,000	変更	183,887,000		
進捗率	予定	61.8	実施	59.0	差	-2.8		進捗率	予定	—	実施	75.0	差	—	進捗率	予定	33.5	実施	31.1	差	-2.4
今月作業	道路土工(法面整形)、法面工、防護柵工			今月作業	川上中津川左岸転落防止柵設置、和田沢砂防堰堤周辺整備、恵那山林道整備			今月作業	流路護岸工、砂防土工(右岸側)掘削・運搬			今月作業	3段目法枠工、副堤掘削・岩掘削・搬出								
来月作業	構造物撤去工、舗装工 等			来月作業	中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、荒道谷管理用道路整備 等			来月作業	流路護岸工、砂防土工(左岸側)掘削・運搬			来月作業	副堤掘削・岩掘削・搬出 コンクリート副堰堤工								
																					
⑤				⑥				⑦				⑧									
工事名	令和6年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事			工事名	令和6年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事			工事名	令和6年度 木曽川水系中津川護岸整備工事			工事名	令和6年度 木曽川水系アラク沢砂防堰堤工事								
工期	当初 R6.7.5～R7.3.14 変更			工期	当初 R6.8.20～R7.3.14 変更			工期	当初 R6.8.20～R7.3.19 変更			工期	当初 R6.8.24～R7.3.19 変更								
受注者名	(株)鳴海組			受注者名	(株)加藤工務店			受注者名	(株)加藤工務店			受注者名	(株)中島工務店								
受注金額	当初	93,500,000	変更		受注金額	当初	122,100,000	変更		受注金額	当初	140,800,000	変更		受注金額	当初	112,200,000	変更			
進捗率	予定	2.6	実施	2.4	差	-0.2		進捗率	予定	—	実施	—	差	0.0	進捗率	予定	—	実施	—	差	0.0
今月作業	準備工、仮設工			今月作業	準備工 仮設工			今月作業	準備工			今月作業	準備工								
来月作業	コンクリート堰堤工、仮設工、残土処理工			来月作業	準備工 仮設工			来月作業	準備工			来月作業	準備工 仮設工等								
				【着工前】 								準備工									

工事進捗状況（令和6年8月末）

妻木出張所

①				②				③				④			
工事名	令和5年度 妻木出張所管内整備工事			工事名	令和6年度 庄内川水系寺下第3砂防堰堤改築工事			工事名	令和6年度 庄内川水系富士下第2・第3砂防堰堤改築工事			工事名			
工期	当初 R5.12.11～R6.11.29 変更			工期	当初 R6.5.7～R7.2.28 変更			工期	当初 R6.6.17～R7.3.14 変更			工期	当初 変更		
受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名			
進捗率	予定	—	実施 65.6 差 —	進捗率	予定 13.0 実施 10.6 差 -2.4			進捗率	予定 6.6 実施 5.6 差 -1.0			進捗率	予定	実施	差 0
今月作業	指示4【堀切第2堰堤整備】指示10【市之倉川流路工整備】			今月作業	コンクリート堰堤工 作業土工 残土処理工 地盤改良工 安定処理工			今月作業	コンクリート堰堤工 作業土工			今月作業			
来月作業	指示10【市之倉川整備】指示11【防災イベント】指示12【追沢左岸下流整備】			来月作業	コンクリート堰堤工 作業土工 残土処理工 地盤改良工 安定処理工			来月作業	コンクリート堰堤工 作業土工			来月作業			
指示4：堀切第2砂防堰堤整備 指示10：市之倉川流路工整備															
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名				工事名				工事名				工事名			
工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名			
進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			

工事進捗状況 (令和6年8月末)

上松出張所

①					②					③					④					
工事名	令和5年度 上松出張所管内整備工事				工事名	令和5年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事				工事名	令和5年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事				工事名	令和5年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事				
工期	当初 R5.12.1～R6.11.29 変更				工期	当初 R5.12.11～R7.1.31 変更				工期	当初 R6.3.13～R7.2.28 変更				工期	当初 R6.3.14～R7.2.28 変更				
受注者名	木曽土建工業（株）				受注者名	奥田工業（株）				受注者名	大宗土建（株）				受注者名	木曽土建工業（株）				
受注金額	当初	100,100,000		変更	100,100,000		受注金額	当初	172,700,000		変更			受注金額	当初	75,240,000		変更	76,725,000	
進捗率	予定	—	実施	102.7	差	—	進捗率	予定	95.9	実施	95.9	差	0.0	進捗率	予定	34.3	実施	35.3	差	1.0
今月作業	上松町：北股沢崩壊法面対策・板橋沢沿線道路整備				今月作業	（深沢）コンクリート堰堤工				今月作業	コンクリート堰堤工・残土処理工				今月作業	コンクリート堰堤工 型枠 打設 埋戻				
来月作業	南木曽町：和合土砂崩壊部復旧				来月作業	（深沢）コンクリート堰堤工、砂防土工、給水設備工				来月作業	法面工・コンクリート堰堤本体工				来月作業	コンクリート堰堤工 型枠 打設				
																				
⑤					⑥					⑦					⑧					
工事名	令和5年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事				工事名	令和6年度 木曽川水系 蒲川第2砂防堰堤改築工事				工事名	令和6年度 木曽川水系 戦沢第2砂防堰堤管理用道路工事				工事名	令和6年度 木曽川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事				
工期	当初 R6.4.1～R7.2.28 変更				工期	当初 R6.5.13～R7.3.18 変更				工期	当初 R6.7.29～R7.1.31 変更				工期	当初 R6.8.19～R7.3.14 変更				
受注者名	大宗土建（株）				受注者名	奥田工業（株）				受注者名	大宗土建（株）				受注者名	木曽土建工業（株）				
受注金額	当初	173,580,000		変更	176,198,000		受注金額	当初	144,100,000		変更	144,650,000		受注金額	当初	122,958,000		変更		
進捗率	予定	14.7	実施	15.2	差	0.5	進捗率	予定	10.6	実施	4.2	差	-6.4	進捗率	予定	0.2	実施	0.2	差	0.0
今月作業	コンクリート堰堤工（床掘）、法面工、仮設工（吹付）				今月作業	仮設工（ヤド'整備）、作業土工、構造物撤去工				今月作業	準備工				今月作業	工事契約、準備工				
来月作業	コンクリート堰堤工（床掘）、残土処理工				来月作業	作業土工、構造物撤去工、コンクリート堰堤工				来月作業	仮設工、伐採工				来月作業	仮設工、構造物撤去工、作業土工				
懸案事項等	無し				懸案事項等	無し				懸案事項等	無し				懸案事項等	無し				
																				

工事進捗状況 (令和6年8月末)

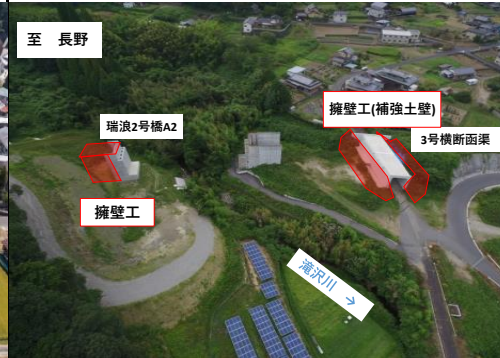
上松出張所

⑨																								
工事名	令和6年度 木曽川水系 板橋沢第1 砂防堰堤工事																							
工期	当初 R6.8.26～R7.3.19 変更																							
受注者名	神稲建設（株）																							
受注金額	当初	158,950,000				変更																		
進捗率	予定	0.0		実施	0.0		差				0.0													
今月作業	契約・準備工（施工計画 等）																							
来月作業	準備工（施工計画・照査・施工準備）																							
																								

工事進捗状況 (令和6年 8月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事
工期	当初 R5. 1. 16～R6. 2. 29 変更 R6. 10. 31	工期	当初 R4. 12. 6～R6. 2. 29 変更 R6. 12. 27	工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 3. 16～R7. 2. 28 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株)北都鉄工
今月作業	道路土工・重力式擁壁工・ブロック積工	今月作業	カルバート工	今月作業	工場製作	今月作業	準備工、仮設工(ヤード整備・敷鉄板設置)、ペント組立
来月作業	道路土工・重力式擁壁工・ブロック積工・舗装工	来月作業	カルバート工、仮設工	来月作業	工場製作、仮設工(大型土のう作製)	来月作業	桁搬入、桁架設、ペント解体、吊り足場組立
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区下部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 土岐地区道路建設工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区床版工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事
工期	当初 R5. 9. 1～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 28	工期	当初 R6. 4. 12～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 4. 8～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 4. 15～R7. 2. 28 変更
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	恵中建設(株)
今月作業	準備工、カルバート工	今月作業	道路土工、カルバート工、仮設工	今月作業	床版工、排水構造物工、路体盛土工	今月作業	道路土工、排水構造物工
来月作業	準備工、カルバート工	来月作業	カルバート工、仮設工	来月作業	床版工、橋梁付属物工、排水構造物工、路体盛土工	来月作業	伐採工、道路土工、排水構造物工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区整備工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R6. 7. 31～R7. 3. 31 変更	工期	当初 R6. 7. 31～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更
受注者名	(株) 鳴海組	受注者名	榑中島工務店	受注者名	板垣建設㈱	受注者名	駒井ハルテック
今月作業	準備工（場内除草工）	今月作業	準備工、カルバート工、仮設工	今月作業	準備工	今月作業	工場製作
来月作業	準備工（測量・仮設備）	来月作業	カルバート工、地盤改良工、仮設工	来月作業	準備工	来月作業	工場製作
							
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和6年8月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事 完	工事名	令和5年度 多治見国道橋梁補修工事
工期	当初 R5.10.1～R7.10.31 変更	工期	当初 R4.10.1～R6.10.31 変更	工期	当初 R5.4.3～R6.2.28 変更 R6.7.31	工期	当初 R5.12.11～R7.2.28 変更
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	㈱ 梅田組
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 補装修繕工	今月作業		今月作業	中津川(2)地区 支取代替工、中津川(3)地区 橋梁補修工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 補装修繕工	来月作業		来月作業	中津川(2)地区 支取代替工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名	令和5年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道道路情報表示設備工事
工期	当初 R6.2.1～R6.9.30 変更 R6.2.1～R6.12.2	工期	当初 R6.3.14～R7.2.28 変更	工期	当初 R6.5.7～R7.2.28 変更	工期	当初 R6.5.24～R7.2.28 変更
受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	エフコム(株)
今月作業	防護柵工	今月作業	瑞浪土岐地区:法面工 多治見(3)地区:道路土工 防止柵工	今月作業	準備工(埋設物調査、調査ボーリング)	今月作業	道路情報表示板 現地調査
来月作業	防護柵工 擁壁工	来月作業	瑞浪土岐地区:法面工 瑞浪(1)地区:落石雪害防止工	来月作業	準備工、地山補強土工	来月作業	道路情報表示板 現地調査 機器製作
							

⑨		⑩		⑪		①	
工事名	令和6年度 多治見国道御嵩地区垂炭坑充填工事	工事名	令和6年度 多治見国道標識設置工事				
工期	当初 R6.6.17～R7.1.31 変更	工期	当初 R6.7.03～R7.02.28 変更				
受注者名	徳倉建設（株）	受注者名	篠田（株）				
今月作業	準備工、事業損失防止施設工	今月作業	準備工				
来月作業	準備工、事業損失防止施設工、充填孔設置工	来月作業	準備工、区画線工				
				写真		写真	
⑫		⑬		⑭		⑮	
写真		写真		写真		写真	
