

工事進捗状況 (令和6年9月末)

中津川出張所

①					②					③					④				
工事名 令和5年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事					工事名 令和5年度 中津川出張所管内整備工事					工事名 令和5年度 木曽川水系地獄谷除石工事					工事名 令和5年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事				
工期 当初 R5.9.25～R6.3.13 変更 R5.9.25～R6.11.2					工期 当初 R5.12.1～R6.11.29 変更					工期 当初 R6.4.8～R7.2.28 変更					工期 当初 R6.4.11～R7.2.28 変更				
受注者名 (株)吉川工務店					受注者名 (株)鳴海組					受注者名 (株)吉川工務店					受注者名 (株)鳴海組				
受注金額 当初 129,800,000 変更					受注金額 当初 97,900,000 変更					受注金額 当初 155,100,000 変更 159,808,000					受注金額 当初 181,500,000 変更 183,887,000				
進捗率 予定 63.5 実施 60.4 差 -3.1					進捗率 予定 - 実施 93.2 差 -					進捗率 予定 80.5 実施 86.1 差 5.6					進捗率 予定 41.5 実施 41.2 差 -0.3				
今月作業 法面工、舗装工 等					今月作業 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、荒道谷管理用道路整備、恵那山林道整備					今月作業 流路護岸工、砂防土工（右岸側）掘削・運搬 完了					今月作業 副堤掘削 岩掘削・搬出				
来月作業 舗装工、残土処理工					来月作業 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、恵那山林道整備、四ツ目川遊砂工整備					来月作業 流路護岸工、排水工、コンクリート舗装					来月作業 コンクリート副堰堤工 床付け・型枠・Co打設				
																			
⑤					⑥					⑦					⑧				
工事名 令和6年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事					工事名 令和6年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事					工事名 令和6年度 木曽川水系中津川護岸整備工事					工事名 令和6年度 木曽川水系アクラ沢砂防堰堤工事				
工期 当初 R6.7.5～R7.3.14 変更					工期 当初 R6.8.20～R7.3.14 変更					工期 当初 R6.8.20～R7.3.19 変更					工期 当初 R6.8.24～R7.3.19 変更				
受注者名 (株)鳴海組					受注者名 (株)加藤工務店					受注者名 (株)加藤工務店					受注者名 (株)中島工務店				
受注金額 当初 93,500,000 変更					受注金額 当初 122,100,000 変更					受注金額 当初 140,800,000 変更					受注金額 当初 112,200,000 変更				
進捗率 予定 20.9 実施 21.6 差 0.7					進捗率 予定 2.4 実施 0.5 差 1.9					進捗率 予定 0.5 実施 0.5 差 0.0					進捗率 予定 1.5 実施 1.5 差 0.0				
今月作業 コンクリート堰堤工、仮設工、残土処理工					今月作業 準備工 仮設工					今月作業 準備工 測量					今月作業 準備工				
来月作業 コンクリート堰堤工、仮設工					来月作業 準備工 仮設工					来月作業 仮設工 水道切り直し・伐採					来月作業 砂防土工、床固め工、仮設工等				
																			

工事進捗状況（令和6年9月末）

妻木出張所

①				②				③				④			
工事名	令和5年度 妻木出張所管内整備工事			工事名	令和6年度 庄内川水系寺下第3砂防堰堤改築工事			工事名	令和6年度 庄内川水系富士下第2・第3砂防堰堤改築工事			工事名			
工期	当初 R5. 12. 11～R6. 11. 29 変更			工期	当初 R6. 5. 7～R7. 2. 28 変更			工期	当初 R6. 6. 17～R7. 3. 14 変更			工期	当初 変更		
受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名			
進捗率	予定	－	実施 73.4 差 －	進捗率	予定	23.9 実施 22.3 差 -1.6		進捗率	予定	15.7 実施 15.7 差 0		進捗率	予定	実施	差 0
今月作業	指示10【市之倉川整備】指示11【防災イベント】指示12【追沢左岸下流整備】			今月作業	コンクリート堰堤工 作業土工 残土処理工 地盤改良工 安定処理工			今月作業	第2砂防堰堤 コンクリート堰堤工、作業土工 第3砂防堰堤 伐採工			今月作業			
来月作業	指示8【鍛冶ヶ入運搬路舗装修繕】指示11【防災イベント】			来月作業	コンクリート堰堤工 作業土工 残土処理工 地盤改良工 安定処理工			来月作業	第2砂防堰堤 コンクリート堰堤工、コンクリート堰堤本体工 第3砂防堰堤 伐採工			来月作業			
指示12追沢左岸下流整備 指示10市之倉川流路工整備								第2砂防堰堤 第3砂防堰堤 							
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名				工事名				工事名				工事名			
工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名			
進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差 0
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			

工事進捗状況 (令和6年9月末)

上松出張所

①					②					③					④				
工事名 令和5年度 上松出張所管内整備工事					工事名 令和5年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事					工事名 令和5年度 木曽川水系 和合蛇沢沈砂地工事					工事名 令和5年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事				
工期 当初 R5.12.1～R6.11.29 変更					工期 当初 R5.12.11～R7.1.31 変更					工期 当初 R6.3.13～R7.2.28 変更					工期 当初 R6.3.14～R7.2.28 変更				
受注者名 木曽土建工業（株）					受注者名 奥田工業（株）					受注者名 大宗土建（株）					受注者名 木曽土建工業（株）				
受注金額 当初 100,100,000 変更 100,100,000					受注金額 当初 172,700,000 変更					受注金額 当初 166,980,000 変更 169,499,000					受注金額 当初 75,240,000 変更 76,725,000				
進捗率 予定 ー 実施 119.2 差 ー					進捗率 予定 98.3 実施 99.4 差 1.1					進捗率 予定 40.5 実施 47.2 差 6.7					進捗率 予定 65.2 実施 63.0 差 -2.2				
今月作業 南木曽町：和合土砂崩壊部復旧					今月作業 （深沢）コンクリート堰堤工、砂防土工、給水設備工					今月作業 法面工・コンクリート堰堤本体工					今月作業 コンクリート堰堤工 型枠 打設				
来月作業 ー					来月作業 （深沢）法面工、給水設備工、仮設ヤード整備					来月作業 コンクリート堰堤本体工					来月作業 コンクリート堰堤工 型枠 打設 銘板工				
																			
⑤					⑥					⑦					⑧				
工事名 令和5年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事					工事名 令和6年度 木曽川水系 蒲川第2砂防堰堤改築工事					工事名 令和6年度 木曽川水系 戦沢第2砂防堰堤管理用道路工事					工事名 令和6年度 木曽川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事				
工期 当初 R6.4.1～R7.2.28 変更					工期 当初 R6.5.13～R7.3.18 変更					工期 当初 R6.7.29～R7.1.31 変更					工期 当初 R6.8.19～R7.3.14 変更				
受注者名 大宗土建（株）					受注者名 奥田工業（株）					受注者名 大宗土建（株）					受注者名 木曽土建工業（株）				
受注金額 当初 173,580,000 変更 176,198,000					受注金額 当初 144,100,000 変更 144,650,000					受注金額 当初 122,958,000 変更					受注金額 当初 119,900,000 変更				
進捗率 予定 36.5 実施 31.0 差 -5.5					進捗率 予定 18.0 実施 8.5 差 -9.5					進捗率 予定 10.4 実施 5.0 差 -5.4					進捗率 予定 13.8 実施 9.3 差 -4.5				
今月作業 コンクリート堰堤工（床掘）、残土処理工					今月作業 作業土工、構造物取壊し工、コンクリート堰堤本体工					今月作業 仮設工、伐採工					今月作業 仮設工、伐採工				
来月作業 コンクリート堰堤工（床掘）、残土処理工、仮設工（仮水路、吹付）					来月作業 コンクリート堰堤本体工（差し筋、型枠、打設）側壁工					来月作業 仮設工、伐採工					来月作業 仮設工、構造物撤去工、多自然護岸工				
																			

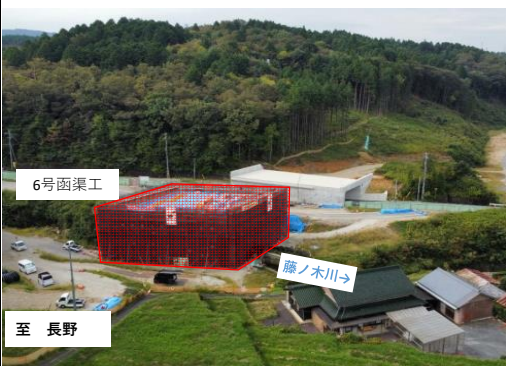
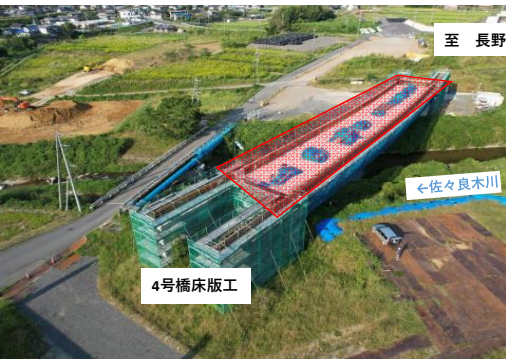
工事進捗状況（令和6年9月末）

上松出張所

⑨																				
工事名	令和6年度 木曾川水系 板橋沢第1 砂防堰堤工事																			
工期	当初 R6.8.26～R7.3.19 変更																			
受注者名	神稲建設（株）																			
受注金額	当初	158,950,000				変更														
進捗率	予定	3.5	実施	0.5	差	-3.0														
今月作業	準備工、土質試験																			
来月作業	準備工、伐採工																			
																				

工事進捗状況 (令和6年 9月末)

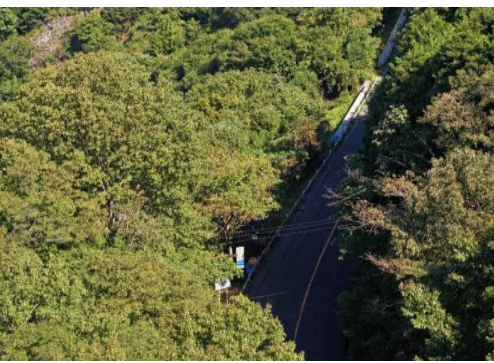
瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事
工期	当初 R5. 1. 16～R6. 2. 29 変更 R6. 10. 31	工期	当初 R4. 12. 6～R6. 2. 29 変更 R6. 12. 27	工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 3. 16～R7. 2. 28 変更 R6. 11. 8
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 吉川工務店	受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株) 北都鉄工
今月作業	道路土工・重力式擁壁工・ブロック積工	今月作業	カルバート工	今月作業	工場製作、仮設工(大型土のう作製)	今月作業	仮設工(ヤード整備・敷鉄板設置)、ペント組立、架設工、足場工
来月作業	舗装工・仮設工	来月作業	カルバート工、仮設工	来月作業	工場製作、架設工(昇降設備組立・下部工検査路取付)	来月作業	現場塗装、足場解体
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区下部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 土岐地区道路建設工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区床版工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事
工期	当初 R5. 9. 1～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 28	工期	当初 R6. 4. 12～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 4. 8～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 4. 15～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 31
受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 吉川工務店	受注者名	恵中建設(株)
今月作業	準備工、カルバート工	今月作業	カルバート工、仮設工	今月作業	床版工、排水構造物工、路体盛土工	今月作業	道路土工、排水構造物工
来月作業	準備工、カルバート工、排水構造物工	来月作業	カルバート工	来月作業	床版工、橋梁付属物工、排水構造物工、路体盛土工	来月作業	道路土工、排水構造物工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区整備工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R6. 7. 31～R7. 3. 31 変更	工期	当初 R6. 7. 31～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更
受注者名	(株) 鳴海組	受注者名	㈱中島工務店	受注者名	板垣建設㈱	受注者名	駒井ハルテック
今月作業	準備工 (測量・仮設備)	今月作業	カルバート工、地盤改良工、仮設工	今月作業	準備工	今月作業	工場製作
来月作業	準備工 (伐採工)、排水構造物工、道路土工	来月作業	地盤改良工、仮設工	来月作業	擁壁工 (瑞浪2号橋 (A2側)) 作業土工	来月作業	工場製作
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和6年9月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事 完	工事名	令和5年度 多治見国道橋梁補修工事
工期	当初 R5.10.1～R7.10.31 変更	工期	当初 R4.10.1～R6.10.31 変更	工期	当初 R5.4.3～R6.2.28 変更 R6.7.31	工期	当初 R5.12.11～R7.2.28 変更
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	㈱ 梅田組
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	今月作業		今月作業	中津川(2)地区 支取替工(製作工)
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	来月作業		来月作業	中津川(2)地区 支取替工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名	令和5年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道道路情報表示設備工事
工期	当初 R6.2.1～R6.9.30 変更 R6.12.2	工期	当初 R6.3.14～R7.2.28 変更	工期	当初 R6.5.7～R7.2.28 変更	工期	当初 R6.5.24～R7.2.28 変更
受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	エフコム(株)
今月作業	擁壁工 防護柵工	今月作業	瑞浪工岐地区：法面工 多治見(3)地区：道路付属物工	今月作業	準備工(ボーリング調査)	今月作業	道路情報表示板 現地調査 機器製作
来月作業	擁壁工 防護柵工	来月作業	瑞浪工岐地区：法面工 多治見(3)地区：道路付属物工 瑞浪(2)地区：舗装工	来月作業	準備工(伐採)	来月作業	道路情報表示板 現地調査 機器製作
							

⑨		⑩		⑪			
工事名	令和6年度 多治見国道御嵩地区亜炭坑充填工事	工事名	令和6年度 多治見国道標識設置工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事		
工期	当初 R6. 6. 17～R7. 1. 31 変更 R7. 2. 28	工期	当初 R6. 7. 03～R7. 02. 28 変更	工期	当初 R6. 10. 1～R9. 10. 31 変更		
受注者名	徳倉建設（株）	受注者名	篠田（株）	受注者名	（有）木曾ハイウェーサービス		
今月作業	準備工、充填孔設置工	今月作業	準備工	今月作業	準備工		
来月作業	準備工、充填孔設置工、試掘工、充填工	来月作業	準備工、区画線工	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱礎） 舗装修繕工		
				準備工			
⑫		⑬		⑭		⑮	
