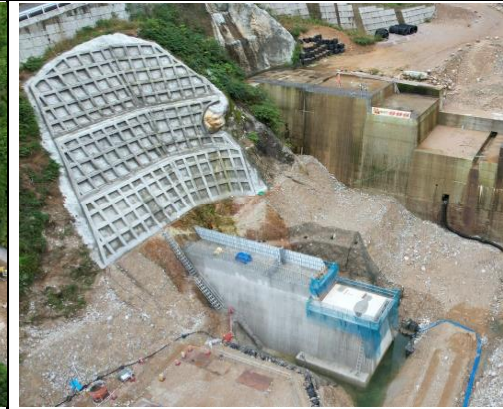


工事進捗状況 (令和6年10月末)

中津川出張所

①				②				③				④			
工事名 令和5年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事				工事名 令和5年度 中津川出張所管内整備工事				工事名 令和5年度 木曽川水系地獄谷除石工事				工事名 令和5年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事			
工期 当初 R5.9.25～R6.3.13 変更 R5.9.25～R6.11.29				工期 当初 R5.12.1～R6.11.29 変更				工期 当初 R6.4.8～R7.2.28 変更				工期 当初 R6.4.11～R7.2.28 変更			
受注者名 (株)吉川工務店				受注者名 (株)鳴海組				受注者名 (株)吉川工務店				受注者名 (株)鳴海組			
受注金額 当初 129,800,000 変更				受注金額 当初 97,900,000 変更				受注金額 当初 155,100,000 変更 159,808,000				受注金額 当初 181,500,000 変更 183,887,000			
進捗率 予定 91.3 実施 91.3 差 0.0				進捗率 予定 ー 実施 98.6 差 ー				進捗率 予定 90.5 実施 94.2 差 3.7				進捗率 予定 58.5 実施 58.1 差 -0.4			
今月作業 舗装工、残土処理工				今月作業 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、荒道谷管理用道路整備				今月作業 流路護岸工、排水工、コンクリート舗装				今月作業 コンクリート副堰堤工 床付け・型枠・Co打設			
来月作業 残土処理工、後片付け、検査(R6.11.29)				来月作業 中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、後片付け、検査(R6.11.29)				来月作業 コンクリート舗装 片付け				来月作業 コンクリート副堰堤工 型枠・Co打設			
															
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名 令和6年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事				工事名 令和6年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事				工事名 令和6年度 木曽川水系中津川護岸整備工事				工事名 令和6年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事			
工期 当初 R6.7.5～R7.3.14 変更				工期 当初 R6.8.20～R7.3.14 変更				工期 当初 R6.8.20～R7.3.19 変更				工期 当初 R6.8.24～R7.3.19 変更			
受注者名 (株)鳴海組				受注者名 (株)加藤工務店				受注者名 (株)加藤工務店				受注者名 (株)中島工務店			
受注金額 当初 93,500,000 変更				受注金額 当初 122,100,000 変更				受注金額 当初 140,800,000 変更				受注金額 当初 112,200,000 変更			
進捗率 予定 48.0 実施 51.4 差 3.4				進捗率 予定 4.8 実施 4.8 差 0.0				進捗率 予定 3.0 実施 3.0 差 0.0				進捗率 予定 4.7 実施 5.8 差 1.1			
今月作業 コンクリート堰堤工、仮設工				今月作業 仮設工 道路土工 掘削・残土搬出				今月作業 仮設工 水道切り直し・伐採				今月作業 砂防土工、床固め工、構造物撤去工、仮設工			
来月作業 コンクリート堰堤工				来月作業 道路土工 掘削・残土搬出				来月作業 仮設坂路 盛土 多自然護岸工				来月作業 砂防土工、流路護岸工、床固め工、仮設工			
															

工事進捗状況（令和6年10月末）

妻木出張所

①										②										③										④																					
工事名		令和5年度 妻木出張所管内整備工事								工事名		令和6年度 庄内川水系寺下第3砂防堰堤改築工事								工事名		令和6年度 庄内川水系富士下第2・第3砂防堰堤改築工事								工事名																					
工期		当初 R5. 12. 11～R6. 11. 29 変更								工期		当初 R6. 5. 7～R7. 2. 28 変更								工期		当初 R6. 6. 17～R7. 3. 14 変更								工期		当初 変更																			
受注者名		(株) 藤本組								受注者名		(株) 藤本組								受注者名		(株) 藤本組								受注者名		(株) 藤本組																			
進捗率		予定		－		実施		97.4		差		－		進捗率		予定		32.2		実施		31.5		差		-0.7		進捗率		予定		34.7		実施		35.7		差		1.0		進捗率		予定		実施		差		0	
今月作業		指示：8【鍛冶ヶ入運搬路舗装繕】								今月作業		コンクリート堰堤工 作業土工 残土処理工 地盤改良工 安定処理工								今月作業		第2堰堤：コンクリート堰堤本体工、第3堰堤：伐採								今月作業																					
来月作業		指示：13【脇之島川流路整備】								来月作業		コンクリート堰堤工 コンクリート堰堤本体工								来月作業		第2堰堤：コンクリート堰堤本体工、寺下富士：護岸工、伐採								来月作業																					
																																																			
⑤										⑥										⑦										⑧																					
工事名										工事名										工事名										工事名																					
工期		当初 変更								工期		当初 変更								工期		当初 変更								工期		当初 変更																			
受注者名										受注者名										受注者名										受注者名																					
進捗率		予定		実施		差		0		進捗率		予定		実施		差		0		進捗率		予定		実施		差		0		進捗率		予定		実施		差		0													
今月作業										今月作業										今月作業										今月作業																					
来月作業										来月作業										来月作業										来月作業																					

工事進捗状況 (令和6年10月末)

上松出張所

NO.1

①					②					③					④												
工事名	令和5年度 上松出張所管内整備工事				工事名	令和5年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤工事				工事名	令和5年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事				工事名	令和5年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事											
工期	当初 R5.12.1~R6.11.29 変更				工期	当初 R5.12.11~R7.1.31 変更				工期	当初 R6.3.13~R7.2.28 変更				工期	当初 R6.3.14~R7.2.28 変更											
受注者名	木曾土建工業(株)				受注者名	奥田工業(株)				受注者名	大宗土建(株)				受注者名	木曾土建工業(株)											
受注金額	当初	100,100,000		変更	100,100,000	受注金額	当初	172,700,000		変更		受注金額	当初	166,980,000		変更	169,499,000	受注金額	当初	75,240,000		変更	76,725,000				
進捗率	予定	—	実施	119.2	差	—	進捗率	予定	99.7	実施	100.0	差	0.3	進捗率	予定	40.5	実施	47.2	差	6.7	進捗率	予定	78.5	実施	82.1	差	3.6
今月作業	変更契約				今月作業	(深沢)法面工、給水設備工、仮設ヤード整備				今月作業	コンクリート堰堤本体工				今月作業	コンクリート堰堤工 型枠 打設 銘板工											
来月作業	竣工書類作成				来月作業	竣工書類作成				来月作業	コンクリート堰堤本体工				来月作業	盛土工 法面工 仮設工 片付け											
																											
⑤					⑥					⑦					⑧												
工事名	令和5年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤工事				工事名	令和6年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事				工事名	令和6年度 木曾川水系 職沢第2砂防堰堤管理用道路工事				工事名	令和6年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事											
工期	当初 R6.4.1~R7.2.28 変更				工期	当初 R6.5.13~R7.3.18 変更				工期	当初 R6.7.29~R7.1.31 変更				工期	当初 R6.8.19~R7.3.14 変更											
受注者名	大宗土建(株)				受注者名	奥田工業(株)				受注者名	大宗土建(株)				受注者名	木曾土建工業(株)											
受注金額	当初	173,580,000		変更	176,198,000	受注金額	当初	144,100,000		変更	144,650,000	受注金額	当初	122,958,000		変更		受注金額	当初	119,900,000		変更					
進捗率	予定	48.3	実施	41.7	差	-6.6	進捗率	予定	15.8	実施	15.8	差	0.0	進捗率	予定	29.6	実施	29.6	差	0.0	進捗率	予定	18.7	実施	15.9	差	-2.8
今月作業	コンクリート堰堤工(床掘)、残土処理工、仮設工(仮締切、吹付)				今月作業	コンクリート堰堤本体工(差し筋、型枠、打設)側壁工床掘				今月作業	掘削工、伐採工、仮設工				今月作業	仮設工、砂防土工											
来月作業	コンクリート堰堤工(型枠、打設)				来月作業	コンクリート堰堤本体工(打設)側壁工(型枠、打設)鋼製堰堤本体工				来月作業	掘削工、伐採工				来月作業	砂防土工、多自然護岸工、床固め本体工											
																											

工事進捗状況 (令和6年10月末)


上松出張所

NO, 2

[illegible]

工事進捗状況 (令和6年 10月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

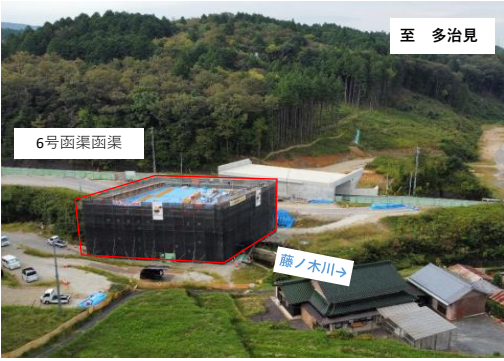①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事
工期	当初 R5. 1. 16～R6. 2. 29 変更 R6. 10. 31	工期	当初 R4. 12. 6～R6. 2. 29 変更 R6. 12. 27	工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 3. 16～R7. 2. 28 変更 R6. 11. 8
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 吉川工務店	受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株) 北都鉄工
今月作業	舗装工・仮設工・片付け	今月作業	カルバート工	今月作業	工場製作・架設工(昇降設備組立・下部工検査路取付)	今月作業	現場塗装工
来月作業		来月作業	カルバート工、仮設工、石ブロック積工	来月作業	工場製作・架設工(下部工検査路取付・ベント組立)	来月作業	足場解体、後片付け
完成 							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区下部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 土岐地区道路建設工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区床版工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事
工期	当初 R5. 9. 1～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 28	工期	当初 R6. 4. 12～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 4. 8～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R6. 4. 15～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 31
受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 吉川工務店	受注者名	恵中建設(株)
今月作業	準備工、カルバート工	今月作業	カルバート工	今月作業	床版工、排水構造物工、路体盛土工	今月作業	道路土工、排水構造物工
来月作業	準備工、カルバート工、排水構造物工	来月作業	カルバート工	来月作業	排水装置工、排水構造物工、路体盛土工、舗装工	来月作業	道路土工、排水構造物工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区整備工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R6. 7. 31～R7. 3. 31 変更	工期	当初 R6. 7. 31～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更
受注者名	(株) 鳴海組	受注者名	㈱中島工務店	受注者名	板垣建設㈱	受注者名	駒井ハルテック
今月作業	準備工（伐採工）、排水構造物工、道路土工	今月作業	地盤改良工、準備工、仮設工	今月作業	擁壁工 作業土工、仮設工	今月作業	工場製作
来月作業	道路土工、排水構造物工	来月作業	地盤改良工、仮設工	来月作業	(瑞浪2号橋(A2側)) 作業土工、固結工	来月作業	工場製作
							
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和6年10月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事 完	工事名	令和5年度 多治見国道橋梁補修工事
工期	当初 R5.10.1～R7.10.31 変更	工期	当初 R6.10.1～R9.10.31 変更	工期	当初 R5.4.3～R6.2.28 変更 R6.7.31	工期	当初 R5.12.11～R7.2.28 変更 R7.3.31
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	㈱ 梅田組
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	今月作業		今月作業	中津川(2)地区 支取代替工(製作工)
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	来月作業		来月作業	中津川(2)地区 支取代替工、恵那地区 橋梁補修工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名	令和5年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道道路情報表示設備工事
工期	当初 R6.2.1～R6.9.30 変更 R6.12.2	工期	当初 R6.3.14～R7.2.28 変更	工期	当初 R6.5.7～R7.2.28 変更	工期	当初 R6.5.24～R7.2.28 変更
受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	セントラル建設㈱	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	エフコム(株)
今月作業	擁壁工 防護柵工	今月作業	瑞浪工岐地区：法面工 瑞浪(2)地区：舗装工	今月作業	準備工(ボーリング調査、伐採)	今月作業	道路情報表示板 現地調査 機器製作
来月作業	擁壁工 防護柵工 道路付属施設工 舗装工	来月作業	瑞浪工岐地区：仮設工 瑞浪(2)地区：舗装工 中津川(1)地区：落石雪害防止工 中津川(2)地区：組立歩道工	来月作業	地山補強土工(床掘・足場)	来月作業	道路情報表示板 現地調査 機器製作
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 多治見国道御嵩地区亜炭坑充填工事	工事名	令和6年度 多治見国道標識設置工事	工事名	令和6年度 多治見国道西部除雪作業	工事名	令和6年度 多治見国道東部除雪作業
工期	当初 R6. 6. 17～R7. 1. 31 変更 R7. 2. 28	工期	当初 R6. 7. 03～R7. 02. 28 変更	工期	当初 R6. 11. 01～R7. 03. 31 変更	工期	当初 R6. 11. 01～R7. 03. 31 変更
受注者名	徳倉建設（株）	受注者名	篠田（株）	受注者名	（株）吉川組	受注者名	（株）吉川工務店
今月作業	準備工、充填孔設置工	今月作業	準備工	今月作業		今月作業	
来月作業	準備工、充填工	来月作業	準備工、区画線工	来月作業		来月作業	
				準備工		準備工	
