

工事進捗状況 (令和7年1月末)

中津川出張所

①					②					③					④										
工事名	令和5年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事				工事名	令和6年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事				工事名	令和6年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事				工事名	令和6年度 木曽川水系中津川護岸整備工事									
工期	当初 R6.4.11～R7.3.21 変更				工期	当初 R6.7.5～R7.3.14 変更				工期	当初 R6.8.20～R7.3.14 変更 R7.6.30(予定)				工期	当初 R6.8.20～R7.3.19 変更 R7.6.30(予定)									
受注者名	(株)鳴海組				受注者名	(株)鳴海組				受注者名	(株)加藤工務店				受注者名	(株)加藤工務店									
受注金額	当初	181,500,000		変更	183,887,000	受注金額	当初	93,500,000		変更		受注金額	当初	122,100,000		変更		受注金額	当初	140,800,000		変更			
進捗率	予定	94.5		実施	92.8	差	-1.7		進捗率	予定	84.5		実施	98.3	差	13.8		進捗率	予定	18.9		実施	19.6	差	-0.7
今月作業	コンクリート側壁工 型枠・Co打設 埋戻し				今月作業	コンクリート堰堤工、後片付け				今月作業	法面工 鉄筋挿入工				今月作業	護岸工 大型ブロック積									
来月作業	コンクリート側壁工 型枠・Co打設 埋戻し				来月作業	コンクリート堰堤工、後片付け				来月作業	法面工 鉄筋挿入工 植生基材吹付				来月作業	護岸工 大型ブロック積									
																									
⑤					⑥					⑦															
工事名	令和6年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事				工事名	令和6年度 木曽川水系正ヶ根第2砂防堰堤改築工事				工事名	令和6年度 中津川出張所管内整備工事				工事名										
工期	当初 R6.8.24～R7.3.19 変更 R7.7.31(予定)				工期	当初 R6.10.10～R7.6.30 変更				工期	当初 R6.12.13～R7.11.28 変更				工期										
受注者名	(株)中島工務店				受注者名	(株)中島工務店				受注者名	(株)吉川工務店				受注者名										
受注金額	当初	112,200,000		変更		受注金額	当初	100,870,000		変更		受注金額	当初	100,100,000		変更		受注金額							
進捗率	予定	45.2		実施	35.6	差	-9.6		進捗率	予定	24.7		実施	24.7	差	0.0		進捗率	予定	—		実施	16.0	差	—
今月作業	法面工、流路護岸工、床固め工、構造物撤去工、仮設工				今月作業	置換工・洗掘対策工・堰堤本体工				今月作業	車洞管理用道路整備、川上橋残土処理場土砂処分 等				今月作業										
来月作業	コンクリート堰堤工、流路護岸工、構造物撤去工 等				来月作業	置換工・洗掘対策工・堰堤本体工				来月作業	四ツ目遊砂工整備、中津川第2砂防堰堤残土処理場整備 等				来月作業										
																									
										(作業終了) 川上地区_車洞管理用道路の啓開作業															

工事進捗状況 (令和7年1月末)

上松出張所

NO.1

①					②					③					④												
工事名	令和5年度 上松出張所管内整備工事				工事名	令和5年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤工事				工事名	令和5年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事				工事名	令和5年度 木曾川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事											
工期	当初 R5.12.1~R6.11.29 変更				工期	当初 R5.12.11~R7.1.31 変更				工期	当初 R6.3.13~R7.2.28 変更				工期	当初 R6.3.14~R7.2.28 変更											
受注者名	木曾土建工業(株)				受注者名	奥田工業(株)				受注者名	大宗土建(株)				受注者名	木曾土建工業(株)											
受注金額	当初	100,100,000		変更	125,642,000	受注金額	当初	172,700,000		変更	201,938,000	受注金額	当初	166,980,000		変更	169,499,000	受注金額	当初	75,240,000		変更	84,161,000				
進捗率	予定	—	実施	100.0	差	—	進捗率	予定	—	実施	100.0	差	—	進捗率	予定	99.7	実施	98.9	差	—0.8	進捗率	予定	—	実施	100.0	差	—
今月作業	—				今月作業	—				今月作業	仮設工・片付け				今月作業	—											
来月作業	—				来月作業	—				来月作業	—				来月作業	—											
																											
⑤					⑥					⑦					⑧												
工事名	令和5年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤工事				工事名	令和6年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事				工事名	令和6年度 木曾川水系 職沢第2砂防堰堤管理用道路工事				工事名	令和6年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事											
工期	当初 R6.4.1~R7.2.28 変更 ~R7.3.21				工期	当初 R6.5.13~R7.3.14 変更				工期	当初 R6.7.29~R7.1.31 変更 ~R7.3.14				工期	当初 R6.8.19~R7.3.14 変更 延期予定											
受注者名	大宗土建(株)				受注者名	奥田工業(株)				受注者名	大宗土建(株)				受注者名	木曾土建工業(株)											
受注金額	当初	173,580,000		変更	176,198,000	受注金額	当初	144,100,000		変更	144,650,000	受注金額	当初	122,958,000		変更	14,368,000	受注金額	当初	119,900,000		変更					
進捗率	予定	95.1	実施	94.9	差	-0.2	進捗率	予定	91.1	実施	89.7	差	-1.4	進捗率	予定	98.9	実施	98.9	差	0.0	進捗率	予定	34.1	実施	27.6	差	-6.5
今月作業	コンクリート堰堤本体工(型枠 打設)				今月作業	側壁工(型枠、打設) 構造物撤去工				今月作業	掘削工、残土処理工、伐採工				今月作業	床固め本体工(掘削工)											
来月作業	コンクリート堰堤本体工(脱型)、仮設工、準備工				来月作業	側壁工(型枠、打設) 構造物撤去工				来月作業	片付け				来月作業	床固め本体工(型枠、打設)											
																											

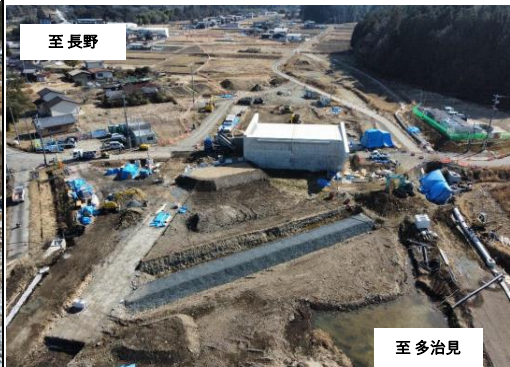
工事進捗状況（令和7年1月末）

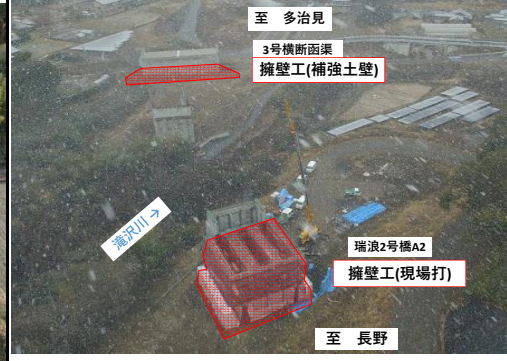
妻木出張所

①					②					③					④			
工事名 令和6年度 妻木出張所管内整備工事					工事名 令和6年度 庄内川水系寺下第3砂防堰堤改築工事					工事名 令和6年度 庄内川水系富士下第2・第3砂防堰堤改築工事					工事名			
工期 当初 R6.12.2 ～R7.11.28 変更					工期 当初 R6.5.7～R7.2.28 変更 R7.3.28					工期 当初 R6.6.17～R7.3.14 変更					工期 当初 変更			
受注者名 (株) 藤本組					受注者名 (株) 藤本組					受注者名 (株) 藤本組					受注者名			
進捗率 予定 0 実施 1.1 差 1.1					進捗率 予定 86.7 実施 86.7 差 0					進捗率 予定 84.5 実施 80.2 差 -4.3					進捗率 予定 実施 差			
今月作業 指示：3【町道路整備】カーブミラー設置					今月作業 コンクリート堰堤本体工 埋戻し					今月作業 第2堰堤：コンクリート堰堤本体工 寺下富士：流路護岸					今月作業			
来月作業 指示：4【小家洞・寺下・鍛冶ヶ入整備】防草工					来月作業 コンクリート堰堤本体工 埋戻し 仮設工					来月作業 第2堰堤：コンクリート堰堤本体工 寺下富士：流路護岸・仮設工					来月作業			
																		
⑤					⑥					⑦					⑧			
工事名					工事名					工事名					工事名			
工期 当初 変更					工期 当初 変更					工期 当初 変更					工期 当初 変更			
受注者名					受注者名					受注者名					受注者名			
進捗率 予定 実施 差					進捗率 予定 実施 差					進捗率 予定 実施 差					進捗率 予定 実施 差			
今月作業					今月作業					今月作業					今月作業			
来月作業					来月作業					来月作業					来月作業			

工事進捗状況 (令和7年 1月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 上切地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 宿地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪3号橋鋼上部工事
工期	当初 R5. 1. 16～R6. 2. 29 変更 R6. 10. 31	工期	当初 R4. 12. 6～R6. 2. 29 変更 R6. 12. 27	工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更 R7. 4. 30	工期	当初 R5. 3. 16～R7. 2. 28 変更 R6. 11. 8
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 吉川工務店	受注者名	灌上工業 (株)	受注者名	(株) 北都鉄工
今月作業		今月作業		今月作業	架設工 (桁架設)	今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業	架設工 (桁架設)、足場組立、高力ボルト締付	来月作業	
完成 		完成 				完成 	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 中切地区下部工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 土岐地区道路建設工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区床版工事	工事名	令和5年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事
工期	当初 R5. 9. 1～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 28	工期	当初 R6. 4. 12～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 31	工期	当初 R6. 4. 8～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 31	工期	当初 R6. 4. 15～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 31
受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 吉川工務店	受注者名	恵中建設㈱
今月作業	道路土工、擁壁工、排水構造物工、構造物撤去工	今月作業	カルバート工、排水構造物工	今月作業	鋼橋足場等設置工、仮設工	今月作業	擁壁工・排水構造物工
来月作業	後片付け	来月作業	カルバート工	来月作業	仮設工、法面工	来月作業	道路土工・伐採工・排水構造物工・舗装工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区整備工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R6. 7. 31～R7. 3. 31 変更	工期	当初 R6. 7. 31～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R6. 8. 30～R8. 2. 27 変更
受注者名	(株) 鳴海組	受注者名	㈱中島工務店	受注者名	板垣建設㈱	受注者名	駒井ハルテック
今月作業	道路土工、排水構造物工	今月作業	カルバート工、擁壁工、排水構造物工、仮設工	今月作業	U型擁壁工 足場工、鉄筋工、型枠工、コンクリート打設	今月作業	工場製作
来月作業	道路土工、排水構造物工	来月作業	カルバート工、擁壁工、排水構造物工、仮設工	来月作業	U型擁壁工 足場工、鉄筋工、型枠工、コンクリート打設	来月作業	工場製作
							
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和7年1月末)

瑞浪国道維持出張所

① 工事名 令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事 工期 当初 R5. 10. 1～R7. 10. 31 変更 受注者名 日本ハウエイスサービス(株) 今月作業 排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他 来月作業 排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	② 工事名 令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事 工期 当初 R6. 10. 1～R9. 10. 31 変更 受注者名 (有) 木曾ハウエーサービス 今月作業 道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工 来月作業 道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工	③ 完 工事名 令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事 工期 当初 R5. 4. 3～R6. 2. 28 変更 R6. 7. 31 受注者名 (株) 加藤工務店 今月作業 来月作業	④ 工事名 令和5年度 多治見国道橋梁補修工事 工期 当初 R5. 12. 11～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 31 受注者名 ㈱ 梅田組 今月作業 中津川(2)地区 支取替工、橋梁補修工 来月作業 準備工、後片付け
			
⑤ 工事名 令和5年度 多治見国道交通事故対策工事 工期 当初 R6. 2. 1～R6. 9. 30 変更 R7. 3. 20 受注者名 セントラル建設㈱ 今月作業 舗装工 防護柵工 区画線工 来月作業 舗装工 防護柵工 区画線工	⑥ 工事名 令和5年度 多治見国道管内整備工事 工期 当初 R6. 3. 14～R7. 2. 28 変更 R7. 3. 19 受注者名 セントラル建設㈱ 今月作業 中津川(2)地区：組立歩道工 舗装工 防護柵工 仮設工 来月作業 中津川(1)地区：ロープネット工 中津川(2)地区：仮設工(仮設歩道) 多治見(2)地区：舗装工(切南オーバーレイ工)	⑦ 工事名 令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事 工期 当初 R6. 5. 7～R7. 2. 28 変更 R7. 5. 31 受注者名 ㈱加藤工務店 今月作業 地山補強土工(空洞対策工 ルートパイル) 来月作業 地山補強土工(ルートパイル)	⑧ 工事名 令和6年度 多治見国道道路情報表示設備工事 工期 当初 R6. 5. 24～R7. 2. 28 変更 受注者名 エフコム(株) 今月作業 道路情報表示板 設置工 来月作業 道路情報表示板 設置工
			

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 多治見国道御嵩地区亜炭坑充填工事	工事名	令和6年度 多治見国道標識設置工事	工事名	令和6年度 多治見国道舗装修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部除雪作業
工期	当初 R6. 6. 17～R7. 1. 31 変更 R7. 2. 28	工期	当初 R6. 7. 03～R7. 02. 28 変更	工期	当初 R6. 11. 01～R7. 06. 30 変更	工期	当初 R6. 11. 01～R7. 03. 31 変更
受注者名	徳倉建設（株）	受注者名	篠田（株）	受注者名	大林道路（株）	受注者名	（株）吉川工務店
今月作業	準備工、確認ボーリング工、家屋調査工	今月作業	区画線工、小型標識工	今月作業	舗装修繕	今月作業	凍結防止工
来月作業	準備工	来月作業	小型標識工、準備工	来月作業	準備工	来月作業	一般除雪工、凍結防止工、歩道除雪、待機費
							
⑬							
工事名	令和6年度 多治見国道西部除雪作業						
工期	当初 R6. 11. 01～R7. 03. 31 変更						
受注者名	（株）吉川組						
今月作業	凍結防止工						
来月作業	一般除雪工、凍結防止工、歩道除雪工、待機費						
							
